

Relazione sulla situazione economicogestionale e sull'erogazione del servizio reso agli Utenti (in termini di qualità tecnica, contrattuale ed investimenti) anche ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 201 del 23/12/2022 – norme inerenti al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

| Il Direttore | |
|--------------------------|----------------|
| Ing. Giuseppe Giuliano | J. Wulious |
| I Funzionari Tecnici: | |
| Geom. Davide Ferraris | Ctz / Zn |
| Ing. Valentina Ghione | Gli Valenting |
| Dott.ssa Cristina Roasio | Cristino Roano |
| | |

Novembre 2024

INDICE

| PREMESSA | pag. | 1 |
|--|----------|-----|
| INQUADRAMENTO GENERALE DELL'ATO5 ASTIGIANO MONFERRATO | pag. | 3 |
| ANALISI ECONOMICO GESTIONALE DEI GESTORI ATO5 | pag. | 9 |
| INVESTIMENTI PROGRAMMATI E REALIZZATI | pag. | 77 |
| QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO RESO ALL'UTENZA | pag. | 188 |
| QUALITÀ CONTRATTUALE DEL SERVIZIO RESO ALL'UTENZA | pag. | 216 |
| VALUTAZIONI SINTETICHE FINALI | pag. | 243 |

PREMESSA

L'art. 30, comma 1, del d. lgs 23/12/2022, n. 201: "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" prevede che i comuni **o le loro eventuali forme associative**, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.

Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori stabiliti dalla competente Autorità di regolazione – ARERA.

La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

Il comma 2 dello stesso articolo indica che la relazione è aggiornata ogni anno. Il comma 3 indica che, in sede di prima applicazione (avvenuta nel 2023), la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con Deliberazione n. del 21 del 4 dicembre 2023 la Conferenza Ato5 ha approvato la: "RELAZIONE SULLA SITUAZIONE ECONOMICO – GESTIONALE E SULL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO RESO AGLI UTENTI (IN TERMINI DI QUALITA' CONTRATTUALE ED INVESTIMENTI) ANCHE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 201 DEL 23.12.2022 – NORME INERENTI AL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBILI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA".

Il presente documento rappresenta, quindi, la II relazione ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d. lgs 23/12/2022, n. 201.

Con specifico riferimento agli indicatori stabili dall'Autorità ARERA, la Relazione sviluppa, nei successivi capitoli, i seguenti aspetti:

- 1. **Inquadramento generale dell'Ato5 Astigiano M.to** (in cui si sviluppano, altresì le tematiche degli affidamenti in house per tre soggetti effettuati il 30 dicembre 2004 e con scadenza 31 dicembre 2030)
- 2. **Analisi economico gestionale dei Gestori Ato5** (in cui per ognuno dei gestori e per l'aggregato delle gestioni, si è confrontato il conto economico del **2023** con quello dell'esercizio precedente, comparando le principali voci di ricavo e di costo e valutando il loro andamento e gli scostamenti registrati fra i due anni esaminati. Segue l'analisi per indici relativi alla redditività del capitale proprio (ROE) alla redditività del capitale investito (ROI), alla

redditività lorda delle vendite (ROS) e l'indice di indebitamento (Leverage). **Aggiornamento con i dati a consuntivo anno 2023**.

- 3. Investimenti programmati e realizzati (in cui in relazione alle disposizioni dell'Autorità e nel rispetto delle competenze degli Enti d'Ambito circa la programmazione delle infrastrutture del servizio idrico integrato si indicano gli interventi programmati e realizzati dai Gestori Ato5: Asti Servizi Pubblici, Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, Acquedotto della Piana ed Acquedotto Valtiglione. I dati trasmessi da Acquedotto Valtiglione sono comprensivi di quanto di competenza dei Comuni di Nizza Monferrato e Canelli in cui è presente il Gestore Operativo IRETI). Aggiornamento con nuova programmazione approvata nel corso del 2024. Periodo regolatorio 2024 2029.
- 4. **Qualità Tecnica del servizio reso all'Utenza** (in cui si riporta la sintesi dell'ultima raccolta dati di qualità tecnica anni **2022-2023**) che definisce livelli minimi ed obiettivi qualità tecnica nel servizio idrico integrato, mediante l'introduzione di:
 - i) standard specifici da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente;
 - ii) standard generali che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio;
 - iii) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali.

Aggiornamento su dati di qualità tecnica biennio 2022 – 2023 inviati all'Autorità ARERA nell'aprile 2024.

5. Qualità contrattuale del servizio reso all'Utenza sulla base delle disposizioni dell'Autorità ARERA – in particolare Deliberazione del 23.12.2015 n. 655/2015/R/idr, sono definiti i livelli specifici e generali di qualità contrattuale del servizio idrico integrato, mediante l'individuazione di tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale.

La raccolta dati di qualità contrattuale del SII è propedeutica all'acquisizione da parte dell'Autorità dei dati necessari per verificare in ciascun anno il rispetto degli standard previsti (dal RQSII) con riferimento alle prestazioni eseguite in un determinato anno di riferimento.

Sulla base dei risultati conseguiti dai Gestori l'Autorità provvede ad applicare il meccanismo incentivante di premialità/penalità. Aggiornamento su dati di qualità contrattuale anno 2023 comunicati all'Autorità ARERA nell'aprile 2024.

1. INQUADRAMENTO GENERALE DELL'ATO5 ASTIGIANO MONFERRATO

2.1 IL CONTESTO TERRITORIALE ED INFRASTRUTTURALE


Il territorio interessato dalla gestione del sistema idrico integrato dell'ATO5 riguarda 152 comuni (l'87% dei quali con meno di 2mila abitanti), distribuiti su due provincie (Asti 103 comuni, Alessandria 42 comuni), e 7 comuni della Città Metropolitana di Torino, con una popolazione di circa 260mila abitanti e 4 gestori del servizio.

Alcuni elementi caratterizzanti il Servizio Idrico Integrato dell'ATO5:

- > l'acqua erogata dai Gestori è di circa 19.5 milioni di mc;
- > la lunghezza delle reti acquedottistiche è circa 4.900 km, con una lunghezza pro-capite pari a 18,8 m/abitante (circa il triplo rispetto al valore medio delle altre realtà italiane pari a 6,6 m/ab);
- > la lunghezza delle reti fognarie è pari a circa 2.150 km;
- > la lunghezza delle reti fognarie per abitante è pari a 8,2 m/ab; anche in questo caso, tale rapporto è ben più elevato della media nazionale, equivalente a 3,2 m/ab;
- > gli impianti di depurazione sono 875;
- > l'età delle condotte di acquedotto ha, per la gran parte, già superato la durata media funzionale. Questo fatto comporta investimenti rilevanti per sostituzioni ed adeguamenti. In termini di investimenti pro-capite i valori sono superiori agli altri ambiti piemontesi;
- > le fonti di approvvigionamento sono costituite esclusivamente da pozzi che prelevano l'acqua da falde profonde con costi energetici elevati per il pompaggio continuo dell'acqua estratta. Si ha quindi la garanzia della qualità molto buona della risorsa idrica estratta rendendola particolarmente adatta al consumo umano, ma vi sono anche costi significativi di energia elettrica;
- > la situazione orografica è caratterizzata da territorio quasi esclusivamente collinare (a parte la valle del Fiume Tanaro) senza soluzione di continuità. Questo comporta la necessità di pompare l'acqua per dislivelli anche significativi ed altresì, sul comparto fognatura depurazione, la presenza di numerosi impianti di depurazione in relazione ai molti versanti collinari.

Da tali dati emergono le difficoltà gestionali per mantenere in efficienza una struttura così complessa e caratterizzata da una frammentazione abitativa rilevante (tanti piccoli centri, tante case sparse) con maggiori problematiche e costi superiori.

L'attuale configurazione gestionale è rappresentata dalla seguente cartina:

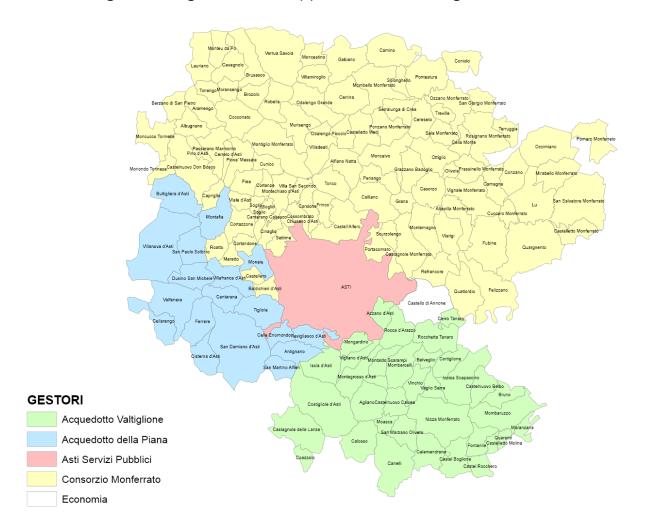

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'ATO5

struttura generale del servizio acquedotto

In merito alla struttura del servizio acquedottistico dell'ATO5 si riporta la seguente tabella riassuntiva:

Dati generali del servizio di acquedotto nell'ATO5

| Numero di comuni serviti | - | 152 ¹ |
|--|-----------|------------------|
| Popolazione residente servita | ab | 256.000 |
| Volume di acqua prelevato complessivamente dall'ambiente | Mil di mc | 29.8 |
| Di cui captato da sorgente | mc | 0 |

¹ I Comuni dell'ATO5 sono 152. I dati sono però riferiti ai 151 Comuni gestiti dai soggetti regolati dall'ATO5. Il Comune di Castello di Annone mantiene ancora una gestione in economia.

Dati generali del servizio di acquedotto nell'ATO5

| Di cui emunto da pozzo | Mil di mc | 29.8 |
|--|-----------|--------|
| Di cui prelevato da acque superficiali | mc | 0 |
| Lunghezza della rete | km | 4.900 |
| Numero serbatori | - | 251 |
| Numero stazioni di sollevamento | - | 106 |
| Utenze totali | - | 99.800 |

servizio di fognatura

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva degli indicatori dell'infrastruttura fognaria dell'ATO5.

| Dati aenero | ıli del ser | vizio di foat | natura nell'ATO5 | - |
|-------------|---------------|---------------|---------------------|---|
| Dungener | ili uci sci i | vizio ai ioai | lului u ileli A1 On | |

| • | | _ |
|-------------------------------|-------------|---------|
| Numero di comuni serviti | - | 152 |
| Popolazione residente servita | ab | 217.000 |
| Lunghezza della rete fognaria | kn | n 2.151 |
| Numero di stazioni sollevame | nto liquami | 120 |

Il servizio di fognatura raggiunge circa l'83% della popolazione residente con una lunghezza media delle reti fognarie pro-capite pari a circa 10 metri di condotte. Questo valore è da intendersi come valore medio d'Ambito, poiché da zona a zona vi sono differenze notevoli e si passa da un valore di 19 m/ab per la zona sud Astigiano e 17 m/ab per la zona Monferrato, dove la popolazione è molto distribuita sul territorio, ad un valore di circa 3 m/ab per la città di Asti.

Per quanto concerne la funzionalità della rete fognaria la situazione risulta essere abbastanza soddisfacente in relazione al fatto che gran parte dei collettori sono stati realizzati negli anni 1980-1990. Molti lavori di implementazione/potenziamento, in particolare nella città di Asti, sono oggetto del Programma degli interventi.

servizio di depurazione

La tabella seguente riassume gli indicatori relativi al servizio di depurazione fornito dall'ATO5.

| numero di comuni serviti | - | 152 |
|---|-------|---------|
| popolazione residente servita | ab | 216.000 |
| totale carico trattato | ab.eq | 260.000 |
| Numero totale impianti | 875 | |
| A.E. <= 2.000 | 865 | |
| 2.000 <a.e.<=10.000< td=""><td>7</td><td></td></a.e.<=10.000<> | 7 | |
| 10.000 <a.e.<=100.000< td=""><td>3</td><td></td></a.e.<=100.000<> | 3 | |
| A.E.>100.000 | 0 | |

Dalla tabella precedente si evince la presenza di un elevato numero di piccoli depuratori esistenti, che denota l'elevata frammentazione del sistema fognario e depurativo dell'ATO5. Tale frammentazione è dovuta sia alla conformazione del territorio dell'Ambito Astigiano Monferrato sia alla "visione su scala comunale" che sino agli anni '90 ha caratterizzato progettazione e realizzazione delle fognature e degli impianti di depurazione. Per il futuro si valuterà, ove possibile tecnicamente ed economicamente, di intervenire per la razionalizzazione del sistema fognatura e depurazione con la riduzione del numero degli impianti.

I depuratori dell'ATO5 con una capacità di depurazione superiore a 2.000 ab.eq. sono 10, di cui il principale, con 85.000 ab.eq., è quello di Asti.

La copertura del servizio di fognatura e depurazione, che si ritiene già buona mediamente a livello d'Ambito (oltre l'80%), differisce tra le zone maggiormente urbanizzate è quelle di campagna laddove la ridotta densità abitativa a la dispersione delle abitazioni sul territorio rendono molto difficile ed economicamente non conveniente il trattamento dei reflui attraverso il sistema di raccolta della pubblica fognatura e della depurazione centralizzata.

Una buona parte del territorio dell'ATO5 è collinare con una significativa dispersione delle abitazioni su territorio. Peraltro l'astigiano è privo di corpi idrici con portate di deflusso continue e rilevanti, tranne alcune eccezioni nei fondovalle (Tanaro, Belbo, Borbore, Triversa, Stura del M.to ecc....).

Nelle aree collinari, oltre alle difficoltà tecniche legate ai molteplici versanti ed alla significativa onerosità si ritiene che, anche dal punto di vista ambientale, non sia opportuno concentrare gli scarichi viste poi le difficoltà di reperire un corpo recettore che abbia una sufficiente capacità di diluizione ed autodepurativa.

In tali realtà il sistema di depurazione diffusa, attuato a mezzo delle Imhoff private, di cui le singole abitazioni devono dotarsi, è valutato l'unico possibile e anche il più efficace dal punto di vista ambientale.

Si sottolinea che negli ultimi anni l'attenzione al raggiungimento di una migliore qualità del Corpo Idrico recettore risulta di primaria importanza per la definizione degli standard qualitativi degli scarichi degli impianti di depurazione.

1.2 INQUADRAMENTO SINTETICO CIRCA L'ATTUALE CONFIGURAZIONE GESTIONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO 5 ASTIGIANO MONFERRATO

Nell'ambito 5 Astigiano Monferrato la gestione del servizio idrico integrato è stata affidata con convenzione 25.1.2005, sino al 31.12.2030, al gestore unitario costituito dai seguenti operatori e per i seguenti titoli:

- a) Acquedotto Valtiglione (in house, ai sensi dell'art. 113, c. 5, lett. c), d.lgs. 267/00) operante in 35 Comuni nell'area meridionale della Provincia astigiana;
- b) Acquedotto della Piana (in house, ai sensi dell'art. 113, c. 5, lett. c), d.lgs. 267/00) che eroga il servizio in 18 Comuni della Prov. di Asti ubicati verso l'area torinese;
- c) A.S.P. SpA, (società mista che ha collocato sul mercato quote di capitale attraverso procedura ad evidenza pubblica entro l'1.10.2003, ai sensi dell'art. 113, comma 15 bis, d.lgs. 267/00) che eroga il servizio idrico integrato (oltre ad altri servizi pubblici locali) nel Comune di Asti;
- d) Consorzio Monferrato (rdl 1345/1930 conv. in l. 80/1931 e d.m. 27.10.1930, nonché art. 113, comma 5, lett. c) d.lgs. 267/00) che eroga il servizio in 98 Comuni nell'area settentrionale della Provincia di Asti e nei Comuni delle Province di Torino e di Alessandria facenti parte dell'Ambito Astigiano-Monferrato.

Oltre ai quattro Gestori principali, opera sul territorio dell'Ambito anche un soggetto privato, Ireti SpA, subentrato alla società Acque Potabili dal 01/01/2017. La società è presente in qualità di gestore operativo nei Comuni di Canelli e Nizza Monferrato per l'intero servizio idrico integrato, con titolarità (dal 2008) del servizio in capo ad Acquedotto Valtiglione S.p.A.

L'affidamento è stato condizionato:

- all'obbligo di costituire una struttura unitaria utile allo svolgimento di azioni e progetti comuni nell'obiettivo di progressiva integrazione e aggregazione,
- all'obbligo degli affidatari di subentrare nelle precedenti gestioni cessate.

La struttura unitaria è stata costituita con atto 1.6.2007 nella forma di SIAM (Servizi Idrici Astigiano M.to) scarl, partecipata dai 4 gestori.

Relativamente agli affidamenti in house dei tre Gestori Ato5 (affidamento del sii ad Acquedotto Valtiglione, Acquedotto della Piana e Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato – deliberazione Conferenza Ato5 n. 86 del 30/12/2004) occorre ricordare che l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), nel maggio del 2008, ha disposto l'avvio di un procedimento volto ad accertare l'osservanza della normativa per l'affidamento del servizio idrico integrato nei casi in cui le Autorità

d'Ambito (ad oggi Enti di Governo d'Ambito) hanno disposto lo stesso in favore di società completamente pubbliche.

L'AVCP ha acquisito la documentazione da parte dei soggetti interessati e sulla base delle istruttorie effettuate ha indicato la conformità alle disposizioni di legge e alla giurisprudenza prevalente in materia, con Deliberazione n. 24 del 1° aprile 2009.

AVCP – Deliberazione 24 del 01.01.2009

| Regione | Ato | Gestore | Scheda | Valutazione |
|----------|------------------|-------------------------------|--------|-------------|
| Piemonte | 5 Astigiano M.to | Consorzio dei Comuni per | n. 16 | Conforme |
| | | l'Acquedotto del Monferrato | | |
| Piemonte | 5 Astigiano M.to | Acquedotto Valtiglione S.p.A. | n. 15 | Conforme |
| | | | | |
| Piemonte | 5 Astigiano M.to | Acquedotto della Piana S.p.A. | n. 14 | Conforme |
| | | | | |

2. Analisi economico gestionale dei Gestori Ato5

2.1 LA GESTIONE DEL S.I.I. NELL'ATO5

2.1.1 Situazione gestionale al 31/12/2023

L'analisi della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'area di competenza dell'Ente d'Ambito Astigiano Monferrato considera i dati forniti dai quattro gestori riconosciuti.

L'attività dei gestori ha per oggetto l'esercizio dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nonché la progettazione, la costruzione, la gestione, la riparazione e la manutenzione delle relative opere e impianti specifici. Tali servizi vengono prestati ai 152 Comuni dell'Ambito, appartenenti alle Province di Asti (103 Comuni) e Alessandria (42 Comuni) e alla Città Metropolitana di Torino (7 Comuni).

I quattro gestori riconosciuti operanti nel territorio dell'Ambito Astigiano Monferrato sono:

- **Acquedotto Valtiglione S.p.A.** operante in 33 Comuni situati nell'area meridionale della Provincia astigiana;
- Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato che eroga il servizio nell'area settentrionale della Provincia di Asti, nei sette Comuni della Città metropolitana di Torino e nei 42 Comuni della Provincia di Alessandria facenti parte dell'Ambito Astigiano-Monferrato;
- Acquedotto della Piana S.p.A. che fornisce l'intero servizio in 18 Comuni della Provincia di Asti ubicati verso l'area torinese;
- **Asti Servizi Pubblici S.p.A.** che eroga il servizio idrico integrato (oltre ai servizi Mobilità, Igiene ambientale, Cimiteriali ed Energia-Telecomunicazioni) nel Comune di Asti.

Oltre ai quattro gestori principali, opera sul territorio dell'Ambito anche **Ireti S.p.A.**, subentrata alla società Acque Potabili S.p.A. dal 01/01/2017. La società è presente in qualità di gestore operativo nei Comuni di Canelli e Nizza Monferrato per l'intero servizio idrico. Dal 1° gennaio 2008 tali Comuni hanno trasferito la titolarità del servizio ad Acquedotto Valtiglione S.p.A.

I Comuni non appartenenti a uno dei quattro gestori a cui è stato riconosciuto e affidato il servizio e che erogano direttamente il servizio idrico integrato, o segmenti di questo, devono aggregarsi e/o integrarsi con i gestori, al fine di raggiungere una struttura unitaria d'Ambito, realizzare economie di scala e fornire agli utenti dell'intero Ambito un servizio omogeneo, come previsto dalla normativa vigente. Come mostra il grafico 1, nel 2002 le gestioni presenti sul territorio di competenza dell'Ato5 erano 155. Grazie al processo di aggregazione a oggi le gestioni sono 5. L'unico Comune con gestione ancora in economia rimane Castello di Annone. In base al comma 1 articolo 7 del dl 133/2014 convertito con legge 164/2014 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la la digitalizzazione del Paese, realizzazione delle opere pubbliche, semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", gli enti locali devono assegnare le infrastrutture idriche delle quali sono proprietari in concessione d'uso gratuita al gestore del servizio idrico integrato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento citato e, decorso tale termine, il Presidente della Regione esercita, dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e all'AEEGSI, Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ora ARERA), i poteri sostitutivi ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Su richiesta della Regione Piemonte, l'EGAto5 ha effettuato la ricognizione delle gestioni. Con Delibera n. 27 di dicembre 2015 l'EGAto5 ha approvato la scheda di rilevazione informazioni per la riorganizzazione del servizio idrico integrato nella quale sono indicate le principali informazioni relative ai gestori legittimati ed ai gestori non legittimati del territorio dell'Ente di Governo dell'Ambito 5 nonché gli enti locali inadempienti, ai sensi dell'art. 153 del D.lgs. 152/2006. In merito all'obbligo di conferimento in uso gratuito delle infrastrutture del SII da parte del Comune di Castello di Annone, il 22 giugno 2016 si è tenuta una riunione presso la Direzione Ambiente della Regione Piemonte. Con nota EGAto del 15 settembre 2016 il Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato è stato incaricato di eseguire le attività di aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture idriche e di valutazione, utile per acquisire gli elementi necessari al trasferimento degli impianti al Gestore d'ambito. In seguito, gli uffici Ega hanno periodicamente inviato note di richiesta informazioni e di sollecito in merito allo svolgimento dell'attività. A fine 2022 il Comune ha indicato all'Ente d'Ambito la volontà di continuare la gestione del ciclo idrico integrato in economia, inviando apposito parere legale nel quale si indica che la naturale scadenza della gestione diretta del Comune di Castello di Annone è da individuare nella data del 31.12.2030, in coincidenza con la scadenza degli atti di affidamento alle società ASP S.p.A., Acquedotto della Piana S.p.A., Acquedotto Valtiglione S.p.A. e Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato. L'Ente d'Ambito ha richiesto apposito parere sulla legittimità della prosecuzione della gestione in economia del servizio idrico integrato nel Comune di Castello di Annone. Con tale parere si specifica che, non ricorrendo i presupposti per la salvaguardia, si ritiene che la prosecuzione della gestione di cui sopra non possa essere riconosciuta. Tutta la documentazione è stata trasmessa a Regione Piemonte e ARERA. L'Ente d'Ambito ha rimesso la decisione alla Regione Piemonte, soggetto al quale spetta per legge esercitare i poteri sostitutivi.

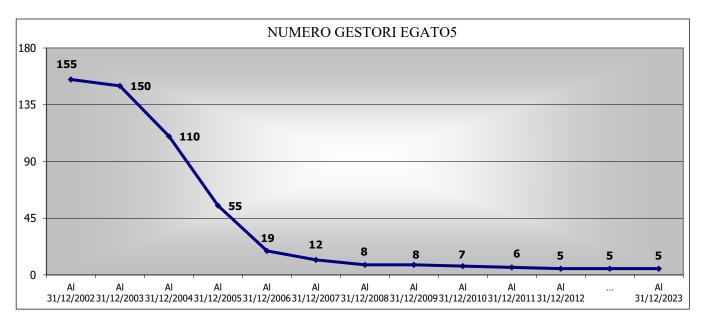


Grafico 1: Andamento del numero di Gestori operanti nell'EGAto5 dal 31/12/2002 al 31/12/2023

2.1.2 Fondo Nuovi Investimenti

Il Sistema Idrico Integrato, per sua natura, necessita di notevoli investimenti con lunghi tempi di ritorno, in quanto le infrastrutture realizzate hanno una durata significativa, mediamente di alcuni decenni.

Fino ad alcuni anni fa il comparto idrico era quasi completamente assistito dalla finanza pubblica; negli ultimi anni, venendo meno i contributi erogati dalle istituzioni locali, gli enti del settore sono stati costretti a reperire le risorse

necessarie direttamente dalla tariffa, anche in considerazione delle difficoltà riscontrate per l'accesso al credito bancario, che ad oggi risultano ridimensionate. In tale contesto è intervenuta l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, oggi ARERA, che ha introdotto il FoNI, Fondo Nuovi Investimenti, quale componente della tariffa del SII, per fornire liquidità ai gestori, avviando un meccanismo di contribuzione versata dagli utenti attraverso le bollette del servizio idrico integrato.

Il FoNI è stato introdotto dall'AEEGSI con Delibera 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012 "REGOLAZIONE DEI SERVIZI IDRICI: APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO TRANSITORIO (MTT) PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE NEGLI ANNI 2012 E 2013" che all'articolo 42 dell'Allegato A "Obbligo di destinazione al Fondo nuovi investimenti" comma 1 così recita: "E' fatto obbligo al gestore del SII di destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito, od al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale, una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi, di cui all'Articolo 6, destinata al Fondo nuovi investimenti (FoNI)".

Il comma 42.4 indica che il valore del FoNI è da "considerare interamente come contributo a fondo perduto percepito nel medesimo anno" e rimanda all'art. 12 che accoglie il calcolo del valore delle immobilizzazioni del gestore del SII finanziate a fondo perduto, in cui il valore del FoNI va a sommarsi a quello dei contributi a fondo perduto erogati da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, incassati dal gestore del SII e finalizzati alla realizzazione degli investimenti del SII.

Il FoNI è stato confermato dalla Deliberazione AEEGSI 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013 "APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO E DELLE DISPOSIZIONI DI COMPLETAMENTO" che determina la metodologia per la definizione della tariffa per gli anni 2014 e 2015. Tale disposizione dedica il Titolo V (articoli 22 e 23) al Fondo Nuovi Investimenti, riprendendo l'impostazione della deliberazione 585/2012. La stessa impostazione è mantenuta nella Deliberazione 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 "APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO MTI – 2" (articoli 20 e 21).

In base a questa impostazione il FoNI poteva assumere due diversi vincoli di destinazione:

- quota parte destinata agli investimenti;
- finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale.

Quando il gestore destina il FoNI agli investimenti, la normativa ARERA indica che il FoNI è un contributo a fondo perduto, equiparato ai contributi in conto capitale, pagato dagli utenti a sostegno degli investimenti; pertanto, non è

liberamente utilizzabile dal gestore, non può essere distribuito in conto utili e ha un vincolo di destinazione.

In tale contesto, l'Ato5, con Deliberazione n. 7 del 29 marzo 2013 "Indicazioni ai gestori per la destinazione del fondo nuovi investimenti (Foni)", ha individuato le seguenti categorie prioritarie di interventi per la destinazione del FoNI:

- integrazione gestionale delle realtà dell'Ato5;
- riduzione delle perdite nelle reti idriche;
- implementazione dei sistemi di telecontrollo e automazione degli impianti;
- contenimento e razionalizzazione dei consumi energetici;
- miglioramento della qualità degli scarichi dei depuratori;
- agevolazioni tariffarie a utenti in condizioni di disagio sociale.

Con Deliberazione 918/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017 "AGGIORNAMENTO DELLE **PREDISPOSIZIONI** TARIFFARIE DEL SERVIZIO INTEGRATO", l'AEEGSI (ora ARERA) ha introdotto una novità relativamente alla destinazione del FoNI. Il comma 2 dell'articolo 8 così recita: "A partire dall'anno 2018, il vincolo di destinazione della componente tariffaria FoNP ... è destinata in via esclusiva alla realizzazione dei nuovi investimenti per il raggiungimento degli specifici obiettivi individuati nel programma degli interventi elaborato per il pertinente territorio". Tale impostazione è stata confermata dall'Autorità con deliberazione 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 "APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO", con deliberazione 639/2021/R/IDR di aggiornamento del metodo per gli anni 2022 e 2023 e con deliberazione 639/2023/R/IDR del 28 dicembre APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL QUARTO PERIODO REGOLATORIO (MTI-4)".

Tra gli adempimenti cui sono soggetti i gestori idrici, rientra la compilazione dei Conti Annuali Separati in ottemperanza alla Deliberazione 137/2016/R/IDR del 24 marzo 2016 "Integrazioni del testo integrato Unbundling contabile (TIUC) con le disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (Unbundling) per il settore idrico". L'intervento dell'Autorità ha lo scopo di garantire un flusso informativo certo (in quanto soggetto a revisione contabile), omogeneo e comparabile tra operatori (nonché utilizzabile ai fini del calcolo tariffario) delle singole fasi della filiera idrica, con l'obiettivo, tra gli altri, di arrivare alla definizione di costi standard del servizio e/o di determinati processi standardizzabili.

Nell'ambito della separazione contabile, l'Autorità ha fornito un Manuale di contabilità regolatoria. Tale manuale indica che la componente tariffaria FoNI è assimilata contabilmente ad un contributo pubblico in conto impianti e come tale deve essere rilavata nei CAS dal gestore, indipendentemente dalla modalità di

redazione del bilancio civilistico, utilizzando la metodologia prevista dall'OIC 16 per tali contributi.

Con riferimento alla redazione dei bilanci, con comunicato del 17 aprile 2019 "Trattamento contabile del Fondo Nuovi Investimenti (FoNI)", l'Arera ha informato i gestori del SII che - in riscontro alla richiesta dell'Autorità del 31 gennaio 2019, avanzata ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 38/2005 - l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha trasmesso, in data 8 aprile 2019, un parere sul trattamento contabile della componente di ricavo derivante dal FoNI.

In particolare l'OIC ha sottolineato che "fermo restando che l'assenza di un principio contabile non consente di esprimersi a favore di uno specifico trattamento contabile tra quelli adottati nella prassi e tenuto in conto che [il comunicato dell'Autorità del 26 ottobre 2018] precisa che la metodologia indicata è obbligatoria nei CAS e non nella redazione del bilancio d'esercizio, questo Organismo ritiene opportuno che gli operatori, a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, indipendentemente dalla politica contabile utilizzata, adottino politiche di disponibilità delle riserve, per la parte alimentata dalla componente FoNI, coerenti con le tecniche regolatorie stabilite nella richiamata comunicazione dell'ottobre 2018".

Quanto indicato dall'OIC nel parere dell'8 aprile 2019 viene ripreso dall'Autorità all'art. 35 c. 1 Allegato A della Deliberazione 580/2019/R/IDR (nonché nelle successive Deliberazioni relative al metodo tariffario indicate in precedenza). Tale comma così recita "Secondo quanto raccomandato dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), gli operatori, a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, indipendentemente dalla politica contabile utilizzata, adottano politiche di disponibilità delle riserve, per la parte alimentata dalla componente FoNI, coerenti con le tecniche di rendicontazione regolatorie stabilite dall'Autorità, in base alle quali tale componente, finalizzata all'incentivazione dei nuovi investimenti, è assimilata a un contributo pubblico in conto impianti e come tale deve essere rilevata nei CAS dal gestore utilizzando la metodologia prevista dall'OIC 16 per tali contributi".

Il principio contabile 16 dell'Organismo Italiano di Contabilità tratta dei contributi in conto impianti ai paragrafi 86, 87 e 88.

Dopo aver fornito la definizione di contributi in conto impianti, l'OIC afferma che "I contributi in conto impianti sono riferiti e commisurati al costo dei cespiti e come tali partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del risultato dell'esercizio secondo il criterio della competenza".

Al paragrafo 88 vengono indicati i possibili metodi di rilevazione in conto economico di tali contributi: "I contributi in conto impianti commisurati al costo

delle immobilizzazioni materiali sono rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti. Ciò può essere applicato con due metodi:

- a) con il primo metodo (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi", e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di "risconti passivi";
- b) con il secondo metodo (metodo diretto) i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.

Con il primo metodo sono imputati al conto economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali, dall'altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell'esercizio. Con il secondo metodo sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell'immobilizzazione materiale al netto dei contributi. L'iscrizione del contributo in apposita voce tra i risconti passivi, da ridursi ogni periodo con accredito al conto economico, lascia inalterato il costo dell'immobilizzazione, ma produce gli stessi effetti sull'utile dell'esercizio e sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo come riduzione del costo".

2.2 ANALISI DEL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2023

La prima parte dell'elaborato considera l'analisi economica con la quale si esamina la redditività aziendale, cioè la capacità delle aziende di garantire la copertura dei costi e conseguire un congruo utile.

Per ognuno dei gestori, si è confrontato il conto economico del 2023 con quello dell'esercizio precedente: mediante l'analisi temporale si sono paragonate le principali voci di ricavo e di costo e si sono valutati il loro andamento e gli scostamenti registrati fra i due anni esaminati.

2.2.1 Acquedotto Valtiglione S.p.A.

2.2.1.a Comuni serviti e assetto societario

L'Acquedotto Valtiglione S.p.A. fornisce i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione a 33 Comuni situati nella zona sud-orientale della Provincia astigiana.

Dal 2008 la società ha assunto la titolarità del servizio idrico integrato per i Comuni di Canelli e Nizza Monferrato, precedentemente serviti da Acque Potabili S.p.A. Secondo il contratto di servizio approvato dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito, per la gestione operativa dei due Comuni acquisiti l'azienda si avvale dell'attività svolta da Ireti S.p.A., subentrata ad Acque Potabili S.p.A., mentre per la programmazione e la realizzazione di nuove opere nonché per le manutenzioni straordinarie l'Acquedotto Valtiglione provvede direttamente nei limiti di quanto stabilito dal piano d'ambito. Tale contratto è stato sottoscritto in data 27 dicembre 2007 con scadenza al 31 dicembre 2023, eventualmente rinnovabile, previo parere dei Comuni e assenso dell'EGAto e, qualora sussistano le condizioni giuridiche, eventualmente ridefinendo gli impegni tra le parti. Il contratto di servizio prevede che le operazioni di contatto con l'utenza (contratti, letture, bollettazione e fatturazione, conservazione ed aggiornamento dell'archivio utenza, allacciamenti etc...), per il primo triennio di validità contrattuale, siano svolte dal gestore operativo in qualità di delegato di Acquedotto Valtiglione. Al termine del primo triennio e di ogni triennio successivo, le parti hanno facoltà di valutare congiuntamente se proseguire con il sistema in atto o apportare modifiche allo stesso e se mantenere la delega.

Nel corso del 2020 è stato avviato il percorso che dovrebbe portare alla gestione diretta degli utenti di Canelli e Nizza Monferrato da parte di Acquedotto Valtiglione di prestazioni per la gestione tecnico – operativa del servizio idrico integrato, propedeutico alla gestione del SII nella sua totalità comprensiva anche dei rapporti con l'utenza, la fatturazione dei consumi, la riscossione e il recupero del credito.

Sul territorio di competenza dell'Acquedotto Valtiglione sono presenti 3 ambiti tariffari:

- Comuni storici:
- Comuni di Cerro Tanaro, Rocchetta Tanaro e Cortiglione;
- Comuni di Canelli e Nizza Monferrato.

Si ricorda che Acquedotto Valtiglione si presenta come una società per azioni proprietaria delle reti, delle infrastrutture e degli impianti necessari al corretto esercizio del servizio risultante dalla trasformazione del consorzio costituito tra enti locali per la gestione del servizio di acquedotto. La società risulta affidataria del servizio idrico integrato fino al 31 dicembre 2030 in virtù della Convenzione stipulata con l'Ato5 in data 25/01/2005. Tale affidamento presenta il requisito della gestione in house la quale implica che il servizio idrico integrato possa essere gestito solo per conto di enti locali che siano soci della società medesima. In tale ottica i Comuni di Azzano, Canelli, Castagnole Lanze, Castel Rocchero, Cerro Tanaro, Nizza Monferrato, Quaranti, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro e Cortiglione, per conseguire il presupposto (titolarità del capitale sociale – controllo analogo) per l'integrazione dell'affidamento, avrebbero dovuto acquisire la qualità di soci nel gestore di riferimento, il quale avrebbe dovuto a sua volta accettarne l'ingresso.

In assenza della qualità di soci, il servizio è stato sino a oggi reso da Acquedotto Valtiglione a tali Comuni sulla base, provvisoria, di convenzioni.

Peraltro, come già indicato, per Canelli e Nizza M.to è stato definito un assetto particolare: titolarità del servizio ad Acquedotto Valtiglione S.p.A. (sulla base di convenzione), gestione operativa in capo a Ireti S.p.A.

Fermo restando l'obiettivo essenziale del perfezionamento dell'aggregazione, occorre individuare una soluzione per i Comuni non soci dei gestori d'ambito.

Considerato che l'obiettivo dell'unificazione della gestione d'ambito e della tariffa unica è prioritario ed essenziale, in sede di aggiornamento della Convenzione di gestione, si era stabilito che per i Comuni che non avevano ancora acquisito la qualifica di soci, gestiti transitoriamente in convenzione dal soggetto gestore in grado di garantire la gestione aggregata d'area, la situazione si sarebbe dovuta perfezionare entro il 30 giugno 2019 o attraverso la partecipazione al gestore unico d'ambito o attraverso la partecipazione ad Acquedotto Valtiglione.

In merito a Ireti, il Consiglio di amministrazione di Acquedotto Valtiglione, nella seduta del 15 febbraio 2021, ha richiesto all'Ente di Ambito di avviare le attività necessarie per la valutazione del valore residuo (VR) della gestione operativa dei Comuni di Canelli e Nizza Monferrato.

Con delibera n. 6 del 2 marzo 2021 la Conferenza dell'Egato5 ha deliberato l'avvio del procedimento per la determinazione del VR del gestore operativo Ireti S.p.A. ai sensi della Deliberazione ARERA n. 656/2015/R/IDR per il successivo subentro del gestore Acquedotto Valtiglione S.p.A., indicando che, a seguito della corresponsione del Valore Residuo, l'Acquedotto Valtiglione S.p.A. dovrà procedere con il subentro al gestore operativo assicurando e garantendo la continuità delle diverse attività gestionali e la soddisfacente erogazione del servizio idrico integrato agli utenti per il territorio di competenza.

Con apposita nota, l'Ente di Ambito ha richiesto a Ireti l'invio della proposta circa il valore residuo alla data di riferimento del 31 dicembre 2020. A novembre 2021

è pervenuta la documentazione relativa ai conteggi relativi al terminal value; gli uffici EGAto hanno chiesto integrazioni in merito a quanto ricevuto.

A fine 2022 l'importo del valore residuo è stato aggiornato al 31/12/2021. È seguita l'istruttoria con il coinvolgimento del gestore titolare e del gestore operativo. A marzo 2023 si è definito il terminal value al 31/12/2021. A seguito della predisposizione tariffaria anni 2024-2029, il valore residuo sarà aggiornato al 31/12/2023.

2.2.1.b Analisi temporale

L'analisi permette di confrontare i valori registrati nelle più significative voci di conto economico negli esercizi 2022 e 2023 e di valutare il loro andamento e gli scostamenti registrati nei due anni.

| <u>Voci di bilancio</u> | 31/12/2023 | 31/12/2022 | <u>Scostamento</u> |
|--|------------|------------|--------------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 9.940.945 | 9.499.159 | 441.786 |
| Incrementi immobilizzazioni | 1.319.446 | 988.082 | 331.364 |
| Altri ricavi e proventi | 2.100.678 | 2.035.590 | 65.088 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 13.361.069 | 12.522.831 | 838.238 |
| Costi per materie prime, sussidiarie, di | | | |
| consumo e merci | 1.427.466 | 1.245.743 | 181.723 |
| Costi per servizi | 9.041.206 | 8.503.330 | 537.876 |
| Costi per godimento beni di terzi | 54.486 | 56.331 | -1.845 |
| Costi per personale | 1.919.779 | 1.876.816 | 42.963 |
| Ammortamenti | 649.036 | 609.807 | 39.229 |
| Svalutazione crediti | 26.804 | 17.539 | 9.265 |
| Variazioni rimanenze | 9.533 | -34.082 | 43.615 |
| Accantonamento per rischi | 1.505 | 509 | 996 |
| Oneri diversi di gestione | 125.328 | 94.209 | 31.119 |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | 13.255.143 | 12.370.202 | 884.941 |
| DIFF. VALORI E COSTI PRODUZIONE | 105.926 | 152.629 | -46.703 |
| Proventi e oneri finanziari | -27.664 | -146.478 | 118.814 |
| Risultato prima delle imposte | 78.262 | 6.151 | 72 .111 |
| Imposte | 23.248 | 77.175 | -53.927 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 101.510 | 83.326 | 18.184 |

Tabella 1: Confronto tra dati di conto economico 2023 e 2022 - Acquedotto Valtiglione S.p.A. -

Le voci principali che compongono i Ricavi delle vendite e delle prestazioni sono:

- Proventi servizio acquedotto carico utenti;
- Proventi servizio depurazione carico utenti;
- Proventi servizio fognatura carico utenti;
- Vendita acqua all'ingrosso;
- Proventi acque reflue da utenze produttive;
- Proventi per allacciamenti acquedotto;
- Proventi da canone concessione servizio a Ireti;
- Proventi per addizionali Arera;
- Vendita di acqua forfettaria;
- Trattamento bottini;
- Proventi per allacciamento fognatura;
- Proventi da bocche antincendio.

Gli Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni rappresentano le spese sostenute nell'esercizio per l'allestimento di nuovi impianti e di rinnovi effettuati direttamente dalla società.

Le voci principali degli Altri ricavi e proventi sono:

- Proventi manutenzione ordinaria e straordinaria Ireti;
- Contributi in conto esercizio relativi in massima parte alla premialità ricevuta da Arera per il raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica e qualità contrattuale e al credito d'imposta riconosciuto relativo al costo sostenuto per l'acquisto di energia elettrica;
- Utilizzo fondo sviluppo investimenti: accoglie la parte dei contributi in conto impianti ricevuti per finanziare investimenti corrispondente agli ammortamenti operati sugli impianti il cui costo è stato coperto con contributi in conto capitale;
- Ricavi da vendita energia;
- Proventi diversi per rivalsa spese postali e bolli;
- Sopravvenienze attive;
- Fitti attivi da terreni e fabbricati per utilizzo torri dell'acquedotto da infrastrutture di trasmissione dati.

Le voci principali dei costi per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono:

- Acquisto acqua da interconnessione e da terzi;
- Acquisto materiali di consumo;
- Acquisto carburanti e lubrificanti;
- Acquisto attrezzatura minuta;
- Acquisto cancelleria varia.


I principali costi per Servizi derivano dalle seguenti voci:


- Forza motrice;
- Spese per gestione tecnica operativa Comuni di Canelli e Nizza M.to;
- Manutenzione impianti e macchinari, impianti di depurazione e su beni di terzi;
- Ripristini e rappezzi manto stradale;
- Canone ripetizione mutui ai Comuni;
- Spese servizio escavatore;
- Spese per trattamento acqua;
- Spese SISI per scarichi CIDAR;
- Quota fondo progetti strategici;
- Spese smaltimento fanghi.

La voce Godimento beni di terzi accoglie costi di noleggio attrezzature, fotocopiatrici e automezzi.


Le voci principali degli Oneri diversi di gestione sono:


- Valori bollati e concessioni governative;
- Canoni demaniali vari;
- TOSAP e canoni vari acque reflue;
- Spese risarcimento danni;
- Imposte indeducibili;
- Costi fiscalmente indetraibili;
- Indennizzi ex Del. Arera 655/2015.

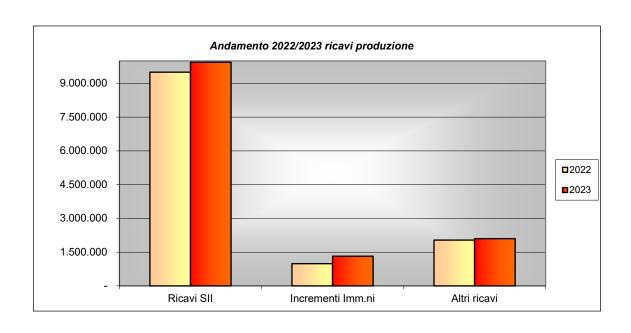

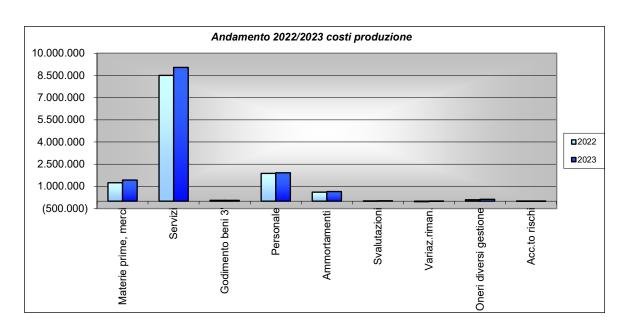

Grafici 2 e 3: Composizione dei ricavi e dei costi della produzione Acquedotto Valtiglione S.p.A. - confronto tra anno 2022 e anno 2023 -





Grafici 4 e 5: Percentuali di ricavi e costi della produzione Acquedotto Valtiglione S.p.A. - dati di bilancio 2023 –

Il confronto tra i dati nel conto economico dell'anno 2023 e i dati relativi alla gestione dell'esercizio precedente evidenzia, per la parte Ricavi delle vendite e delle prestazioni, un incremento di oltre 440.000 Euro. Analizzando le differenze tra i due anni, si rileva un aumento nelle voci relative a Proventi acquedotto utenti, Proventi acquedotto carico Comuni convenzionati e subdistributori, Proventi servizio fognatura e Proventi servizio depurazione utenti, mentre si registra una flessione nelle voci Proventi da acque reflue da autorizzazione AUA, Proventi quota accesso servizio acquedotto. Si ricorda che il gestore inserisce in bilancio i ricavi dei bacini tariffari secondo quanto fatturato nell'esercizio e non secondo quanto fatturato con la tariffa dell'anno cui si riferisce il bilancio. Si rileva che la voce A1 nel conto economico 2023 accoglie minori ricavi da applicazione FoNI per 433.228 Euro nonché la voce "Maggiori ricavi da RDT e conguagli" per Euro 349.059, mentre nel conto economico 2022 la voce A1 accoglie i minori ricavi da applicazione FoNI per 432.645 Euro.

Gli Incrementi di immobilizzazioni aumentano di circa 330.000 Euro e rappresentano le spese sostenute nell'esercizio per l'allestimento di nuovi impianti e di rinnovi effettuati direttamente dal gestore.

Gli Altri ricavi e proventi aumentano di 65.000 Euro circa in relazione alla voce Contributo in conto esercizio riferito alla premialità ricevuta da Arera per il raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale, pari a circa 318.000 Euro. I contributi per credito d'imposta riferiti all'energia elettrica sono presenti anche nel 2023 anche se per importi inferiori rispetto all'esercizio precedente. Inoltre, si rilevano maggiori ricavi legati alla vendita di energia elettrica. Si registrano minori proventi legati alla gestione tecnico – operativa del servizio idrico integrato per conto di Ireti nell'area Canelli e Nizza M.to (voci Proventi manutenzione ordinaria e straordinaria Ireti per circa 981.000 Euro rispetto ai circa 1.178.000 Euro del 2022).

Complessivamente il valore della produzione anno 2023, pari a 13.361.069 Euro, risulta superiore di 838.238 Euro rispetto all'esercizio precedente (12.522.831 Euro).

I costi della produzione passano da Euro 12.370.202 del 2022 a Euro 13.255.143. Nel dettaglio l'incremento dei costi per materie prime di circa 180.000 Euro è dovuto principalmente alle maggiori spese sostenute per acquisto di acqua da interconnessione e di materiali di consumo.

La voce costi per servizi, che rappresenta circa il 68% dell'ammontare costi della produzione, aumenta di 537.876 Euro: si rilevano maggiori costi relativi all'acquisto di forza motrice, per manutenzioni impianti e macchinari e attrezzature, per ripristini e rappezzi manto stradale. Diminuiscono i costi relativi alla gestione tecnico – operativa dei Comuni di Canelli e Nizza M.to, i costi per manutenzioni su beni di terzi e per utilizzo lavoro interinale.

I costi per godimento beni di terzi sono pressoché stabili, il costo del personale aumenta di 42.963 Euro, la variazione delle rimanenze aumenta di 43.615 Euro.

In bilancio 2023 è presente la voce accantonamento per rischi di 1.505 Euro riferito alle penalità relative alle annualità 2020 e 2021 per il mancato conseguimento degli obiettivi stabiliti secondo quanto previsto al comma 29.1 della Regolazione della Qualità Tecnica (RQTI) come da delibera ARERA n. 477 del 17 ottobre 2023. Parimenti, in bilancio 2022 è presente la voce accantonamento per rischi di 509 Euro riferito alle penalità relative alle annualità 2018 e 2019 per il mancato conseguimento degli obiettivi stabiliti secondo quanto previsto al comma 29.1 della Regolazione della Qualità Tecnica (RQTI) come da delibera ARERA n. 183 del 26 aprile 2022.

Gli Oneri diversi di gestione aumentano di 31.119 Euro, in relazione a maggiori costi per valori bollati e concessioni governative, canoni demaniali vari, spese risarcimento danni e sopravvenienze passive.

La voce Ammortamenti aumenta di 39.229 Euro. Tale voce è composta dalle sotto voci Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (principalmente software e licenze) e Ammortamenti immobilizzazioni materiali.

In merito alle aliquote di ammortamento applicate dal gestore si allega tabella con il confronto tra le aliquote indicate dal D.M. 10/1/1990 e le aliquote applicate dal gestore che tengono conto del presumibile e più significativo valore residuo al termine del periodo di vita utile e della notevole durata economica dei beni stessi, nonché della loro scarsa obsolescenza tecnologica ed altresì del costante processo di manutenzione a cui i beni sono sottoposti:

| Voci immobilizzazioni materiali | Aliquota D.M. 10/01/1990 | Aliquota applicata |
|--|--------------------------|--------------------|
| Fabbricati industriali | 3,50% | 1,00% |
| Impianti generici | 15,00% | 4,50% |
| Serbatoi (vasche) | 4,00% | 0,50% |
| Impianti di accumulo (vasche) | 4,00% | 0,50% |
| Opere idrauliche fisse ante 1989 | 1,00% | 0,50% |
| Opere idrauliche fisse post 1988 | 2,50% | 0,50% |
| Costruzioni leggere | 10,00% | 1,00% |
| Macchinari | 15,00% | 4,50% |
| Acquedotto Valtiglione/CCAM/ASP lotto 1 interconnessione | 8,00% | 2,40% |
| Interconnessione imp. Telemisura Cortiglione | 20,00% | 6,00% |
| Interconnessione rete acq. Rocchetta Tanaro | 5,00% | 1,50% |
| Impianti di sollevamento (pompe) ante 1989 | 8,00% | 2,40% |
| Impianti di sollevamento (pompe) post 1988 | 12,00% | 3,60% |
| Manutenzioni incrementative impianti acque reflue ed impianti di | 8,00% | 2,40% |
| fognatura | | |
| Condutture (reti) | 5,00% | 1,50% |
| Rifacimento reti idriche | 5,00% | 1,50% |
| Condutture fognarie | 5,00% | 1,50% |
| Manutenzione incrementative prese per condotte | 5,00% | 1,50% |
| Manutenzioni straordinarie su beni di terzi | 8,00% | 2,40% |
| Impianti di filtrazione | 8,00% | 2,40% |
| Attrezzature | 10,00% | 3,00% |
| Contatori | 10,00% | 3,00% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12,00% | 3,60% |
| Macchine d'ufficio elettroniche ed elaboratori | 20,00% | 20,00% |
| Impianti di telemisura | 20,00% | 6,00% |
| Radiotelefoni ed accessori | 20,00% | 20,00% |
| Automezzi | 20,00% | 20,00% |
| Diritti reali di godimento (servitù acquedotto) | 5,00% | 5,00% |
| Autovetture | 25,00% | 25,00% |

Tabella 2 – Aliquote ammortamento applicate da Acquedotto Valtiglione

La voce Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante indica l'accantonamento al Fondo Svalutazione. L'accantonamento 2023 è pari a Euro 26.804, portando il Fondo svalutazione crediti, al netto della quota utilizzata nell'anno, a complessivi Euro 951.653.

Il reddito operativo, pari a Euro 105.926, è diminuito rispetto al 2022 in relazione al più che proporzionale aumento dei costi della produzione rispetto ai ricavi.

La gestione finanziaria presenta un netto miglioramento, pari a 118.814 Euro, rispetto all'esercizio precedente; si rilevano proventi finanziari per circa 234.000 Euro relativi a interessi per ritardato pagamento e maggiori interessi passivi bancari, su mutui e su finanziamenti di terzi relativi all'anticipazione ricevuta da Csea.

Relativamente all'area fiscale, la voce Imposte, come già rilevato per l'annualità 2022, incrementa il reddito ante imposte. Questa situazione deriva dall'ammontare della voce IRES anticipata in relazione all'utilizzo di parte del fondo svalutazione crediti già tassato e per perdite fiscali (vedasi dettaglio in Nota integrativa del fascicolo di bilancio del gestore).

L'utile dell'esercizio 2023, pari a Euro 101.510,12, in aumento rispetto al risultato del 2022, è stato destinato come segue:

- Euro 5.075,51 a riserva legale (un ventesimo dell'utile, come previsto dall'art. 2430 del Codice civile);
- Euro 96.434,61 a riserva straordinaria.

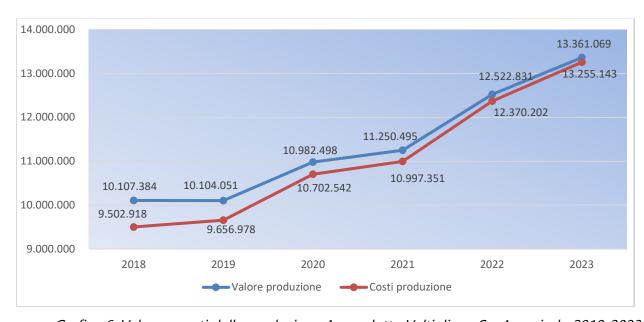


Grafico 6: Valore e costi della produzione Acquedotto Valtiglione S.p.A. periodo 2018-2023

2.2.1.c Andamento della gestione nell'esercizio 2023

Durante il 2023 sono stati complessivamente realizzati o portati a compimento interventi per Euro 2.818.466 (contro Euro 1.909.540 del 2022) di cui Euro 1.978.911 (contro Euro 1.491.865 del 2022) per l'acquisizione di beni materiali ed Euro 41.670 (contro Euro 1.600 del 2022) per l'acquisizione di beni immateriali

(software). Di tali incrementi Euro 797.884 si riferiscono a beni materiali ancora in corso di realizzazione al termine dell'esercizio.

I principali interventi si riferiscono a lavori di sostituzione condotte idriche, acquisto per sostituzione di contatori obsoleti, lavori di manutenzione incrementativa prese e saracinesche, sostituzione di reti di distribuzione e manutenzione straordinaria delle condutture idriche, lavori di ripristino reti collettori fognari tra Costigliole e Isola d'Asti, lavori di manutenzione incrementativa del depuratore di Incisa Scapaccino, manutenzione straordinaria impianti fognari, manutenzione incrementativa di impianti di sollevamento, lavori di sostituzione tubazioni a Vinchio, lavori di manutenzione straordinaria conduttura idrica di Isola d'Asti, realizzazione di un nuovo collettore fognario a San Carlo di Costigliole d'Asti, realizzazione nuove condotte a Castagnole Lanze e altri interventi minori.

2.2.2 Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

2.2.2.a Comuni serviti e assetto societario

Il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato è stato costituito con R.D.L. 28 agosto 1930, n. 1345, convertito in legge n. 80 del 6 gennaio 1931. La stessa legge ha dettato le norme per la costruzione dell'Acquedotto consortile e il D.M. 27 ottobre 1930 il Regolamento per l'esercizio dell'Acquedotto del Monferrato.

Il Consorzio eroga il servizio di acquedotto in 98 Comuni appartenenti alle Province di Asti e Alessandria e alla Città metropolitana di Torino oltre che in Frazione Sessant (Comune di Asti) e Frazione Villabella (Comune di Valenza) nonché i servizi di fognatura e di depurazione in 98 Comuni.

In data 1° gennaio 2003, il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato è subentrato nella gestione del servizio idrico alla ex concessionaria Acquedotto Monferrato S.p.A. La scadenza della concessione (22/11/1994) era stata stabilita dalla legge istitutiva del Consorzio che contestualmente aveva previsto le norme per la costruzione dell'acquedotto consortile. L'effettiva consegna dell'acquedotto al Consorzio è avvenuta a seguito dell'ordinanza del Sindaco di Moncalvo, il 31 dicembre 2002.

A seguito del subentro nella gestione da parte del Consorzio Monferrato è sorto un contenzioso giudiziario che da un lato vede la Società ex concessionaria rivendicare il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo per presunti investimenti realizzati e non ancora completamente ammortizzati e dall'altro il Consorzio che respinge le richieste della ex concessionaria e a sua volta denuncia il ritardo con cui la stessa ha riconsegnato gli impianti e il fatto che gli stessi al momento della consegna risultavano in cattivo stato di manutenzione conservativa, ampiamente oltre la vita tecnica utile con le condotte idriche di distribuzione ancora in cemento-amianto, in contrasto con il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso in occasione dell'approvazione del progetto per la costruzione dell'acquedotto.

La sentenza di primo grado del Tribunale di Vercelli in data 1° aprile 2015 con diverse motivazioni ha respinto le richieste di entrambe le parti; il 15 ottobre 2015 la ex concessionaria ha presentato ricorso presso la Corte di Appello del Tribunale di Torino. Tale ricorso è stato impugnato dal CCAM il 2 febbraio 2016. La Corte di Appello di Torino, in esito a sentenza non definitiva depositata in data 19 maggio 2017, ha ordinato una CTU per verificare se vi siano state opere, autorizzate dal CCAM e realizzate con oneri a carico della Società ex concessionaria, rispondenti all'ex art. 12 del D.M. 27/10/1930 (Regolamento per l'esercizio dell'Acquedotto del Monferrato).

In data 3 aprile 2019 è stata depositata la sentenza definitiva della Corte di Appello di Torino che ha rigettato la domanda della S.p.A. Acquedotto Monferrato, relativa all'indennità pretesa per le opere realizzate previa autorizzazione del Consorzio ex art. 12 del D.M. 27/10/1930.

La decisione d'appello è stata impugnata dalla Concessionaria ed il ricorso è ora pendente avanti la Suprema Corte di cassazione.

2.2.2.b Analisi temporale

L'analisi permette di confrontare i valori registrati nelle più significative voci di conto economico negli esercizi 2022 e 2023 e di valutare il loro andamento e gli scostamenti registrati nei due anni.

| <u>Voci di bilancio</u> | <u>Valori al 31/12/2023</u> | Valori al 31/12/2022 | <u>Scostamento</u> |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 18.265.072 | 18.337.637 | -72.565 |
| Incrementi immobilizzazioni | 5.318.717 | 4.155.875 | 1.162.842 |
| Altri ricavi e proventi | 3.195.911 | 2.533.941 | 661.970 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 26.779.700 | 25.027.453 | 1.752.247 |
| Costi per materie prime, sussidiarie e di | | | |
| consumo e merci | 1.899.395 | 1.131.919 | 767.476 |
| Costi per servizi | 11.191.757 | 10.658.709 | 533.048 |
| Costi per godimento beni di terzi | 1.118.694 | 1.013.408 | 105.286 |
| Costi per personale | 5.923.213 | 5.700.921 | 222.292 |
| Ammortamenti | 3.637.578 | 3.660.868 | -23.290 |
| Svalutazione crediti | 400.000 | 350.000 | 50.000 |
| Variazioni rimanenze | -1.517 | 8.102 | -9.619 |
| Accantonamento rischi | 50.000 | 340.000 | -290.000 |
| Oneri diversi di gestione | 283.231 | 151.827 | 131.404 |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | 24.502.351 | 23.015.754 | 1.486.597 |
| DIFF. VALORI E COSTI PRODUZIONE | 2.277.349 | 2.011.699 | 265.650 |
| Proventi e oneri finanziari | -659.934 | -808.164 | 148.230 |
| Rettifiche valore di partecipazioni | 92 | 0 | 92 |
| Risultato prima delle imposte | 1.617.507 | 1.203.535 | 413.972 |
| Imposte | -421.208 | -285.572 | -135.636 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 1.196.299 | 917.963 | 278.336 |

Tabella 3: Confronto tra dati di conto economico 2023 e 2022 - Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato -

Le voci principali che compongono i Ricavi delle vendite e delle prestazioni sono:

- Ricavi vendita acqua;
- Quote fisse acqua;
- Corrispettivi depurazione;
- Premi CSEA qualità tecnica e commerciale;
- Corrispettivi fognatura;
- Quote accesso depurazione;
- Quote accesso fognatura;
- Ricavi vendita acqua subdistributori ingrosso;
- Ricavi da utenze industriali;
- Ricavi vendita acqua grandi utenze.

Gli Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni rappresentano le spese sostenute nell'esercizio per l'allestimento di nuovi impianti e di rinnovi effettuati direttamente dal Consorzio e sono costituiti da:

- Spese per lavori affidati a imprese;
- Spese per acquisti di materiali;
- Costi per impiego di personale del Consorzio;
- Altre spese: spese per progettazioni, consulenze e oneri diversi.

Le voci principali degli Altri ricavi e proventi sono:

- Contributi da enti pubblici e privati;
- Recupero costo energia relativa all'interconnessione;
- Quota FoNI dell'esercizio;
- Credito imposta energia elettrica;
- Sopravvenienze attive;
- Rimborsi da utenti principalmente per bolli su contratti, costo preventivazione e spese dilazione pagamento;
- Rimborsi solleciti per morosità;
- Subentro/apertura misuratori e riattivazioni prese.

Le voci principali dei costi per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono:

- Materiali a magazzino;
- Materiali a impiego diretto;
- Carburanti autocarri e autovetture;
- Materiale vario di consumo;
- Autoricambi autovetture industriali;
- Vestiario e antinfortunistica;
- Acquisto acqua all'ingrosso;
- Prodotti per potabilizzazione.

I costi per Servizi derivano primariamente dalle seguenti voci:

- Prestazioni di imprese per lavori stradali, allestimento impianti e manutenzioni;
- Energia elettrica;
- Spese di spurgo, smaltimento fanghi e pulizia aree impianti;
- Spese per Assicurazioni, Danni e Franchigie;
- Canone di assistenza telecontrollo;
- Consulenze e prestazioni amministrative;
- Lettura contatori acqua, bollettazione;
- Spese postali;
- Call center;
- Spese telefoniche.


La voce Godimento beni di terzi accoglie le voci:


- Quota Fondo Progetti Strategici;
- Quota Funzionamento EGAto;
- Canoni di noleggio, licenze d'uso;
- Affitti passivi.

La voce Accantonamento per rischi accoglie accantonamenti ad integrazione di quelli effettuati nei precedenti esercizi a copertura di franchigie assicurative e possibili danni SII fuori franchigia.


Le voci principali degli Oneri diversi di gestione sono:


- Bonus Idrico integrativo;
- Imposta di bollo;
- Sopravvenienze passive;
- Contributi associativi;
- Spese istruttorie;
- Contributi a enti pubblici.

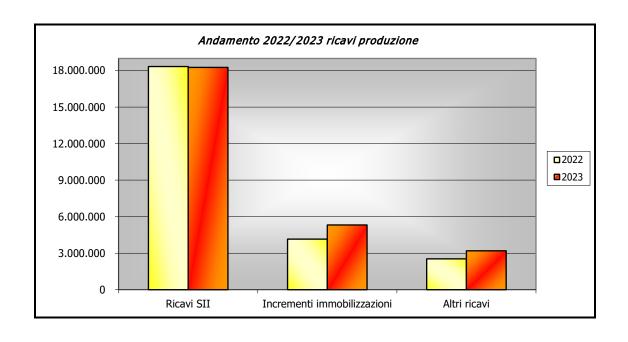

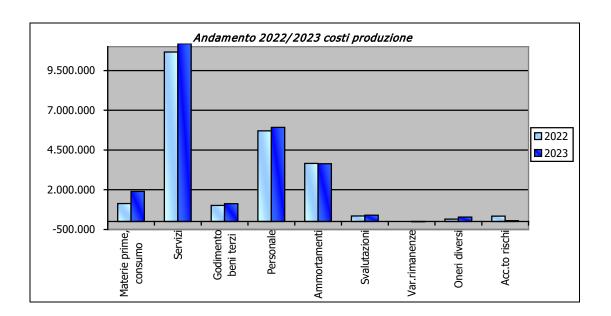

Grafici 7 e 8: Composizione ricavi e costi produzione Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato - confronto tra bilancio 2022 e bilancio 2023 –

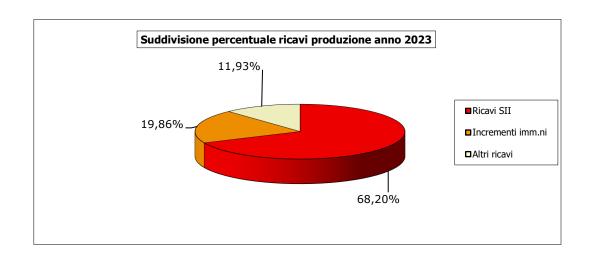

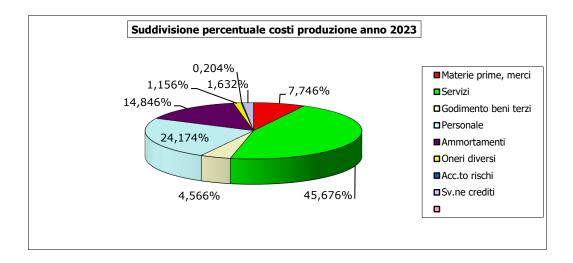

Grafici 9 e 10: Percentuali ricavi e costi produzione Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato - dati di bilancio 2023 –

Il valore della produzione anno 2023 aumenta rispetto al 2022 di Euro 1.752.247 passando da Euro 25.027.453 a Euro 26.779.700; analizzando le singole voci si riscontra:

 una diminuzione dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni, di Euro 72.000 circa.

La voce A1) del bilancio "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" viene valorizzata al netto della componente FoNI, Fondo Nuovi Investimenti. Tale fondo ammonta a Euro 3.398.989,86 nel 2022 e a Euro 3.611.855 nel 2023. Nei ricavi delle vendite è presente anche la voce Premi CSEA qualità tecnica e commerciale per Euro 365.958 nel 2022 e per Euro 1.779.931 nel 2023 relativa alla premialità ricevuta nell'ambito del meccanismo di premialità/penalità Arera. Occorre anche evidenziare che dal 2023 la quota di ricavo relativa al recupero del costo sostenuto per energia elettrica per l'interconnessione non

è più valorizzato nella voce A1 del bilancio bensì nella voce A5. Tale voce nel 2023 è pari a Euro 725.700;

- un aumento di 1.162.842 Euro degli Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni che rappresentano le spese sostenute nell'esercizio per l'allestimento di nuovi impianti e di rinnovi effettuati direttamente dal Consorzio;
- un aumento della voce A5) "Altri ricavi e proventi" di quasi Euro 662.000, dovuto principalmente alla presenza della voce Recupero costo energia interconnessione e all'incremento delle voci Quota FoNI esercizio, attenuato dalla diminuzione delle voci Credito imposta energia elettrica, Rimborso solleciti morosità, Rimborsi assicurativi e Recupero spese legali.

I costi della produzione aumentano di circa Euro 1.486.000 passando da Euro 23.015.754 a Euro 24.502.351.

Analizzando in dettaglio la variazione dei costi della produzione si rilevano maggiori spese per materie prime per circa Euro 767.000; la variazione è dovuta principalmente all'aumento dei materiali a scorta magazzino e del materiale a impiego diretto.

La voce costi per servizi, che rappresenta circa il 46% dell'ammontare costi della produzione, è aumentata di oltre Euro 500.000 per maggiori costi di energia elettrica e per prestazioni di terzi per lavori, mentre si registra una diminuzione per i costi relativi a spurghi, spese smaltimento fanghi e pulizia impianti.

I costi per godimento beni di terzi aumentano di oltre Euro 105.000 rispetto all'esercizio precedente, per maggiori canoni noleggio software e licenze d'uso e canoni noleggio generici.

Il costo del personale aumenta di Euro 220.000 circa.

La variazione delle rimanenze è pressoché stabile rispetto al 2022.

Nel 2023 sono state accantonare risorse a Fondo Rischi per Euro 50.000 principalmente a fronte di possibili future coperture di franchigie assicurative e possibili danni SII fuori franchigia.

Gli Oneri diversi di gestione aumentano di circa 130.000 Euro in relazione alla voce Bonus Idrico Integrativo.

La voce Ammortamenti diminuisce di 23.290 Euro. Tale voce è composta dalle sotto voci Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (principalmente software) e Ammortamenti immobilizzazioni materiali.

Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio ritenuto dal gestore ben rappresentato dalle aliquote collegate alla vita regolatoria di ogni categoria di immobilizzazioni stabilite dal metodo tariffario.

| Tipo Bene | % Ammortamento |
|---|----------------|
| Fabbricati industriali | 2,50% |
| Opere idrauliche fisse | 2,50% |
| Piezometri | 2,50% |
| Serbatoi | 2,50% |
| Impianti di depurazione | 5,00% |
| Impianti di fitodepurazione | 2,50% |
| Impianti di trattamento acqua - depurazione | 5,00% |
| Scaricatori di piena, sfiori | 2,50% |
| Reti idriche | 2,50% |
| Reti fognarie | 2,00% |
| Prese idriche | 2,50% |
| Prese fognarie | 2,00% |
| Impianti di sollevamento acqua | 12,50% |
| Impianti di sollevamento fogna | 12,50% |
| Apparecchi di misura | 10,00% |
| Impianti di telecontrollo acqua – fogna - depurazione | 12,50% |
| Motopompe ed elettropompe | 10,00% |
| Attrezzatura varia | 10,00% |
| Autocarri | 20,00% |
| Autovetture | 20,00% |
| Mobili ed arredi | 14,28% |
| Macchine ufficio ed elettroniche | 14,28% |

Tabella 4 – Aliquote ammortamento applicate da CCAM

La voce Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante indica l'accantonamento al Fondo Svalutazione. Nel 2023 si rilevano accantonamenti per 400.000 Euro al Fondo che a fine esercizio ammonta a 1.000.984 Euro.

Il reddito operativo, pari a 2.277.349 Euro, risulta in aumento rispetto all'anno precedente.

Rispetto al 2022 l'area finanziaria registra un miglioramento pari a Euro 148.230 in relazione a maggiori interessi attivi su c/c bancari e postali e indennità di mora, in parte controbilanciati da maggiori interessi passivi su mutui.

Le imposte dell'esercizio ammontano a Euro 421.208.

Il bilancio 2023 chiude con un utile d'esercizio pari a Euro 1.196.299, in aumento di oltre Euro 278.000 rispetto al risultato del 2022. Tale utile è stato destinato nel seguente modo:

- per Euro 598.149, pari al 50% del totale, al Fondo di Riserva per investimenti;
- per Euro 598.150 al Fondo Riserva Utili esercizi precedenti.

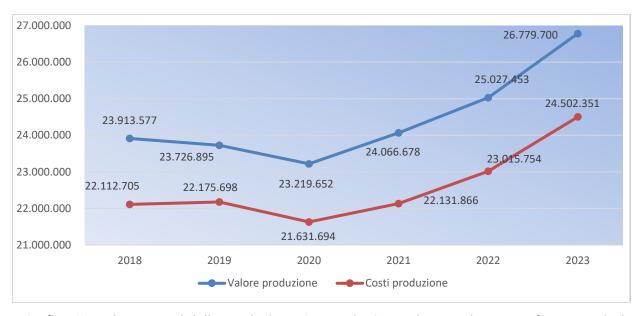


Grafico 11: Valore e costi della produzione Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato periodo 2018-2023

2.2.2.c Andamento della gestione nell'esercizio 2023

Gli interventi più significativi dell'esercizio 2023 sono stati i seguenti:

- rinnovo e potenziamento reti e nuove reti: interventi per sostituzione tratti di rete idrica per circa 8,8 Km e interventi di sostituzione tratti di rete fognaria per circa 2,3 Km. Sono inoltre stati posati circa 3 Km di nuova rete idrica e 0,5 Km di nuova rete fognaria;
- impianto di telecontrollo: nel corso del 2022 sono state eseguite le manutenzioni necessarie a garantire il corretto funzionamento del sistema di supervisione.

Sono inoltre state svolte le seguenti attività:

- Ammodernamento router di trasmissione dati impianti acquedotto nei Comuni di Albugnano, Alfiano, Altavilla, Aramengo, Asti, Baldichieri, Brusasco, Buttigliera, Callianetto e Calliano;
- Intervento di modifica impianti T3000 trasformazione a modello Aqualog utile per il telecontrollo;
- Telecontrollo di una valvola mantenitrice di pressione utile per la fornitura di acqua allo stabilimento Luxottica;
- Telecontrollo dell'impianto sito in loc. Moncucco;
- Implementazione di una misura di pressione in impianto già dotato di RTU;
- Fornitura, installazione e messa in servizio di impianto di monitoraggio;

- Controllo adduzione Serbatorio di S. Salvatore: inserimento e adeguamento del software sul PLC;
- Implementazioni stazioni di sollevamento fognario nei Comuni di Moncestino e Moncucco;
- Implementazioni segnali ON/OFF siti nei Comuni di Grana, Montechiaro e San Salvatore.

In relazione al servizio acquedotto nell'anno 2023 è stato erogato il servizio di distribuzione acqua potabile a 46.940 utenti, con un incremento di 103 unità rispetto all'anno precedente.

Il volume stimato di acqua venduto a tariffa 2023 è stato pari a 9.530.430 mc rispetto a 10.587.692 mc. del 2022.

Relativamente al servizio fognatura e depurazione, attualmente il Consorzio gestisce 655 scarichi.

Al 31 dicembre 2023 gli impianti di depurazione gestiti sono 627, di cui 165 allacciati alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.

2.2.3 Acquedotto della Piana S.p.A.

2.2.3.a Comuni serviti e assetto societario

L'Acquedotto della Piana ha iniziato nel 2005 la propria attività sotto la nuova veste di società per azioni, mentre in precedenza operava in qualità di società consortile.

A seguito delle deliberazioni dell'Autorità d'Ambito n. 86 del 30.12.2004 e 36 del 25.05.2006 in cui era stato individuato nel 31.12.2009 il termine ultimo affinché tutti i Comuni dell'Ambito, gestiti ancora in economia e/o in convenzione, si aggregassero ai Gestori che hanno avuto l'affidamento e il riconoscimento della gestione del servizio idrico integrato, nell'anno 2009 è stato completato il percorso per l'ampliamento della società. Si è provveduto, con l'assemblea dei soci in data 28.12.2009, ad aumentare il capitale sociale a pagamento e ad apportare le dovute modifiche ad alcuni articoli dello statuto sociale. La deliberazione ha consentito l'ingresso nella compagine sociale dei nuovi soci: Comuni di Antignano, Cantarana, Celle Enomondo, Cisterna d'Asti, Ferrere, Montafia, Revigliasco d'Asti, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, Tigliole e Villafranca d'Asti. A tali Comuni a fine 2011 si è aggiunto il Comune di Monale inizialmente legato all'Acquedotto della Piana da apposita convenzione.

La società gestisce direttamente tutti i servizi amministrativi comprendenti il rapporto con l'utenza, la lettura dei contatori, la bollettazione e il coordinamento del gestore operativo.

La gestione degli impianti e delle reti è effettuata direttamente dal gestore per i Comuni di Buttigliera, Cellarengo, Dusino San Michele, San Paolo Solbrito, Valfenera, Villanova d'Asti e Montafia e per i Comuni di Cantarana, Ferrere e Villafranca d'Asti (per il servizio di acquedotto).

Asti Servizi Pubblici opera quale gestore operativo di Acquedotto della Piana per i Comuni di Antignano, Celle Enomondo, Cisterna d'Asti, Monale, Revigliasco d'Asti, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, Tigliole per l'intero Servizio Idrico Integrato e per i Comuni di Cantarana, Ferrere e Villafranca d'Asti, solo per il servizio fognatura e depurazione. La gestione operativa dei nuovi Comuni, ad eccezione di Montafia, è stata affidata dall'Acquedotto della Piana ad ASP in virtù delle conoscenze e del know-how derivanti dall'esperienza maturata nel settore, nell'ottica di sviluppo di sinergie strategiche al fine di ottimizzare i livelli di qualità del servizio in linea con gli obiettivi dell'Ato5.

2.2.3.b Analisi temporale

L'analisi permette di confrontare i valori registrati nelle più significative voci di conto economico negli esercizi 2023 e 2022 e di valutare il loro andamento e gli scostamenti registrati nei due anni.

| Voci di bilancio | Valori al 31/12/2023 | Valori al 31/12/2022 | Scostamento |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 5.162.136 | 5.133.114 | 29.022 |
| Incrementi immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| Altri ricavi e proventi | 1.017.580 | 286.524 | 731.056 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 6.179.716 | 5.419.638 | 760.078 |
| Costi materie prime, sussidiarie, di | | | |
| consumo e merci | 26.940 | 23.166 | 3.774 |
| Costi per servizi | 3.416.790 | 3.053.821 | 362.969 |
| Costi per godimento beni di terzi | 26.756 | 27.360 | -604 |
| Costi per il personale | 689.132 | 710.262 | -21.130 |
| Ammortamenti | 574.209 | 575.867 | -1.658 |
| Svalutazione crediti | 70.000 | 170.000 | -100.000 |
| Variazione rimanenze | 169 | -420 | 589 |
| Accantonamento per rischi | 13.363 | 0 | 13.363 |
| Oneri diversi di gestione | 452.945 | 440.931 | 12.014 |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | 5.270.304 | 5.000.987 | 269.317 |
| DIFF VALORI-COSTI PRODUZIONE | 909.412 | 418.651 | 490.761 |
| Proventi e oneri finanziari | -350.296 | -300.778 | -49.518 |
| Risultato prima delle imposte | 559.116 | 117.873 | 441.243 |
| Imposte | -553.968 | -21.541 | -532.427 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 5.148 | 96.332 | -91.184 |

Tabella 5: Confronto tra dati di conto economico 2023 e 2022 - Acquedotto della Piana S.p.A. -

Le voci principali che compongono i Ricavi delle vendite e delle prestazioni sono:

- Corrispettivi bollettazione;
- Ricavi servizi fognatura e depurazione;
- Proventi per allacciamenti;
- Prestazioni e servizi accessori;
- Ricavi per idranti;

- Ricavi manutenzione allacciamenti;
- Ricavi vendita acqua all'ingrosso.

Le voci principali degli Altri ricavi e proventi sono:

- Premialità Arera da Csea legate ai meccanismi di premialità/penalità della qualità tecnica e commerciale;
- Contributi in conto esercizio;
- Locazioni attive immobili strumentali;
- Sopravvenienze attive straordinarie;
- Proventi diversi;
- Sopravvenienze attive ordinarie.

I costi per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci derivano dalle seguenti voci:

- Carburanti e lubrificanti;
- Acquisti materiale di consumo;
- Cancelleria.


Le voci principali dei costi per Servizi sono:


- Energia elettrica;
- Servizio Asp Asti;
- Spese di manutenzione;
- Acquisto acqua all'ingrosso;
- Servizi di potabilizzazione;
- Servizio gestione sportelli;
- Servizio lettura contatori;
- Servizio recupero crediti;
- Servizi bancari;
- Adempimenti e report Arera.

La voce Godimento beni di terzi accoglie canoni software e uso locali, attrezzature e altri beni.


Le voci principali degli Oneri diversi di gestione sono:


- Quota mutui a Comuni;
- Quota fondo progetti strategici;
- Quota Funzionamento Egato5;
- Altri oneri di gestione;
- Sopravvenienze passive.

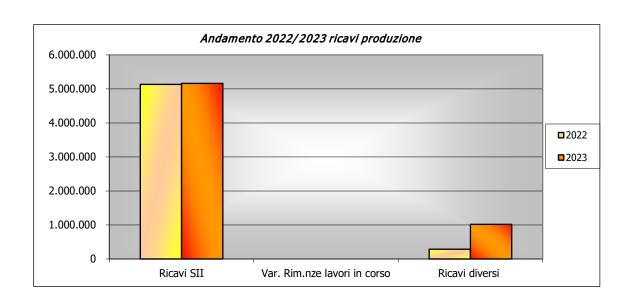

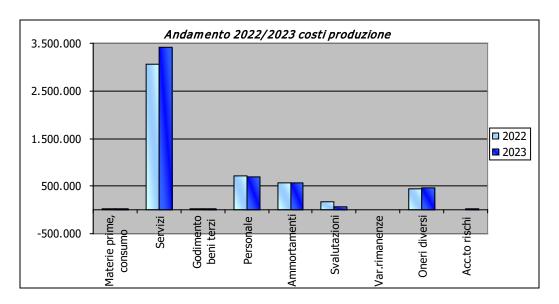

Grafici 12 e 13: Composizione ricavi e costi della produzione dell'Acquedotto della Piana S.p.A. - confronto tra bilancio 2022 e bilancio 2023 –

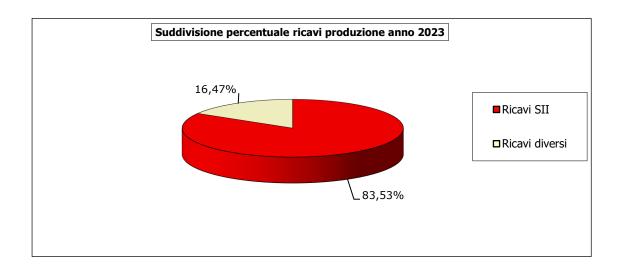



Grafici 14 e 15 : Percentuali di ricavi e costi della produzione Acquedotto della Piana S.p.A. - dati di bilancio 2023 -

Il valore della produzione del 2023 si incrementa rispetto al 2022 passando da Euro 5.419.638 a Euro 6.179.716.

La voce di bilancio A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni presenta un lieve aumento di circa Euro 29.000 per effetto dell'incremento dei proventi per allacciamenti controbilancio dalla diminuzione dei corrispettivi bollettazione.

Nel VRG del gestore Acquedotto della Piana è presente la componente FoNI (Fondo Nuovi Investimenti) che viene contabilizzata coerentemente con le tecniche di rendicontazione regolatorie stabilite da ARERA, in base alle quali tale componente è assimilata a un contributo pubblico in conto impianti e come tale deve essere rilevata secondo quanto previsto dall'OIC 16. Pertanto, la componente FoNI è stata scorporata dai ricavi tariffari è portata in diminuzione del costo dei cespiti da essa finanziati.

Per la gestione Acquedotto della Piana, il FoNI è pari a Euro 214.505 nel 2022 e a Euro 250.314; tali importi vengono sottratti dai ricavi delle vendite e delle prestazioni.

La voce A5 Altri ricavi e proventi aumenta di Euro 731.078 per effetto della voce Premialità Arera da Csea, pari a Euro 830.087,62 legata alle premialità Arera di qualità tecnica e contrattuale per gli anni 2020 e 2021, mentre diminuiscono le voci Sopravvenienze attive e Contributi energia elettrica imprese non energivore.

I costi della produzione aumentano di oltre 269.000 Euro passando da Euro 5.000.987 nel 2022 a Euro 5.270.304 nel 2023, in relazione all'incremento dei costi per servizi.

Le voci Costo per Materie prime, Godimento beni di terzi e Variazione rimanenze sono stabili nei due anni mentre gli Oneri diversi di gestione registrano un aumento rispetto al 2022 di circa 12.000 Euro.

I costi per Servizi aumentano di circa 363.000 Euro in relazione all'incrementi dei costi sostenuti per energia elettrica, per manutenzione rete idrica e impianti e per assicurazioni.

I Costi del Personale diminuiscono di circa 21.000 Euro.

La voce Ammortamenti, composta dalle sotto voci Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (software), Ammortamenti immobilizzazioni materiali, diminuisce di 1.658 Euro.

In merito alle aliquote di ammortamento si specifica che il gestore calcola gli ammortamenti delle immobilizzazioni sulla base di aliquote determinate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Le aliquote concretamente applicate, desunte dalla stima della vita utile residua dei beni, sono le seguenti:

| Tipo bene | % ammortamento |
|-------------------------------|----------------|
| Impianti generici | 15% |
| Attrezzature | 10% |
| Condutture | 1,5% |
| Impianti di filtrazione | 5% |
| Impianti di sollevamento | 10% |
| Fabbricati | 3,5% |
| Opere idrauliche | 2,5% |
| Serbatoi | 4% |
| Impianti specifici | 15% |
| Mobili e macchine d'ufficio | 12% |
| Autoveicoli da trasporto | 20% |
| Autovetture | 25% |
| Arredamento | 12% |
| Macchine ufficio elettroniche | 20% |
| Telefoni cellulari | 20% |

Tabella 6 – Aliquote ammortamento applicate da Acquedotto della Piana

L'accantonamento per svalutazione crediti dell'anno 2022 è pari a Euro 70.000, (rispetto a Euro 170.000 accantonati del 2022, Euro 175.000 accantonati nel 2021 ed Euro 173.000 accantonati nel 2020). Il Fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2023 è pari Euro 1.309.292,59.

In bilancio 2023 è presente la voce accantonamento per rischi di 13.363 Euro riferito alle penalità relative alle annualità 2020 e 2021 per il mancato

conseguimento degli obiettivi stabiliti secondo quanto previsto al comma 29.1 della Regolazione della Qualità Tecnica (RQTI) come da delibera ARERA n. 477 del 17 ottobre 2023.

Il reddito operativo, pari a Euro 909.412, risulta inferiore rispetto all'anno precedente di circa 491.000 Euro.

Il risultato della gestione finanziaria presenta un saldo negativo pari ad Euro 350.296, in aumento rispetto all'esercizio precedente di quasi Euro 50.000 per maggiori interessi passivi su finanziamenti.

Le imposte dell'esercizio ammontano a Euro 553.968 e sono rappresentate da IRES e IRAP dell'esercizio e IRES anticipata; sono state imputate a costo e quindi azzerate le attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante in assenza dei presupposti richiesti per il loro mantenimento in bilancio.

L'esercizio 2022 si chiude con un utile di Euro 5.148, rispetto a Euro 96.332 del 2022. L'utile è stato interamente destinato a riserva straordinaria.

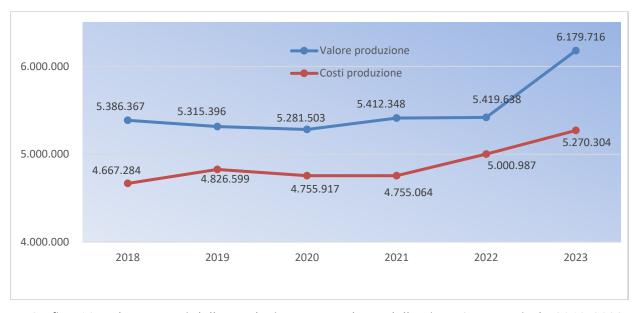


Grafico 16: Valore e costi della produzione Acquedotto della Piana S.p.A. periodo 2018-2023

2.2.2.c Andamento della gestione nell'esercizio 2023

Nell'anno 2023 la spesa totale per investimenti è stata di Euro 1.587.325,62 (rispetto ai quasi 580.000 del 2022) ripartita per Euro 739.005,14 per il comparto acquedotto, Euro 763.431,61 per il comparto fognatura, Euro 63.816,48 per il comparto depurazione ed Euro 21.072,39 per attrezzature, automezzi, telecontrollo ed impianti specifici.

2.2.4 Asti Servizi Pubblici S.p.A.

2.2.4.a Comuni serviti e assetto societario

A partire dal 2006 la società ha avviato un processo di diversificazione dell'attività aziendale che attualmente è suddivisa nelle seguenti business units:

- Servizio Idrico Integrato;
- Trasporti e Mobilità;
- Igiene Ambientale;
- Servizi Cimiteriali.

Dal 2010 l'ASP fornisce il servizio idrico integrato al solo Comune di Asti.

2.2.4.b Analisi temporale

L'analisi che mette a confronto i principali dati di conto economico del 2023 con quelli del 2022 considera il conto economico relativo agli utenti del Comune di Asti.

| Voci di bilancio | Valori al 31/12/2023 | Valori al 31/12/2022 | Scostamento |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 8.752.070 | 9.306.487 | -554.417 |
| Incrementi immobilizzazioni | 570.189 | 580.715 | |
| Altri ricavi e proventi | 2.863.562 | 8.393.774 | -5.530.212 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 12.185.821 | 18.280.976 | -6.095.155 |
| Costi mat.pr, suss, di consumo e merci | 2.238.265 | 3.141.980 | -903.715 |
| Costi per servizi | 1.168.511 | 1.145.327 | 23.184 |
| Costi godimento beni di terzi | 277.306 | 431.205 | -153.899 |
| Costi per il personale | 2.705.406 | 2.616.787 | 88.619 |
| Ammortamenti | 2.844.017 | 2.979.498 | -135.481 |
| Svalutazione crediti | 0 | 0 | 0 |
| Accantonamenti per rischi | 301.135 | 59.617 | 241.518 |
| Oneri diversi di gestione | 477.451 | 285.931 | 191.520 |
| Costi interscambio prestazioni fra b.u. | 53.751 | 39.649 | 14.102 |
| Costi indiretti totali | 1.089.867 | 1.166.646 | -76.779 |
| COSTI DI PRODUZIONE | 11.155.709 | 11.866.640 | -710.931 |
| DIFF. VALORE-COSTI | 1.030.112 | 6.414.337 | -5.384.225 |
| Proventi e oneri finanziari | -137.553 | -127.673 | -9.880 |
| Risultato prima delle imposte | 892.561 | 6.286.664 | -5.394.103 |
| Imposte | | | |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | | | |

Tabella 7: Confronto tra dati di conto economico 2023 e 2022 riferiti al S.I.I. - ASP S.p.A. comparto Idrico Comune di Asti –

Le voci principali che compongono i Ricavi delle vendite e delle prestazioni sono:

- Ricavi da tariffa: consumo acqua, canoni fognatura e depurazione, quote di accesso acquedotto, fognatura e depurazione, conquagli SII;
- Corrispettivi servizi specifici: ricavi da fognatura e depurazione su industriali, vendita acqua all'ingrosso, prestazioni e servizi accessori, trattamento percolati, lavori conto terzi, spurgo pozzi neri.

Gli Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni rappresentano le spese sostenute nell'esercizio per l'allestimento di nuovi impianti e di rinnovi effettuati direttamente dalla società.

Le voci principali degli Altri ricavi e proventi sono:

- Contributi c/impianti per quote annuali di contributi ricevuti per la realizzazione di investimenti del SII;
- Corrispettivi dei contratti in essere con altri gestori dell'Ambito;
- Premialità da ARERA in relazione alla qualità tecnica;
- Sopravvenienze attive;
- Contributi allacciamento;
- Penalità da clienti.

Le voci principali dei costi per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono:

- Energia elettrica;
- Acqua e gasolio;
- Ricambi: consumo merce;
- Altri beni: vestiario, materiali di consumo;
- Carburanti.

I costi per Servizi derivano dalle seguenti voci:

- Costi per fanghi, depurazione;
- Quota fondo progetti strategici,
- Manutenzioni;
- Spese amministrative;
- Utenze telefoniche;
- Quota fondo funzionamento EGAto;
- Consulenze software;
 oltre che da altre voci residuali.

La voce Godimento beni di terzi accoglie i seguenti costi:


- Manutenzione ordinaria beni di terzi;
- Noleggi.


Le voci principali degli Oneri diversi di gestione sono:

- Bonus idrico integrativo;
- Oneri autorità diversi;


- Sopravvenienze passive deducibili e indeducibili;
- IMU, tasse e concessioni statali;
- Imposte di bollo.


I costi di interscambio prestazioni tra BU e i costi indiretti totali (costi di struttura comuni, costi aziendali comuni e costi di staff) rappresentano la quota di costi generali dell'azienda che viene attribuita alla business unit Idrico.

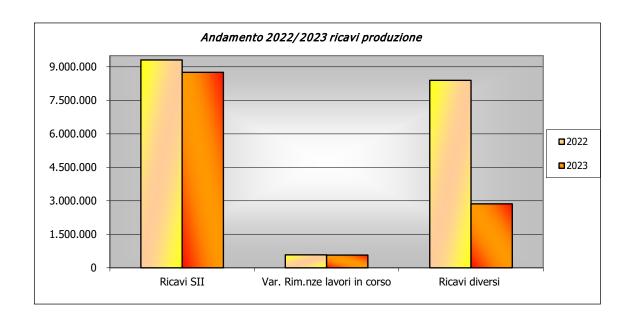

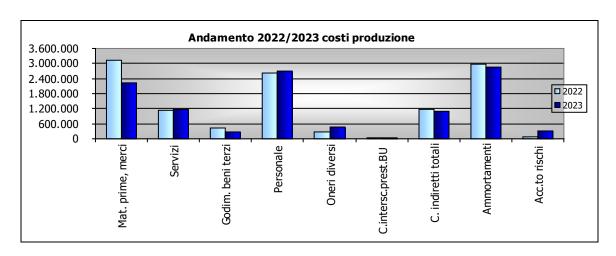

Grafici 17 e 18: Composizione ricavi e costi della produzione dell'ASP S.p.A. – Asti - confronto tra bilancio 2022 e bilancio 2023

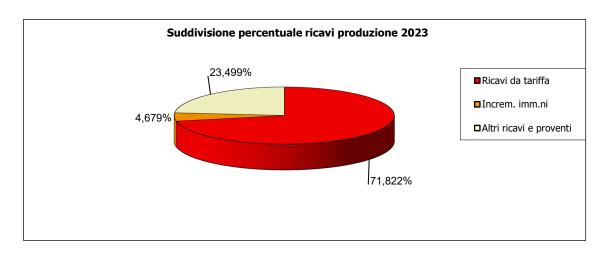

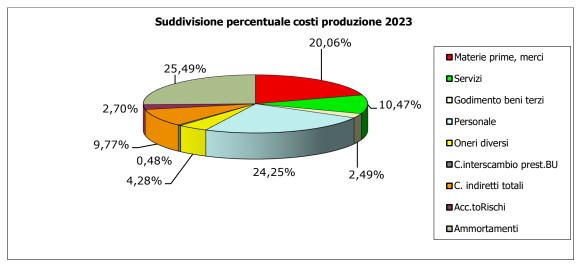

Grafici 19 e 20: Percentuali di ricavi e costi della produzione dell'ASP S.p.A. – Asti - dati di bilancio 2023 -

Il confronto tra il valore della produzione dell'esercizio 2023 con quello dell'anno 2022 evidenzia una flessione di oltre 6.000.000 di Euro, passando da Euro 18.280.976 a Euro 12.185.821; analizzando le singole voci si evidenzia quanto segue. Nel 2023 i ricavi delle vendite e delle prestazioni, pari a Euro 8.752.070, diminuiscono rispetto al 2022 di Euro 554.417.

Occorre considerare che i ricavi tariffari sono espressi al netto della voce conguagli relativa a penalizzazioni pregresse per note credito da emettere a seguito di mancati investimenti in anni passati, a FoNI dell'anno e a conguagli stimati sulle tariffe dell'anno. Tale voce ammonta a Euro 812.827 nel 2022 e a Euro 1.164.501 nel 2023.

Dall'applicazione del nuovo metodo tariffario per la gestione ASP anno 2022 il Fondo Nuovi Investimenti ammonta a Euro 1.581.968, mentre per il 2023 è pari a Euro 1.653.394.

Gli Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni che rappresentano le spese sostenute nell'esercizio per l'allestimento di nuovi impianti e di rinnovi effettuati direttamente dal gestore, diminuiscono di 10.000 Euro.

Gli altri ricavi e proventi, rappresentati principalmente da Contributi c/impianti, Sopravvenienze attive, Contributi allacciamento e Risarcimenti danni, sono diminuiti di circa 5.530.000 di Euro; tale decremento è da ricondursi alla premialità legata agli indicatori di qualità tecnica. Infatti, l'esercizio 2023 il bilancio ha beneficiato della premialità ARERA relativa ai dati di qualità tecnica del biennio 2020-2021, per un importo straordinario di circa 1,5 Milioni di euro, importo inferiore rispetto ai 6,5 Milioni di euro del 2022.

Rispetto al 2022, nell'esercizio 2023 i costi della produzione hanno registrato una diminuzione di circa 700.000 Euro.

I costi per Materie prime diminuiscono di circa 900.000 di Euro in relazione alla diminuzione dei costi per energia, gasolio e acqua.

I costi per Servizi sono in linea nei due anni.

I costi per godimento beni di terzi diminuiscono di circa 150.000 Euro rispetto all'esercizio precedente.

Il costo del personale aumenta di oltre 80.000 Euro.

Sia nel 2023 sia nel 2022 il comparto idrico non ha ritenuto di accantonare risorse sul Fondo svalutazione crediti.

Nel 2023 sono stati accantonati a Fondo rischi oltre 300.000 Euro, rispetto ai 59.000 del 2022.

Gli Oneri diversi di gestione aumentano rispetto al 2022 di circa 190.000 Euro.

La voce Ammortamenti aumenta di circa 130.000 Euro. Tale voce è composta dalle sotto voci Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (software e oneri pluriennali) e Ammortamenti immobilizzazioni materiali.

In merito alle aliquote di ammortamento si specifica quanto segue. Asp calcola gli ammortamenti delle immobilizzazioni come automezzi, autovetture, attrezzatura sulla base delle aliquote indicate dal D.M. 31 dicembre 1988 (modificato con D.M. 28 marzo 1996) in alcuni casi dimezzate (come per le autovetture); per tutti gli investimenti in qualche modo legati ai lavori pubblici, compreso il telecontrollo, anche considerando il fatto che sono inventariati dal gestore come Oneri pluriennali su beni di terzi, al 31/12/2023 ASP utilizzava il 5,7%, corrispondente ad una vita utile di anni 17,54.

I costi di interscambio prestazioni tra business unit, attribuibili a costi per servizi comuni all'intera azienda e poi suddivisi tra le varie attività aziendali, sono in linea con il 2022.

I costi indiretti totali, composti da costi generali dell'azienda attribuiti alle business unit secondo driver di ribaltamento, scendono di circa 77.000 Euro.

Quanto sopra esposto porta a un risultato operativo di 1.030.112 Euro, in diminuzione rispetto ai 6.414.337 Euro del 2022.

L'area finanziaria registra un saldo negativo pari a 137.553 Euro in linea con il 2022.

Nel 2023 la gestione dell'idrico relativa al Comune di Asti registra un utile ante imposte pari a 892.561 Euro.

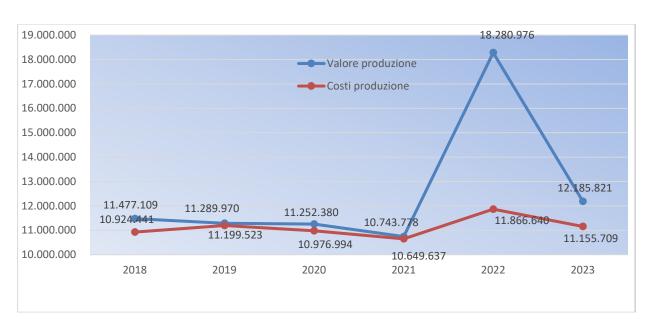


Grafico 21: Valore e costi della produzione Asti Servizi Pubblici S.p.A. periodo 2018-2023

2.2.4.c Andamento della gestione nell'esercizio 2023

- SERVIZIO ACQUEDOTTO -

ASP ha la titolarità della gestione del Servizio Idrico Integrato per il Comune di Asti per complessivi 75.000 abitanti circa ed effettua la gestione tecnica per conto dell'Acquedotto della Piana S.p.A. per ulteriori 11 comuni.

Nel complesso ASP gestisce per Asti circa 35 km di rete di adduzione e 715 km di rete di distribuzione acquedotto, un campo pozzi con impianto di deferromanganizzazione e svariati serbatoi di accumulo/compenso.

Nel corso del 2023 sono stati eseguiti numerosi interventi di manutenzione straordinaria prevalentemente con personale ASP. Nell'esigenza di mantenere in piena efficienza il campo pozzi di Cantarana, il gestore ha predisposto un piano di mantenimento generale atto a garantire, con la captazione di volumi sempre inferiori a quelli di concessione, la portata complessiva di alimentazione principale all'impianto di potabilizzazione di Cantarana, prevedendo la sostituzione dei pozzi

in esercizio che manifestano i problemi più seri quali riduzione drastica della portata emunta, insabbiamento, deficit strutturali. Nel corso del 2023 sono terminati i lavori di realizzazione del nuovo pozzo P12bis, in sostituzione dell'esistente pozzo, ormai inadatto, che ha visto un investimento di circa euro 300.000. Nel corso del 2023 sono proseguiti i lavori di realizzazione del nuovo serbatoio di Villaggio Aurora, con raddoppio della capacità dell'attuale serbatoio per consentire la manutenzione dell'esistente e incrementare i volumi di compenso della città. Nel 2023 il gestore ha provveduto alla risoluzione contrattuale con l'appaltatore dei lavori di interconnessione di Bricco Roasio e sostituzione rete in località Rilate, intervento volto all'ottimizzazione dell'approvvigionamento e della qualità idrica della frazione, nonché alla riduzione delle perdite di rete: ASP ha provveduto allo scorrimento della graduatoria originaria e i lavori sono stati riaffidati alla seconda impresa classificata.

- SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE -

ASP gestisce circa 233 km di rete fognaria di tipo misto che comprende 14 impianti di sollevamento, 16 depuratori minori dislocati sul territorio, 49 sfioratori di piena e l'impianto di depurazione centrale di Strada Quaglie di Asti per una capacità equivalente pari a circa 95.000 abitanti.

Nella primavera del 2023 è terminato il primo lotto di lavori di Razionalizzazione fognatura Asti est, con una spesa di circa 420.000 Euro.

In merito all'impianto di depurazione nel corso del 2023 si è provveduto a realizzare diversi interventi di manutenzione straordinaria al fine di migliorarne l'efficienza.

Ad inizio 2023 sono stati sospesi i lavori di razionalizzazione dei collettori fognari e la realizzazione di idrovore all'interno del Depuratore di Asti, avviati nel 2022 per un importo totale del quadro economico di spesa aggiornato di euro 5.660.000. Nel corso del 2023 si è provveduto a- recedere dal contratto di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva con il RTI affidatario, avocare internamente la direzione lavori, riaffidando le funzioni di RUP, ricostituire un nuovo ufficio di direzione lavori coinvolgendo professionalità tecniche esterne, sviluppare il progetto di variante suppletiva. La perizia di variante, sottoscritta dall'appaltatore, ha permesso la ripresa dei lavori nel corso del mese di marzo 2024.

.....

2.2.4.d Conto economico idrico ASP complessivo 2023

Per completezza di analisi nella tabella seguente si riporta il conto economico ASP settore idrico complessivo. Si rileva che relativamente alla voce Accantonamento per rischi per entrambe gli anni è stato riportato lo stesso importo indicato nel conto economico comparto Comune di Asti.

| Voci di bilancio | Valori al 31/12/2023 | Valori al 31/12/2022 | Scostamento |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Ricavi delle vendite e prestazioni | 8.803.398 | 9.382.466 | -579.068 |
| Incremento immobilizzazioni | 570.189 | 580.715 | -10.526 |
| Altri ricavi | 4.052.608 | 9.592.907 | -5.540.299 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 13.426.195 | 19.556.088 | -6.129.893 |
| Costi materie prime, di consumo e | | | |
| merci | 2.426.441 | 3.412.033 | -985.592 |
| Costi per servizi | 1.265.052 | 1.190.417 | 74.635 |
| Costi godimento beni di terzi | 395.530 | 559.777 | -164.247 |
| Costi per il personale | 3.225.750 | 3.216.566 | 9.184 |
| Ammortamenti | 2.885.801 | 3.017.767 | -131.966 |
| Svalutazione crediti | 0 | 0 | 0 |
| Accantonamento per rischi | 301.135 | 59.617 | 241.518 |
| Oneri diversi di gestione | 489.058 | 292.545 | 196.513 |
| Costi interscambio prestazioni tra BU | 53.751 | 39.649 | 14.102 |
| Costi indiretti totali | 1.196.632 | 1.245.127 | -48.495 |
| COSTI DI PRODUZIONE | 12.239.150 | 13.033.498 | -794.348 |
| DIFF. VALORE-COSTI | 1.187.045 | 6.522.590 | -5.335.545 |
| Proventi e oneri finanziari | -151.686 | -75.427 | -76.259 |
| Risultato prima delle imposte | 1.035.359 | 6.447.163 | -5.411.804 |
| Imposte | -319.246 | -1.838.957 | 1.519.711 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 716.113 | 4.608.206 | -3.892.093 |

Tabella 8: Conto economico ASP S.p.A. 2023 e 2022 ASP comparto idrico

.....

2.2.6 Egato5 Astigiano-Monferrato – Conto economico aggregato

Per conoscere l'andamento della gestione del Sistema Idrico Integrato a livello d'ambito negli anni 2022 e 2023 si propone il conto economico aggregato dell'Ato5 relativo agli esercizi presi in esame.

I dati sono stati ottenuti dalla somma dei valori di bilancio dei gestori, senza azzerare le poste infragruppo.


Per l'ASP si è considerato il conto economico dell'intero comparto idrico.


L'aggregato non comprende la gestione operativa dei Comuni di Canelli e Nizza M.to.

| VOCI DI BILANCIO | 2023 | 2022 | 2023-2022 |
|--|------------|------------|-------------|
| Ricavi vendite e prestazioni | 42.171.551 | 42.352.376 | - 180.825 |
| Incrementi immobilizzazioni | 7.208.352 | 5.724.672 | 1.483.680 |
| Altri ricavi e proventi | 10.366.777 | 14.448.962 | - 4.082.185 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 59.746.680 | 62.526.010 | - 2.779.330 |
| Costi per materie prime, sussidiarie, di | | | |
| consumo e merci | 5.780.242 | 5.812.861 | - 32.619 |
| Costi per servizi | 24.914.805 | 23.406.277 | 1.508.528 |
| Costi per godimento beni di terzi | 1.595.466 | 1.656.876 | - 61.410 |
| Costi per personale | 11.757.874 | 11.504.564 | 253.310 |
| Ammortamenti | 7.746.624 | 7.864.309 | - 117.685 |
| Svalutazione crediti | 496.804 | 537.539 | - 40.735 |
| Variazioni rimanenze | 8.185 | - 26.400 | 34.585 |
| Accantonamento rischi | 366.003 | 400.126 | - 34.123 |
| Oneri diversi di gestione | 1.350.562 | 979.512 | 371.050 |
| Costi interscambio prestazioni tra BU | 53.751 | 39.649 | 14.102 |
| Costi indiretti totali | 1.196.632 | 1.245.127 | - 48.495 |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | 55.266.948 | 53.420.440 | 1.846.508 |
| DIFF. VALORI E COSTI PRODUZIONE | 4.479.732 | 9.105.570 | - 4.625.838 |
| Proventi e oneri finanziari | -1.189.580 | -1.330.847 | 141.267 |
| Rettifiche da partecipazioni | 92 | 0 | 92 |
| Risultato prima delle imposte | 3.290.244 | 7.774.723 | - 4.484.479 |
| Imposte | -1.271.174 | -2.068.895 | 797.721 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 2.019.070 | 5.705.828 | - 3.686.758 |

Tabella 9: Conto economico aggregato dell'Ato5 - esercizi 2023-2022

......

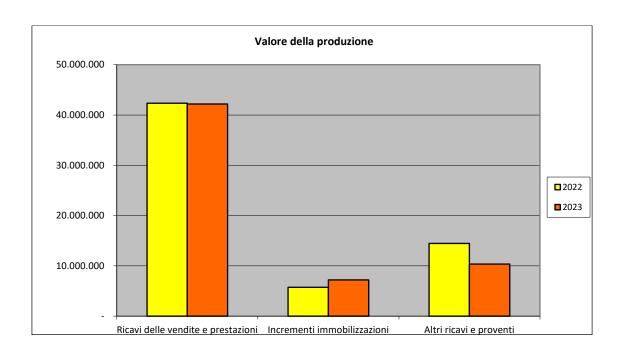

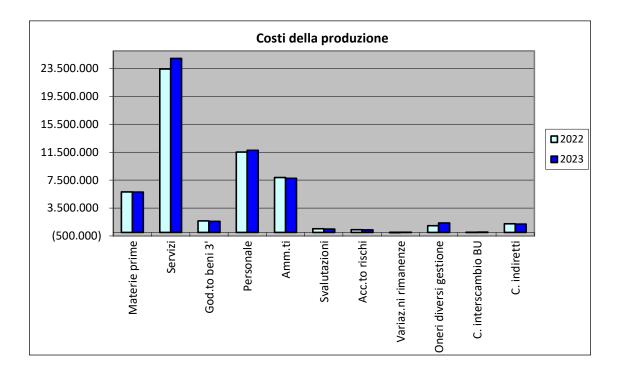

Grafici 22 e 23: Composizione dei ricavi e ripartizione dei costi della produzione dell'Ato5 - confronto tra bilancio 2023 e bilancio 2022

A livello d'Ambito tra 2022 e 2023 il valore della produzione registra una flessione pari a Euro 2.779.330, passando da Euro 62.526.010 a Euro 59.746.680: si registrano aumenti negli Incrementi delle immobilizzazioni, mentre le voci Ricavi delle vendite e delle prestazioni e Altri ricavi e proventi sono in diminuzione.

I costi della produzione aumentano di Euro 1.846.508 passando da Euro 53.420.440 a Euro 55.266.948: si registrano incrementi nelle voci Costi per servizi, Oneri diversi di gestione, Personale, Variazione delle rimanenze e Costi interscambio prestazioni tra BU (costo ASP), mentre le altre voci di costo sono diminuite.

Il risultato operativo ammonta a Euro 4.479.732 con un decremento di Euro 4.625.838 rispetto ai 9.105.570 del 2022.

Nel 2023 il saldo negativo relativo alla gestione finanziaria segna un miglioramento, pari a Euro 141.267.

Il risultato prima delle imposte, pari a Euro 3.290.244 è diminuito rispetto al 2022 di quasi 4.500.000 Euro.

L'esercizio 2023 si chiude con un utile a livello d'Ambito di Euro 2.019.070, rispetto a Euro 5.705.828 del 2022.

2.2.6.a Analisi forza motrice Gestori anni 2019 - 2023

In considerazione della rilevanza assunta dalla voce "energia elettrica" nei bilanci dei gestori, si propongono di seguito alcuni grafici che evidenziano l'ammontare del costo sostenuto, i Kwh consumati, il costo medio per Kwh e la percentuale della voce energia elettrica sul totale dei costi operativi per ogni gestore negli anni dal 2019 al 2023.

Nel conteggio dei costi operativi non vengono considerate le seguenti voci:

- canone (quota funzionamento Ente d'ambito + Quota Fondo Progetti Strategici + mutui riconosciuti ai Comuni);
- ammortamenti e svalutazioni;
- accantonamenti per rischi.

Inoltre, dove presente, è stata sottratta la voce "incrementi immobilizzazioni per lavori interni".

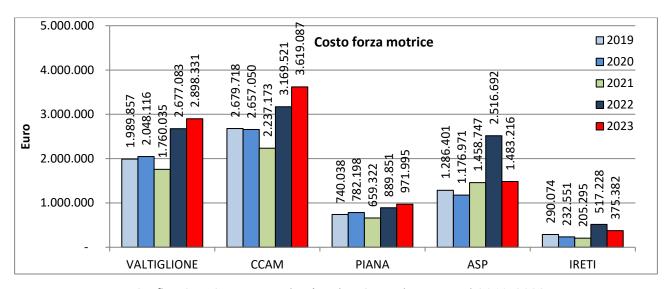


Grafico 24: Costo energia elettrica Gestori Ato5 anni 2019-2023

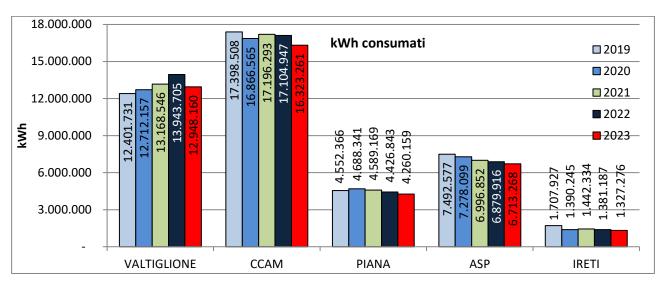


Grafico 25: Kwh consumati Gestori Ato5 anni 2019-2023

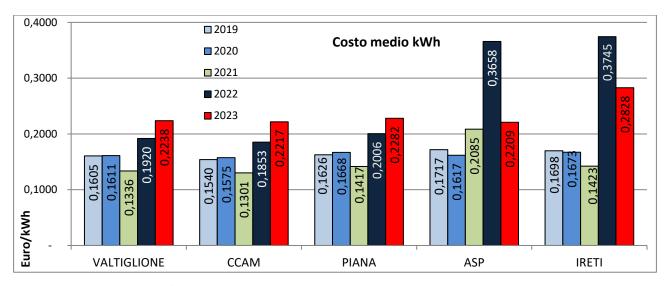


Grafico 26: Costo medio Kwh Gestori Ato5 anni 2019-2023

Come evidenziano i grafici precedenti, considerando gli anni 2022 e 2023, i costi complessivi per energia elettrica, nonché il costo medio per kWh, sostenuti dai gestori sono aumentati per CCAM, Acquedotto Valtiglione e Acquedotto della Piana, mentre sono diminuiti per ASP e Ireti.

Il consumo di energia elettrica espresso in Kwh è diminuito per tutti i gestori.

In merito ai Kwh consumati occorre considerare anche i fattori che influenzano minori o maggiori consumi quali la quantità di acqua prelevata e distribuita, le caratteristiche orografiche del suolo in cui opera il gestore (territori collinari richiedono molti rilanci che non sono necessari quando il territorio servito è pianeggiante), la dispersione delle utenze sul territorio servito; rilevante è anche la percentuale di perdite rispetto a quanto prelevato.

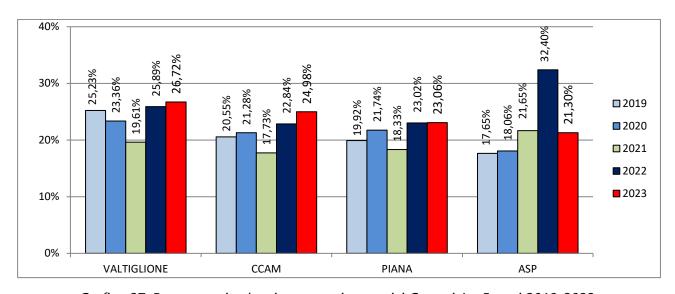


Grafico 27: Peso energia elettrica su costi operativi Gestori Ato5 anni 2019-2023

Il peso del costo sostenuto per energia elettrica sul totale dei costi operativi del 2023, rispetto all'anno precedente, risulta in lieve aumento per Acquedotto Valtiglione e CCAM, stabile per Acquedotto della Piana e in diminuzione per ASP.

.....

2.3 ANALISI PER INDICI DEI BILANCI DEI GESTORI

2.3.1 Introduzione

L'analisi economica esamina la redditività aziendale, ossia la capacità dell'azienda di garantire la copertura dei costi e conseguire un congruo utile.

I dati di bilancio hanno la caratteristica di essere espressi in valore assoluto; tali valori sono importanti per riuscire a capire le dimensioni dell'azienda, l'entità del suo patrimonio, dei suoi debiti e dei suoi crediti, l'ammontare delle vendite e dei costi.

Al di là del confronto sui puri valori assoluti è utile confrontare il bilancio con i bilanci della stessa azienda degli anni precedenti o con quelli di aziende operanti nello stesso settore.

Risultano anche significativi un confronto e un'analisi dei valori percentuali o dei rapporti tra le varie voci attraverso l'analisi per indici.

La costruzione degli indici di bilancio si pone i seguenti obiettivi:

- permettere una lettura e una interpretazione più facili di alcuni dati;
- consentire l'individuazione di collegamenti che i semplici valori assoluti non sono in grado di evidenziare;
- permettere la costruzione di indicatori di sintesi che consentono il controllo dei fattori chiave dell'attività aziendale, attraverso un quadro di controllo composto da pochi elementi significativi;
- ricercare forme di presentazione dei dati facilmente interpretabili.

Gli indici di bilancio permettono di individuare eventuali squilibri e l'area aziendale in cui si trovano.

La costruzione degli indici di bilancio è una delle possibili tecniche per cercare di trarre da tale documento il maggior numero possibile di informazioni dell'azienda; l'analisi per indici è spesso adottata dagli analisti esterni all'azienda.

Risulta di fondamentale importanza che il bilancio da analizzare sia redatto secondo i principi contabili, rispettando i principi di prudenza e di competenza economica.

Gli indici non sono significativi nel loro valore assoluto, ma piuttosto nelle indicazioni che provengono dal loro andamento nel tempo, proprio per questo motivo difficilmente vengono effettuate analisi sui singoli bilanci ma si preferisce considerare una serie storica di almeno tre anni.

Per consentire un'analisi comparata nel tempo e nello spazio, si è calcolata, per ognuno dei gestori, una serie di indici sia per l'anno 2023 che per i tre esercizi precedenti.

Ogni società ha come fine il conseguimento di un soddisfacente risultato economico nel tempo; pertanto, il primo indice da calcolare è quello connesso alla redditività del capitale proprio (return on equity = ROE) dato dal rapporto tra risultato d'esercizio e patrimonio netto. Tale indice esprime la capacità della gestione di remunerare il capitale di rischio, investito nell'azienda dai soci.

Un altro indice interessante da valutare è il tasso di redditività del capitale investito (return on investment = ROI) dato dal rapporto tra il risultato operativo della gestione caratteristica e il capitale investito.

Riguardo ai due indici appena descritti alcuni ritengono che per enti che non hanno fini di redditività e che finanziano i propri investimenti in minima parte con patrimonio proprio e in massima parte con contributi pubblici (soprattutto in passato) e con indebitamento, indici quali Roe e Roi non siano molto significativi. Si è deciso di includere comunque nell'analisi economica tali indici per continuità rispetto agli anni precedenti, convinti inoltre della loro utilità.

La redditività lorda delle vendite (return on sales = ROS) si ottiene dal rapporto tra il risultato operativo e i ricavi di vendita.

L'indice di indebitamento, detto anche leverage (effetto leva), è dato dal rapporto tra il totale fonti e il capitale proprio. Nel caso (non verosimile) in cui la società finanzi tutti i suoi impieghi con il capitale proprio l'indice è pari a 1; quando la società ricorre anche all'indebitamento, il rapporto è superiore a 1.

L'A.S.P. S.p.A. è una società multiservizi che adotta una contabilità unica; pertanto, non risulta possibile estrapolare dallo stato patrimoniale dati finanziari e patrimoniali quali il patrimonio netto e il capitale investito, relativi al servizio idrico integrato. A tal proposito non sono stati calcolati l'indice di redditività del capitale proprio e l'indice di redditività del capitale investito; ragionamento diverso si è seguito per il leverage che, pur calcolato rapportando dati dell'azienda nel suo complesso, rimane comunque significativo.

2.3.2 ROE 2023: (Risultato d'esercizio / Patrimonio netto)*100




Grafico 28: ROE gestori Ato5 anno 2023

Il ROE (return on equity) esprime la redditività del capitale di rischio, investito dai soci nell'azienda.

Per tenere conto del rischio d'impresa si richiede una redditività superiore a quella garantita da rendite finanziarie certe.

Maggiore è l'indice, migliore risulta la redditività dell'azienda; bisogna però considerare il divisore: aziende sottocapitalizzate presentano elevatissimi ROE, anche se nella realtà la redditività del capitale non è elevata. I gestori dell'EGAto5 non sono aziende caratterizzate da bassa patrimonializzazione, pertanto l'indice è significativo.

Il patrimonio netto varia da un esercizio a quello successivo per l'incremento subito in seguito all'accantonamento a riserva del risultato d'esercizio, pertanto le variazioni del ROE dipendono in larga misura dall'ammontare del risultato d'esercizio: maggiore è l'utile conseguito, maggiore risulterà l'aumento dell'indice rispetto all'anno precedente.

I tre gestori considerati registrano un ROE positivo, in quanto nel 2023 le gestioni chiudono i bilanci in utile. L'indice testimonia una buona redditività delle società; l'indice più elevato è quello del CCAM, mentre Acquedotto Valtiglione e soprattutto Acquedotto della Piana registrano indici più contenuti.

.....

2.3.3 ROI 2023: (Risultato operativo / Capitale investito)*100

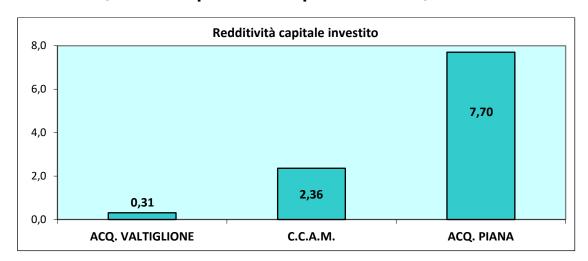


Grafico 29: ROI gestori Ato5 anno 2023

L'indice esprime la redditività del capitale investito; esso non è influenzato dal grado di indebitamento in quanto sul calcolo del ROI (return on investment) non incide la gestione finanziaria.

Per poter dare un giudizio sulla congruità dell'indice è necessario confrontarlo con il costo medio del denaro: è opportuno indebitarsi per effettuare investimenti nell'azienda se il ROI ottenuto è superiore al tasso da pagare a titolo di interesse.

Per questo secondo indice la situazione migliore è quella rappresentata dall'Acquedotto della Piana che registra un ROI di 7,70, in relazione al buon risultato registrato a livello operativo.

L'Acquedotto Valtiglione presenta un indice discreto (0,31); il CCAM fa registrare un ROI pari a 2,36, in lieve aumento rispetto all'anno precedente, per il maggior reddito operativo registrato nel 2023 rispetto al 2022.

2.3.4 ROS 2023: (Risultato operativo / Ricavi di vendita)*100

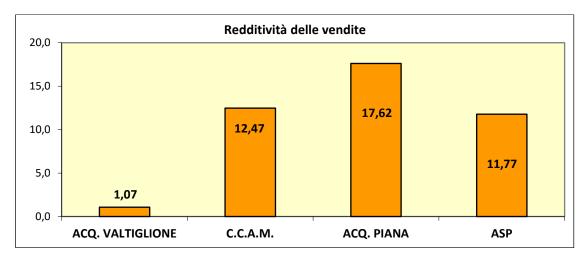


Grafico 30: ROS gestori Ato5 anno 2023

Il ROS (return on sales) indica la redditività operativa (derivante cioè dalla gestione caratteristica della società) delle vendite. Più l'indice è elevato e cresce nel tempo, più la redditività è positiva e le prospettive favorevoli.

Tra i quattro Gestori spicca l'indice di Acquedotto della Piana grazie al buon risultato operativo registrato nell'esercizio 2023.

L'Acquedotto Valtiglione, l'Asti Servizi Pubblici e il Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato presentano un indice positivo anche se meno elevato.

2.3.5 INDICE DI INDEBITAMENTO 2023: Totale fonti / Capitale proprio

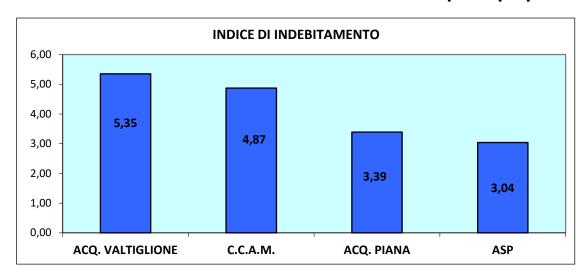


Grafico 31: Indice di indebitamento gestori Ato5 anno 2023

.....

L'indice di indebitamento esprime l'incidenza dei mezzi di terzi rispetto ai mezzi propri (se il quoziente è pari a 3 significa che la società è finanziata per il 66% con capitale di terzi e per il 33% con capitale proprio).

Il rapporto accettabile è identificato in un valore pari a 3, anche se le banche, per la concessione di finanziamenti, oltre ad altri elementi, in periodi normali accettano un livello di capitale proprio pari fino al 20% del totale impieghi.

Tutti i gestori registrano un indice elevato; occorre valutare che per i gestori è necessario indebitarsi anche oltre la soglia di guardia per poter effettuare gli investimenti tanto necessari in un settore caratterizzato da elevata vetustà delle infrastrutture e, soprattutto negli ultimi anni, da scarsa affluenza di contributi pubblici.

2.3.6 Andamento indici economici periodo 2020 - 2023

Gli indici non sono significativi tanto nel loro valore assoluto, quanto nelle indicazioni che provengono dal loro andamento nel tempo; per questo motivo difficilmente vengono effettuate analisi sui singoli bilanci ma si preferisce osservare una serie storica di almeno tre anni. A tal proposito nelle tabelle e nei grafici seguenti viene considerato l'andamento di Roe, Roi, Ros e Indice di indebitamento gestore per gestore nell'arco temporale 2020-2023.

| INDICI | ACQUEDOTTO VALTIGLIONE | | | |
|---------------|------------------------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ROI | 0,95 | 0,83 | 0,48 | 0,31 |
| ROE | 1,27 | 1,04 | 1,34 | 1,61 |
| ROS | 3,12 | 2,91 | 1,61 | 1,07 |
| Indice di | | | | |
| indebitamento | | | | |
| (leverage) | 4,89 | 4,99 | 5,08 | 5,35 |

Tabella 10: Indici Acquedotto Valtiglione S.p.A. anni 2020-2023

| INDICI | ССАМ | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 4 == | 2.22 | 2.22 | 0.06 |
| ROI | 1,75 | 2,00 | 2,08 | 2,36 |
| | | | | |
| ROE | 2,57 | 4,21 | 4,97 | 6,04 |
| ROS | 9,51 | 11,12 | 10,97 | 12,47 |
| Indice di | 3/3 1 | , | 10/37 | 12,17 |
| indebitamento | | | | |
| (leverage) | 5,41 | 5,46 | 5,23 | 4,87 |

Tabella 11: Indici Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato anni 2020-2023

| INDICI | AC | ACQUEDOTTO DELLA PIANA | | | | |
|--------------------------|-------|------------------------|------|-------|--|--|
| | 2020 | 2020 2021 2022 2023 | | | | |
| ROI | 4,48 | 5,65 | 3,39 | 7,70 | | |
| ROE | 4,36 | 7,25 | 2,73 | 0,15 | | |
| ROS | 10,30 | 12,49 | 8,16 | 17,62 | | |
| Indice di | | | | | | |
| indebitamento (leverage) | 3,68 | 3,39 | 3,50 | 3,39 | | |

Tabella 12: Indici Acquedotto della Piana S.p.A. anni 2020-2023

| INDICI | A.S.P solo ASTI - | | | |
|-------------------------|---------------------|------|-------|-------|
| | 2020 2021 2022 2023 | | | |
| ROS | 2,85 | 1,06 | 68,92 | 11,77 |
| Indice di indebitamento | | | | |
| (leverage) | 4,33 | 4,30 | 3,40 | 3,04 |

Tabella 13: Indici Asti Servizi Pubblici S.p.A. anni 2020-2023

2.3.6.1 Andamento del ROI (reddito operativo/totale impieghi)*100

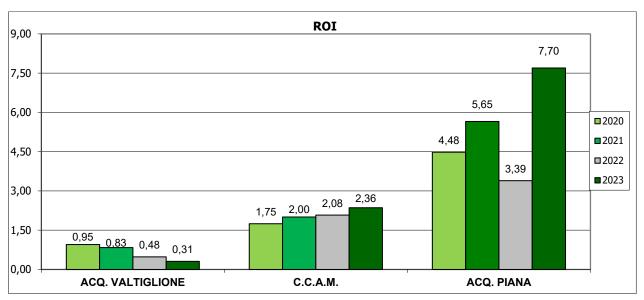


Grafico 32: Andamento ROI gestori Ato5 anni 2020-2023

L'Acquedotto Valtiglione per gli anni considerati presenta un ROI positivo, grazie al risultato operativo positivo ma in costante diminuzione, come in diminuzione risulta l'andamento dell'indice nel quadriennio; nel 2021 gli impieghi aumentano rispetto al 2020 per effetto delle maggiori immobilizzazioni in parte calmierate da minori crediti, infine nel 2022 gli impieghi aumentano di oltre 1.260.000 Euro rispetto all'anno precedente sempre in relazione all'incremento dell'attivo immobilizzato e dei crediti, mentre diminuiscono le disponibilità liquide. Nel 2023 gli impieghi aumentano di circa 2.000.000 Euro rispetto al 2022 per effetto dell'aumento dell'attivo immobilizzato, accompagnato da una diminuzione non rilevante dei crediti verso clienti e delle disponibilità liquide. Il reddito operativo ammonta a circa 280.000 Euro nel 2020, 253.000 Euro nel 2021, a 152.000 nel 2022 e a Euro 106.000 nel 2023.

Nel quadriennio considerato il ROI del Consorzio Monferrato risulta in costante crescita. Il totale impieghi aumenta nel 2021 di circa 6.000.000 di Euro rispetto al 2020 in relazione a maggiori saldi riscontrati nelle immobilizzazioni, nei crediti e soprattutto nei depositi bancari e risulta pressoché invariato nel 2022 rispetto all'anno precedente (aumentano attivo immobilizzato e crediti ma diminuiscono le disponibilità liquide); infine nel 2023 gli impieghi diminuiscono di circa 150.000 Euro in relazione all'incremento delle immobilizzazioni e alla contrazione dei crediti e delle disponibilità liquide. Il reddito operativo risulta in continuo aumento nel quadriennio considerato.

Per Acquedotto della Piana nel 2021 l'indice si incrementa rispetto al 2020 grazie all'aumento registrato a livello di reddito operativo, mentre il totale degli impieghi diminuisce anche se in misura non rilevante; nel 2022 si registra una diminuzione

del valore del ROI in quanto il reddito operativo scende rispetto all'anno precedente, inoltre, il totale impeghi aumenta (il totale immobilizzato diminuisce ma aumentano più che proporzionalmente sia i crediti sia le disponibilità liquide). Nel 2023 il ROI è pari a 7,70, il maggiore dei quattro anni, per effetto del maggior risultato operativo, accompagnato da una flessione non elevata degli impieghi (risultato della diminuzione dei crediti e delle disponibilità liquide calmierata dall'incremento dell'attivo immobilizzato).

ROE 8,00 7,25 6,04 6,00 4,97 4,21 4,36 **2020** 4,00 **2021 2**022 2.73 2.57 **2023** 1,61 2,00 1.27 1,34 1,04 0,15 0,00 ACQ. VALTIGLIONE C.C.A.M.

2.3.6.2 Andamento del ROE (risultato d'esercizio/patrimonio netto)*100

Grafico 33: Andamento ROE gestori Ato5 anni 2020-2023

Il patrimonio netto, denominatore dell'indice, è composto dalle voci:

- Capitale sociale,
- Riserva legale,
- Riserva statutaria.
- Altre riserve,
- Utili/Perdite portate a nuovo,
- Utile/Perdita d'esercizio.

Per i gestori le variazioni di patrimonio netto sono dovute al risultato d'esercizio imputato a patrimonio, pertanto, negli anni considerati non ci sono stati rilevanti variazioni nella voce a denominatore del ROE; nell'analizzare l'indice occorre concentrare l'attenzione sul risultato d'esercizio.

Negli anni considerati l'Acquedotto Valtiglione presenta un ROE sempre positivo in quanto la gestione d'esercizio registra un utile d'esercizio. Nel 2021 l'indice

diminuisce in quanto il gestore registra un utile in flessione rispetto all'esercizio precedente, mentre nei due anni successivi aumenta in quanto, per entrambe gli esercizi, l'utile d'esercizio è superiore all'utile dell'anno precedente.

Anche per il Consorzio Monferrato l'andamento dell'indice rispecchia quello degli utili d'esercizio dei quattro anni considerati: nel 2021 aumenta in modo rilevante rispetto al 2020 per poi continuare a incrementarsi sia nel 2022 sia nel 2023.

Per l'Acquedotto della Piana l'indice più elevato si riscontra nel 2021, in relazione all'utile d'esercizio maggiore rispetto ai risultati degli altri anni considerati, mentre nel 2023 il ROE diminuisce in modo considerevole come anche l'utile d'esercizio; anche per questo gestore l'indice riflette l'andamento dell'utile d'esercizio.

ROS 68,92 70,00 60,00 **2020** 50,00 **2021 2022** 40,00 **2023** 30,00 17,62 20,00 10,30__ 11.77 8,16 10,00 3,12 2,91 1,61 1,07 ^{2,85}_1,06 0,00 ACQ. VALTIGLIONE C.C.A.M. ACQ. PIANA A.S.P.

2.3.6.3. Andamento del ROS (reddito operativo/ricavi)*100

Grafico 34: Andamento ROS gestori Ato5 anni 2020-2023

In merito al denominatore dell'indice, è stata considerata la voce A1 del bilancio "Ricavi delle vendite e delle prestazioni", al netto del Foni.

Negli anni considerati l'Acquedotto Valtiglione registra un indice positivo grazie al risultato registrato a livello di gestione tipica. Nel quadriennio 2020-2023 l'indice è in costante diminuzione: nel 2020 e nel 2021 l'indice è in flessione rispetto all'anno precedente in relazione alla diminuzione congiunta di numeratore e denominatore, nel 2022 e nel 2023 la diminuzione del ROS è dovuta alla flessione del reddito operativo accompagnata dall'aumento dei ricavi delle vendite.

In tutti gli anni considerati il Consorzio Monferrato presenta un ROS superiore a 9. Nel 2021 l'indice aumenta rispetto al 2020 e si attesta a 11,12 in relazione all'aumento più che proporzionale del reddito operativo rispetto all'aumento registrato alla voce ricavi delle vendite; nel 2022 l'indice diminuisce rispetto al 2021 in relazione all'incremento più che proporzionale dei ricavi rispetto al reddito operativo. Nel 2023 il ROS aumenta per effetto dell'incremento del reddito operativo accompagnato da una lieve diminuzione dei ricavi.

Anche l'Acquedotto della Piana in tutti gli anni considerati registra un ROS elevato. Nel 2021 l'indice aumenta in relazione al maggior reddito operativo; il 2022 fa registrare il valore meno elevato dei quattro anni a causa della contrazione del risultato operativo; infine, nel 2023 il ROS risulta pari a 17,62 in relazione al reddito operativo più che raddoppiato rispetto al 2022 accompagnato da un ammontare stabile dei ricavi .

Per Asti Servizi Pubblici nel 2021 il ROS diminuisce rispetto al 2020 per effetto della sensibile diminuzione del reddito operativo solo in parte attenuata dalla diminuzione dei ricavi delle vendite. Nel 2022 si rileva un sensibile aumento dell'indice riscontrabile nel valore elevato del reddito operativo per effetto dell'importo legato alle premialità della qualità tecnica. Infine, nel 2023 il ROS è pari a 11,77 per effetto della diminuzione del reddito operativo che risulta più accentuata della contrazione dei ricavi.

Andamento dell'INDICE DI INDEBITAMENTO (tot. fonti/patrimonio netto)

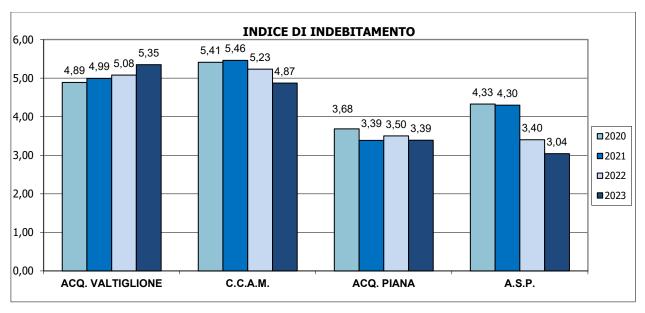


Grafico 35: Andamento LEVERAGE gestori Ato5 anni 2020-2023

Per Acquedotto Valtiglione, osservando l'andamento dell'indice, per ognuno degli anni considerati l'indice sale rispetto all'anno precedente in relazione all'incremento più che proporzionale delle fonti di finanziamento rispetto all'aumento del P.N.

Per il Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato l'indice è stabile nel biennio 2020-2021, diminuisce poi nel biennio successivo in relazione all'incremento costante del patrimonio netto accompagnato dal totale delle fonti di finanziamento che aumenta tra 2020 e 2021 per poi mantenersi stabile nel biennio successivo.

L'indice di Acquedotto della Piana nel 2021 diminuisce rispetto al 2020 a seguito dell'incremento più che proporzionale del patrimonio netto rispetto alle fonti, nel 2022 risale per effetto dell'aumento del totale fonti di finanziamento per tornare nel 2023 allo stesso livello del 2021.


Per ASP nel 2020 e nel 2021 si registrano indici pressoché uguali, mentre in ciascun anno del biennio 2022-2023 l'indice di indebitamento risulta in diminuzione rispetto all'anno precedente, in relazione all'incremento del patrimonio netto accompagnato da un aumento del totale fonti tra 2021 e 2022 e una diminuzione della voce nel passaggio tra 2022 e 2023.

.....

2.4 CONFRONTO DI ALCUNI INDICATORI RIFERITI ALL'ESERCIZIO 2023

2.4.1 Indicatori di produttività del lavoro

Valore della produzione* / numero di addetti



^{*} al netto degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni


Grafico 36: Valore produzione per addetto gestori EGAto5 anno 2023

L'indice individua la parte del valore della produzione che si può attribuire ad ogni lavoratore. Maggiore è il valore della produzione, maggiore è l'indice; al contrario maggiore è il numero di addetti, minore è l'indice.

Anche per il 2023, come già per gli anni precedenti, spicca il valore dell'Acquedotto della Piana, segue Acquedotto Valtiglione, mentre CCAM e ASP mostrano valori inferiori.

È bene considerare che i gestori Acquedotto della Piana e Acquedotto Valtiglione esternalizzano alcune attività, conseguentemente necessitano di un numero inferiore di addetti rispetto al CCAM che utilizza il proprio personale e rispetto ad ASP i cui addetti svolgono la propria attività anche in territori gestiti da altri soggetti.

Costi della produzione* / numero di addetti



^{*} al netto degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Grafico 37: Costo produzione per addetto gestori EGAto5 anno 2023

L'indice individua la parte del costo della produzione da attribuire a ogni lavoratore. Maggiori sono i costi della produzione, maggiore è l'indice; per contro maggiore è il numero di addetti, minore è l'indice.

Il valore elevato in capo ad Acquedotto della Piana e ad Acquedotto Valtiglione è legato a minor personale e a un elevato ammontare dei costi della produzione, in particolare i costi per servizi, in quanto alcune attività vengono esternalizzate.

Costo del lavoro / numero di addetti




Grafico 38: Costo medio del lavoro gestori EGAto5 anno 2023

La voce Costo del lavoro comprende l'intero ammontare della voce B.9 "Costi per il personale" del bilancio dei gestori al quale è stato sommato il costo di eventuali lavoratori interinali se non già ricompreso nella voce B.9.

Per ASP si è considerato il costo totale del personale impiegato nel settore idrico, pari a Euro 3.849.222, comprensivo della quota di costo degli addetti operativi su più business unit (quota costi indiretti).

Occorre precisare che il costo del lavoro relativo alla posizione dirigenziale e ai quadri incide maggiormente sul costo medio in strutture di dimensioni limitate, con pochi addetti, rispetto a organizzazioni con un numero di dipendenti più elevato.

Nel grafico seguente vengono esposti i dati relativi all'indice per l'anno 2023 confrontati con quelli calcolati nei tre anni precedenti.

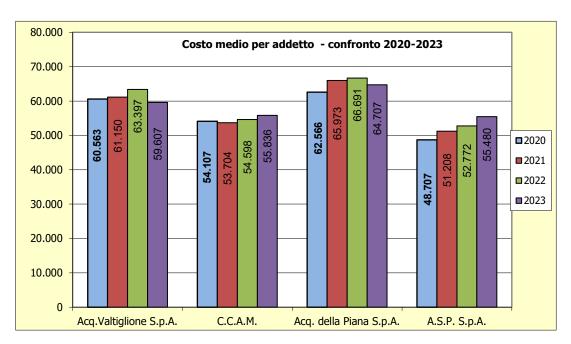


Grafico 39: Costo medio del lavoro gestori EGAto5 anni 2020-2023

Nel passaggio tra 2022 e 2023 il costo complessivo del lavoro ha subito un incremento di 42.963 Euro per Acquedotto Valtiglione e di 222.292 Euro per CCAM, mentre è diminuito di 21.130 Euro per Acquedotto della Piana e di 26.335 Euro per ASP (idrico complessivo comprensivo di addetti indiretti).

Confrontando la forza lavoro dei gestori nel 2022 e nel 2023, il numero medio di addetti è rimasto stabile per l'Acquedotto della Piana, è aumentato di 1,10 unità per l'Acquedotto Valtiglione, è aumentato di 1,66 unità per il Consorzio Monferrato, è diminuito di 4,06 unità per Asti Servizi Pubblici.

Il numero medio di addetti per Gestore per l'anno 2023 risulta il sequente:


- Acquedotto Valtiglione S.p.A.: 33,061;
- Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato: 106,083;
- Acquedotto della Piana S.p.A.: 10,65;
- Asti Servizi Pubblici: 69,38.

Il rapporto tra costo del lavoro e numero di addetti è aumentato per CCAM e ASP, è invece diminuito per Acquedotto Valtiglione e Acquedotto della Piana.

2.4.2 Indicatori di economicità

Negli indicatori seguenti, l'ammontare di valore della produzione e costo della produzione sono relativi al bilancio 2023; per i km di rete acquedottistica sono stati indicati i valori forniti per l'anno 2023 nel file di Arera RDT2024 Raccolta Dati Tariffari, foglio Dati_tecnici per l'anno 2023 (in cui è richiesto al gestore di indicare i Km di rete acquedottistica compresivi di allacci).

Valore della produzione* / km. di rete acquedottistica



^{*} al netto degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Grafico 40: Valore produzione per km rete acquedottistica gestori EGAto5 anno 2023

Maggiore è l'indice, migliore è l'andamento. Molto dipende dalla dispersione sul territorio delle utenze servite; spicca il dato di ASP, per il quale sono stati considerati unicamente i valori relativi al Comune di Asti. Al contrario il Consorzio Monferrato, l'Acquedotto Valtiglione e l'Acquedotto della Piana, che hanno una elevata dispersione sul territorio delle utenze servite, presentano indici inferiori.

Costo della produzione* / km. di rete acquedottistica



^{*} al netto degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Grafico 41: Costo produzione per km rete acquedottistica gestori EGAto5 anno 2023

A differenza dell'indice precedente, minore è l'indice migliore è l'andamento. L'indice è strettamente collegato al grado di dispersione delle unità abitative servite: maggiore è la dispersione maggiore sono i chilometri di rete acquedottistica che influiscono positivamente sull'indice.

• Costo del lavoro / km. di rete acquedottistica




Grafico 42: Costo del lavoro per km rete acquedottistica gestori EGAto5 anno 2023


L'indice stabilisce il grado di efficienza rispetto al costo dei dipendenti: anche su questo indicatore incide la natura dell'area in cui si trova ad operare il gestore.

Occorre precisare che ASP, gestore che presenta l'indice più elevato, gestisce il servizio servendosi quasi esclusivamente di propri addetti e che dal costo del lavoro complessivo sono stati detratti i costi per personale direttamente imputati al servizio reso ad Acquedotto Valtiglione e Acquedotto della Piana.

Per il dato dell'Acquedotto della Piana, il più basso dei quattro, occorre tenere presente che questo gestore fa ricorso ai servizi di ASP, per far fronte alle proprie

necessità di fornitura del servizio, presenta quindi un costo del lavoro inferiore; ragionamento analogo vale per l'Acquedotto Valtiglione.


Valore della produzione* / abitanti serviti



^{*} al netto degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Grafico 43: Valore produzione per abitanti serviti gestori EGAto5 anno 2023

Costi della produzione* / abitanti serviti



^{*} al netto degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Grafico 44: Costo produzione per abitanti serviti gestori EGAto5 anno 2023

• Costo del lavoro / abitanti serviti

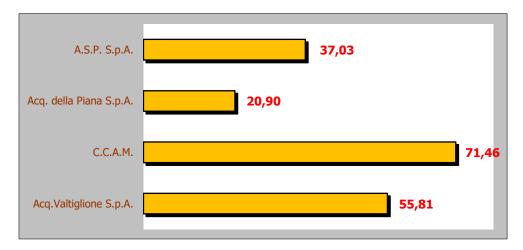


Grafico 45: Costo del lavoro per abitanti serviti gestori EGAto5 anno 2023

I tre indicatori precedenti rapportano il valore della produzione, il costo della produzione (entrambe al netto degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni) e il costo del personale con il numero di abitanti serviti.

Per i dati relativi agli abitanti si è considerato il numero di abitanti serviti relativi al servizio acquedotto indicati dai gestori nel foglio Dati tecnici nel file RDT2024 Raccolta dati tariffari per l'anno 2023.

L'acquedotto Valtiglione, con 35.310 abitanti serviti, mostra il più elevato costo della produzione pro capite e il più elevato ricavo della produzione pro capite; il costo del lavoro per ogni abitante servito, pari a 55,81 Euro, si pone oltre la media tra i gestori (pari a 50,34 Euro).

Il Consorzio Monferrato ha un bacino di utenza di 82.888 abitanti, presenta il terzo più elevato valore della produzione pro capite e il terzo costo più elevato della produzione per abitante servito a livello d'Ambito; il costo del lavoro pro capite, pari a 71,46 Euro, risulta il più elevato dell'Ambito.

L'Acquedotto della Piana, con 32.970 abitanti serviti, fa rilevare un valore della produzione per cittadino pari a 195,03 Euro, il più basso riscontrato, il costo della produzione pro capite inferiore, in linea con il valore di ASP, tra i gestori e un costo medio del lavoro per abitante di 20,90 Euro, nettamente inferiore rispetto ai valori degli altri gestori; occorre tenere presente che l'Acquedotto della Piana esternalizza alcune attività.

L'ASP serve 73.057 cittadini, presenta il terzo valore della produzione più elevato, un costo medio della produzione contenuto e un costo medio del lavoro per abitante di 37,03 Euro; è necessario considerare che il gestore gestisce il servizio servendosi quasi esclusivamente di propri addetti e presta servizio anche all'esterno. Si precisa che dal costo del lavoro complessivo sono stati detratti i costi per personale direttamente imputati al servizio reso ad Acquedotto Valtiglione e Acquedotto della Piana.

.....

3. Investimenti programmati e realizzati

3.1. Introduzione

Di seguito viene analizzata per i Gestori dell'Egato5 la situazione in riferimento al Programma degli Interventi (PdI) 2024-2029 ed al Piano delle Opere Strategiche (POS) con gli obiettivi di pianificazione necessari all'implementazione delle infrastrutture esistenti per il miglioramento del servizio offerto all'utenza in rispondenza agli strumenti di programmazione sovraordinata.

Si richiama quanto previsto da ARERA nella Deliberazione 28 Dicembre 2023 639/2023/R/IDR "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo Regolatorio (Mti-4).

I Gestori nella compilazione del PdI e POS hanno mantenuto l'impostazione di programmazione seguita da questi Uffici negli anni precedenti che si sintetizza nel seguente modo:

- Interventi Generali contraddistinti dalla Lettera G nel campo "ID intervento pianificato", investimenti legati all'attività ordinaria dei Gestori come manutenzioni straordinarie, estensioni nuove reti, sostituzione impiantistiche, automezzi, ecc... che si ripetono nel corso degli anni;
- Interventi Puntuali, investimenti contraddistinti dalla Lettera N nel campo "ID intervento pianificato", che sono relativi a progetti specifici di maggiore entità, che hanno una durata definita la cui Progettazione Definitiva viene approvata generalmente dagli uffici l'EGAto5.

3.2. Gestore ASP

3.2.1 ANALISI DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PDI PROPOSTO DAL GESTORE IN RELAZIONE ALLE CRITICITÀ

Si raggruppano di seguito gli interventi secondo la criticità indicata dal Gestore. Si riporta anche gli importi di spesa suddivisi per anno (gli anni 2021 e 2022 sono indicati a consuntivo, il 2023 a pre consuntivo, mentre gli anni successivi sono a preventivo) ed i relativi totali.

Viene anche riportata la percentuale del totale degli interventi raggruppati per criticità con la somma totale della spesa (a consuntivo o preventivo) suddivisa per anno

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|---|
| APP1.1 | APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti di approvvigionamento | M0, M2 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio Pdl- legenda | | | | | | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|--|--|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---|
| N89/2020 | Sostituzione e realizzazione pozzo in Cantarana - Intervento 2 | APP1.1 | | | 747 | 6.000 | 5.000 | 537.000 | | | |
| N88/2020 | Sostituzione e realizzazione pozzo in Cantarana - Intervento 1 | APP1.1 | 8.019 | 8.452 | 311.500 | | | | | | |
| | TOTALE | | 8.019 | 8.452 | 312.246 | 6.000 | 5.000 | 537.000 | 0 | 0 | 0 |
| % di S | % di SPESA rispetto al TOTALE | | 0,50% | 0,25% | 11,63% | 0,12% | 0,11% | 12,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| APP2.3 | APP2.3 Insufficiente capacità idraulica e/o scarsa flessibilità di esercizio delle infrastrutture di adduzione | M0, M2 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio Pdl- legenda | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | | | | | |
|---------------------------------|---|--|---|-------|-------|---|--------|---------|---------|--------|-----------|
| N76/2020 | Realizzazione condotta di adduzione da Bonoma a località Audenino | APP2.3 | | | 4.062 | 5.000 | 20.000 | 103.500 | 525.000 | 30.000 | 1.500.000 |
| TOTALE | | | 0 | 0 | 4.062 | 5.000 | 20.000 | 103.500 | 525.000 | 30.000 | 1.500.000 |
| % di S | SPESA rispetto al TOTALE | | 0,00% | 0,00% | 0,15% | 0,10% | 0,45% | 2,35% | 11,47% | 0,64% | 31,68% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| APP3.1 | APP3.1 Ricorrenza di interruzioni dovute a fenomeni naturali o antropici | M2, M3 |

| ID intervento pianificato | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | | | | | |
|---------------------------------|--|--------|---|-------|---------|---------|--|--|
| N80/2020 | Sostituzione sollevamento acque grezze potabilizzatore di Cantarana | APP3.1 | | 181 | | 120.000 | | |
| N85/2020 | Sostituzione stazione disidratazione fanghi potabilizzatore di Cantarana | APP3.1 | | 1.211 | 110.000 | | | |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--|---|-------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | TOTALE | | 0 | 1.392 | 0 | 110.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | | 0,00% | 0,04% | 0,00% | 2,27% | 2,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

ASP – Interventi Depurazione

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| DEP2.1 | DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, dei sistemi di monitoraggio, dei trattamenti di rimozione | M6, Altro |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio Pdl- legenda | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|--|---------|---------|--------|---|--------|---|--------|--------|---|
| G13 | Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione | DEP2.1 | 111.071 | 177.036 | 57.210 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| G14 | Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di Depurazione | DEP2.1 | 325 | 135 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE | | 111.396 | 177.172 | 57.210 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | | 7,00% | 5,30% | 2,13% | 6,19% | 1,13% | 1,14% | 1,09% | 1,07% | 1,06% |

ASP – Interventi Depurazione

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| DEP2.3 | DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di trattamento | M6 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio Pdl- legenda | | | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|--|--|-------|-------|-------|-------|---------|---|--------|-------|---|
| N100/2024 | Nuova piattaforma di scarico Bottini presso il Depuratore Comunale | DEP2.3 | | | | | 100.000 | | | | |
| N101/2024 | Efficentamento dell'impianto Percolato presso il Depuratore Comunale | DEP2.3 | | | | | 50.000 | 20.000 | 30.000 | | |
| | TOTALE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| % di S | % di SPESA rispetto al TOTALE | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,40% | 0,45% | 0,66% | 0,00% | 0,00% |

ASP – Interventi Depurazione

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| DEP3.3 | DEP3.3 Impatto negativo sul recapito finale | M6, Altro |

| ID intervento pianificato | _ | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------|---|-----|---|-------|--------|---|---|---|---|
| N47/2015 | Potenziamento impianto di depurazione che recapita sul Rio Valleandona. | DEP3.3 | 311 | 331 | | 5.000 | 40.000 | | | | |
| | TOTALE | | 311 | 331 | 0 | 5.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ID intervento pianificato | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| % di S | SPESA rispetto al TOTALE | 0,02% | 0,01% | 0,00% | 0,10% | 0,91% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| | DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche) | M1, M2, M3 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio Pdl- legenda | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N52/2016 | Razionalizzazione della rete acquedottistica di Asti | DIS1.2 | 170.345 | | | | | | | | |
| N91/2022 | Interventi di ampliamento- manutenzione straordinaria Reti acquedottistiche frazionali di Asti | DIS1.2 | | | 1.129 | 5.000 | 9.000 | 20.000 | 895.000 | 539.000 | |
| G03 | Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica | DIS1.2 | 228.753 | 289.113 | 313.608 | 250.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| G04 | Manutenzione Straordinaria Serbatoi | DIS1.2 | 58.710 | 24.490 | 13.404 | 40.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| G05 | Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento | DIS1.2 | 56.504 | 70.912 | 55.137 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| G06 | Manutenzione Straordinaria Altri Impianti | DIS1.2 | 85.697 | 67.640 | 49.584 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| G07 | Manutenzione Straordinaria Prese | DIS1.2 | | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| N77/2020 | Sostituzione condotte della rete alta - 1° LOTTO | DIS1.2 | | 117 | 904 | | 50.000 | 450.000 | | | |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio Pdl- legenda | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N81/2020 | Razionalizzazione e potenziamento della rete acquedottistica in frazione Rilate | DIS1.2 | 26.936 | 110.481 | 55.002 | 107.581 | | | | | |
| N84/2020 | Sostituzione allacciamenti in piombo | DIS1.2 | | 25.610 | 4.062 | | | | | | |
| N86/2020 | Attività di monitoraggio e controllo | DIS1.2 | | 217 | | | | | | | |
| | TOTALE | | 626.945 | 588.579 | 492.830 | 492.581 | 244.000 | 655.000 | 1.080.000 | 724.000 | 185.000 |
| % di S | SPESA rispetto al TOTALE | | 39,40% | 17,61% | 18,36% | 10,17% | 5,52% | 14,87% | 23,59% | 15,45% | 3,91% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| DIS1.3 | DIS1.3 Capacità idraulica delle infrastrutture non rispondente ai livelli di domanda | M0, M2 |

| ID intervento pianificato | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| G01 | Estensione nuove reti | DIS1.3 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di S | SPESA rispetto al TOTALE | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| DIS1.4 | DIS1.4 Inadeguate capacità di compenso e di riserva dei serbatoi | M0, M2 |

| ID intervento pianificato | | Criticità ex foglio Pdl- legenda | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|---------|---|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| N58/2017 | Realizzazione nuovo serbatoio Villaggio Aurora | DIS1.4 | 23.068 | 262.291 | 864.422 | 455.724 | | | | | |
| | TOTALE | | 23.068 | 262.291 | 864.422 | 455.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di S | SPESA rispetto al TOTALE | | 1,45% | 7,85% | 32,20% | 9,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| DIS3.2 | DIS3.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori di utenza | Prerequisito 1, M1, MC2 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio Pdl- legenda | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|--|---|---|---|---------|---|---------|---------|---|---|
| G02 | Sostituzione contatori | DIS3.2 | 107.384 | 132.964 | 111.757 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| G08 | Manutenzione Straordinaria Telecontrollo | DIS3.2 | 91.020 | 68.202 | 75.728 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | TOTALE | | 198.403 | 201.166 | 187.486 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| % di S | SPESA rispetto al TOTALE | | 12,47% | 6,02% | 6,98% | 2,48% | 3,40% | 3,41% | 3,28% | 3,20% | 3,17% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| | EFF1.1 Margini di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di acquedotto (approvvigionamento, potabilizzazione, distribuzione) | Altro |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio Pdl- legenda | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|--|---|---|-------|--------|---|---|---|---|---|
| G15 | Manutenzione Straordinaria Immobili | EFF1.1 | 4.370 | 2.380 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N93/2022 | Ristrutturazione palazzina ex custode di Cantarana e "Museo dell'acqua" | EFF1.1 | | | | 10.000 | 5.000 | 30.000 | 60.000 | | |
| N94/2022 | Realizzazione di pannelli fotovoltaici campo pozzi di Cantarana | EFF1.1 | | | | 20.000 | 480.000 | | | | |
| | TOTALE | | 4.370 | 2.380 | 0 | 30.000 | 485.000 | 30.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | | 0,27% | 0,07% | 0,00% | 0,62% | 10,98% | 0,68% | 1,31% | 0,00% | 0,00% |

ASP – Interventi Depurazione

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| EFF1.3 | EFF1.3 Margini di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di depurazione. | Altro |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------|---|--------|-----|--------|--------|---------|--|--|
| N72/2019 | Realizzazione nuovo sgrigliatore canale idrovore | EFF1.3 | 8.886 | 12.027 | 542 | 10.000 | 50.000 | 450.000 | | |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---|--------|-------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|
| | TOTALE | 8.886 | 12.027 | 542 | 10.000 | 50.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | 0,56% | 0,36% | 0,02% | 0,21% | 1,13% | 10,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

ASP – Interventi vari

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|-------------|---|
| | | M0, M1, M2, M3, M4a, M4b, M4c, M5, M6, Altro |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio Pdl- legenda | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G16 | Acquisto automezzi | EFF2.1 | 53.611 | 3.000 | 185.500 | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| G17 | Manutenzione Straordinaria automezzi | EFF2.1 | 2.378 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G18 | Software | EFF2.1 | 155.344 | 89.237 | 151.464 | 325.260 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| G19 | Hardware | EFF2.1 | 3.450 | 220 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G20 | Attrezzatura Varia Minuta | EFF2.1 | 11.956 | 63.835 | 15.165 | 25.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | TOTALE | | 226.739 | 156.292 | 352.128 | 350.260 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| % di S | PESA rispetto al TOTALE | | 14,25% | 4,68% | 13,12% | 7,23% | 4,80% | 4,81% | 4,63% | 4,52% | 4,48% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| EFF4.1 | EFF4.1 Elevati consumi di energia elettrica in acquedotto | Altro |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio Pdl- legenda | | | | | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | |
|---------------------------------|---|--|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---|--------|
| N98/2024 | Ottimizzazione ed efficientamento del sistema di approvvigionamento della Rete Alta | EFF4.1 | | | | | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 800.000 | 93.000 |
| | TOTALE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 800.000 | 93.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,23% | 0,05% | 0,04% | 17,07% | 1,96% |

ASP – Interventi Depurazione

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| EFF4.5 | EFF4.5 Assenza del recupero di energia dalla digestione anaerobica dei fanghi di depurazione o altro | M5 (indicatore correlato G5.4) |

| ID intervento pianificato | | Criticità ex foglio Pdl- legenda | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | | | |
|---------------------------------|---|--|---|-------|-------|-------|--------|---|---------|---------|---------|
| N99/2024 | Efficentamento energetico, ambientale e di processo del Depuratore Comunale | EFF4.5 | | | | | 50.000 | 100.000 | 350.000 | 500.000 | 500.000 |
| | TOTALE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 350.000 | 500.000 | 500.000 |
| % di S | % di SPESA rispetto al TOTALE | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,13% | 2,27% | 7,64% | 10,67% | 10,56% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| FOG1.1 | FOG1.1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui in agglomerati di dimensione superiore ai 2.000 A.E. | Prerequisito 3 |

| ID intervento pianificato | | Criticità ex foglio Pdl- legenda | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| G09 | Estensioni nuove reti | FOG1.1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| FOG1.2 | FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui in agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 A.E. | M5 (attraverso G5.2), M6, Altro |

| ID intervento pianificato | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------|---|-----|-----|--|-------|---------|-----------|-----------|
| N49/2016 | Estensione della rete fognaria di Asti - 3° lotto (loc. Casabianca Sessant) | FOG1.2 | 297 | 289 | 100 | | 5.000 | 100.000 | 1.750.000 | 1.645.000 |
| N66/2018 | Estensione della rete fognaria di Asti - 1° lotto (Variglie) | FOG1.2 | 136.785 | | | | | | | |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio Pdl- legenda | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|--|--|---|-------|---|--------|---|-----------|---|---|---|
| N95/2022 | Estensione della rete fognaria di Asti - 4° lotto (loc. Valterza) | FOG1.2 | | | | 5.000 | | | | 20.000 | 380.000 |
| N96/2024 | Estensione della rete fognaria di Asti - 2° lotto (loc. Castiglione) | FOG1.2 | | | | 5.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 495.000 | | |
| | TOTALE | | 137.082 | 289 | 100 | 10.000 | 1.000.000 | 2.005.000 | 595.000 | 1.770.000 | 2.025.000 |
| % di S | PESA rispetto al TOTALE | | 8,62% | 0,01% | 0,00% | 0,21% | 22,64% | 45,52% | 12,99% | 37,77% | 42,77% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| | FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie, delle opere civili, delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti | M4a, M4b |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio Pdl- legenda | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|--|--|---|---|---|---------|---|--------|---|---|---|
| G10 | Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria | FOG2.1 | 131.464 | 64.739 | 245.694 | 150.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| G11 | Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di sollevamento ecc) | FOG2.1 | 651 | 26.263 | 2.320 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N69/2019 | Razionalizzazione fognatura Asti Est | FOG2.1 | 6.657 | 322.957 | 89.150 | 250.000 | 100.000 | | | | |
| N97/2024 | Razionalizzazione Fognatura Asti Est (Lotto II) | FOG2.1 | | | | | 20.000 | 50.000 | 1.500.000 | 430.000 | |
| | TOTALE | | 138.772 | 413.958 | 337.164 | 400.000 | 140.000 | 70.000 | 1.520.000 | 450.000 | 20.000 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| % di S | SPESA rispetto al TOTALE | 8,72% | 12,38% | 12,56% | 8,26% | 3,17% | 1,59% | 33,20% | 9,60% | 0,42% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| FOG2.2 | FOG2.2 Elevate infiltrazioni di acque parassite | M4a, M4b, M6, Altro |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio Pdl- legenda | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | | | | | |
|---------------------------------|--|--|-------|-------|-------|---|---------|-------|-------|-------|-------|
| N92/2022 | Interventi di ampliamento- manutenzione straordinaria fognatura nel concentrico di Asti(Crosio - Buozzi) | FOG2.2 | | | | 29.500 | 270.500 | | | | |
| | TOTALE | | 0 | 0 | 0 | 29.500 | 270.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di S | SPESA rispetto al TOTALE | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,61% | 6,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| FOG2.4 | FOG2.4 Scaricatori di piena non adeguati | M4b, M4c |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio Pdl- legenda | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|--|--|--------|-----------|--------|---|-----------|-------|-------|-------|---|
| N75/2020 | Razionalizzazione collettori fognari e realizzazione idrovore - Depuratore di Asti (ex N35/2013 e N51/2016) | FOG2.4 | 41.304 | 1.501.079 | 69.688 | 2.500.000 | 1.410.000 | | | | |
| | TOTALE | | 41.304 | 1.501.079 | 69.688 | 2.500.000 | 1.410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | | 2,60% | 44,90% | 2,60% | 51,61% | 31,93% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| FOG3.1 | FOG3.1 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori (dei parametri di quantità e di qualità) | M4a, M4b, M6 |

| ID intervento pianificato | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| G12 | Manutenzione Straordinaria Telecontrollo | FOG3.1 | 5.319 | 7.438 | 1.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE | | 5.319 | 7.438 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | | 0,33% | 0,22% | 0,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

ASP – Interventi vari acquedotto

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| KNW1.1 | KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di acquedotto | Prerequisito 4, M1, M2, M3 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio Pdl- legenda | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N82/2020 | Modellazione idraulica della rete acquedottistica | KNW1.1 | 3.560 | 7.256 | 3.024 | 20.000 | | | | | |
| N71/2019 | Acquisto software per la gestione degli indicatori M1 – M2 – M3 – M4 – M5 – M6 Deliberazione ARERA 917/2017 | KNW1.1 | | | | | | | | | |
| N83/2020 | Piani di sicurezza delle acque | KNW1.1 | 10.229 | 1.882 | 2.299 | | 10.000 | 20.000 | 5.000 | | |
| | TOTALE | | 13.789 | 9.138 | 5.323 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| % di S | SPESA rispetto al TOTALE | | 0,87% | 0,27% | 0,20% | 0,41% | 0,23% | 0,45% | 0,11% | 0,00% | 0,00% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| KNW1.2 | KNW1.2 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di fognatura | Prerequisito 4, M4a, M4b, M4c |

| | | | Valore |
|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ID | | Criticità ex | investimento |
| intervento | Titolo Intervento pianificato | foglio Pdl- | annuo (lordo |
| pianificato | | legenda | contributi) |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |

| ID intervento pianificato | | Criticità ex foglio Pdl- legenda | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | | | |
|---------------------------------|--|--|---|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|
| N63/2020 | Analisi e modellazione idraulica della rete acquedottistica e fognaria - LOTTO 2 | KNW1.2 | 46.641 | 1.084 | | | | | | | |
| | TOTALE | | 46.641 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di S | SPESA rispetto al TOTALE | | 2,93% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

3.2.2 ASP - TOTALE INTERVENTI DEL PDI RAGGRUPPATI PER CRITICITÀ CON RELATIVE PERCENTUALI DI SPESA

| ID Criticità | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti di approvvigionamento | 8.019 | 8.452 | 312.246 | 6.000 | 5.000 | 537.000 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,50% | 0,25% | 11,63% | 0,12% | 0,11% | 12,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| APP2.3 Insufficiente capacità idraulica e/o scarsa flessibilità di esercizio delle infrastrutture di adduzione | 0 | 0 | 4.062 | 5.000 | 20.000 | 103.500 | 525.000 | 30.000 | 1.500.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,00% | 0,00% | 0,15% | 0,10% | 0,45% | 2,35% | 11,47% | 0,64% | 31,68% |
| APP3.1 Ricorrenza di interruzioni dovute a fenomeni naturali o antropici | 0 | 1.392 | 0 | 110.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,00% | 0,04% | 0,00% | 2,27% | 2,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, dei sistemi di monitoraggio, dei trattamenti di rimozione | 111.396 | 177.172 | 57.210 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 7,00% | 5,30% | 2,13% | 6,19% | 1,13% | 1,14% | 1,09% | 1,07% | 1,06% |
| DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di trattamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,40% | 0,45% | 0,66% | 0,00% | 0,00% |
| DEP3.3 Impatto negativo sul recapito finale | 311 | 331 | 0 | 5.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,02% | 0,01% | 0,00% | 0,10% | 0,91% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche) | 626.945 | 588.579 | 492.830 | 492.581 | 244.000 | 655.000 | 1.080.000 | 724.000 | 185.000 |

| ID Criticità | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 39,40% | 17,61% | 18,36% | 10,17% | 5,52% | 14,87% | 23,59% | 15,45% | 3,91% |
| DIS1.3 Capacità idraulica delle infrastrutture non rispondente ai livelli di domanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| DIS1.4 Inadeguate capacità di compenso e di riserva dei serbatoi | 23.068 | 262.291 | 864.422 | 455.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 1,45% | 7,85% | 32,20% | 9,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| DIS3.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori di utenza | 198.403 | 201.166 | 187.486 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 12,47% | 6,02% | 6,98% | 2,48% | 3,40% | 3,41% | 3,28% | 3,20% | 3,17% |
| EFF1.1 Margini di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di acquedotto (approvvigionamento, potabilizzazione, distribuzione) | 4.370 | 2.380 | 0 | 30.000 | 485.000 | 30.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,27% | 0,07% | 0,00% | 0,62% | 10,98% | 0,68% | 1,31% | 0,00% | 0,00% |
| EFF1.3 Margini di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di depurazione. | 8.886 | 12.027 | 542 | 10.000 | 50.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,56% | 0,36% | 0,02% | 0,21% | 1,13% | 10,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EFF2.1 Necessità di sviluppo di una pianificazione degli interventi di manutenzione e di sostituzione periodica degli asset | 226.739 | 156.292 | 352.128 | 350.260 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |

| ID Criticità | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 14,25% | 4,68% | 13,12% | 7,23% | 4,80% | 4,81% | 4,63% | 4,52% | 4,48% |
| EFF4.1 Elevati consumi di energia elettrica in acquedotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 800.000 | 93.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,23% | 0,05% | 0,04% | 17,07% | 1,96% |
| EFF4.5 Assenza del recupero di energia dalla digestione anaerobica dei fanghi di depurazione o altro | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 350.000 | 500.000 | 500.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,13% | 2,27% | 7,64% | 10,67% | 10,56% |
| FOG1.1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui in agglomerati di dimensione superiore ai 2.000 A.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui in agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 A.E. | 137.082 | 289 | 100 | 10.000 | 1.000.000 | 2.005.000 | 595.000 | 1.770.000 | 2.025.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 8,62% | 0,01% | 0,00% | 0,21% | 22,64% | 45,52% | 12,99% | 37,77% | 42,77% |
| FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie, delle opere civili, delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti | 138.772 | 413.958 | 337.164 | 400.000 | 140.000 | 70.000 | 1.520.000 | 450.000 | 20.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 8,72% | 12,38% | 12,56% | 8,26% | 3,17% | 1,59% | 33,20% | 9,60% | 0,42% |
| FOG2.2 Elevate infiltrazioni di acque parassite | 0 | 0 | 0 | 29.500 | 270.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,61% | 6,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| ID Criticità | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOG2.4 Scaricatori di piena non adeguati | 41.304 | 1.501.079 | 69.688 | 2.500.000 | 1.410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 2,60% | 44,90% | 2,60% | 51,61% | 31,93% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FOG3.1 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori (dei parametri di quantità e di qualità) | 5.319 | 7.438 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,33% | 0,22% | 0,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di acquedotto | 13.789 | 9.138 | 5.323 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,87% | 0,27% | 0,20% | 0,41% | 0,23% | 0,45% | 0,11% | 0,00% | 0,00% |
| KNW1.2 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di fognatura | 46.641 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 2,93% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 1.591.044 | 3.343.066 | 2.684.301 | 4.844.065 | 4.416.500 | 4.404.500 | 4.579.000 | 4.686.000 | 4.735.000 |

3.2.3 ASP - Analisi delle spese (consuntivo e preventivo) previste nel pdi anni 2021-2029

Relativamente al PdI in esame, al fine di mettere in evidenza le aree oggetto di maggiori investimenti nel periodo 2021 – 2029 vengono di seguito riportati gli interventi raggruppati per criticità con la percentuale media (anni 2021-2029) delle spese (gli anni 2021 e 2022 sono indicati a consuntivo, il 2023 a pre consuntivo, mentre gli anni successivi sono a preventivo) elencati in base alla % di spesa.

| ID Criticità | % spesa distinta per criticità 2021 - 2029 |
|---|---|
| FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui in agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 A.E. | 18,95% |
| DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche) | 16,54% |
| FOG2.4 Scaricatori di piena non adeguati | 14,85% |
| FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie, delle opere civili, delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti | 9,99% |
| EFF2.1 Necessità di sviluppo di una pianificazione degli interventi di manutenzione e di sostituzione periodica degli asset | 6,95% |
| DIS1.4 Inadeguate capacità di compenso e di riserva dei serbatoi | 5,66% |
| APP2.3 Insufficiente capacità idraulica e/o scarsa flessibilità di esercizio delle infrastrutture di adduzione | 5,20% |
| DIS3.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori di utenza | 4,93% |
| EFF4.5 Assenza del recupero di energia dalla digestione anaerobica dei fanghi di depurazione o altro | 3,59% |
| DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, dei sistemi di monitoraggio, dei trattamenti di rimozione | 2,90% |
| APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti di approvvigionamento | 2,76% |
| EFF4.1 Elevati consumi di energia elettrica in acquedotto | 2,15% |

| ID Criticità | % spesa distinta per criticità 2021 - 2029 |
|---|---|
| EFF1.1 Margini di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di acquedotto (approvvigionamento, potabilizzazione, distribuzione) | 1,55% |
| EFF1.3 Margini di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di depurazione. | 1,39% |
| FOG2.2 Elevate infiltrazioni di acque parassite | 0,75% |
| APP3.1 Ricorrenza di interruzioni dovute a fenomeni naturali o antropici | 0,56% |
| DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di trattamento | 0,50% |
| KNW1.2 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di fognatura | 0,33% |
| KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di acquedotto | 0,28% |
| DEP3.3 Impatto negativo sul recapito finale | 0,12% |
| FOG3.1 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori (dei parametri di quantità e di qualità) | 0,07% |
| DIS1.3 Capacità idraulica delle infrastrutture non rispondente ai livelli di domanda | 0,00% |
| FOG1.1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui in agglomerati di dimensione superiore ai 2.000 A.E. | 0,00% |

3.2.4 ASP - RIEPILOGO PDI ANNI 2021 - 2029


Si riportano di seguito i dati in € relativi al riepilogo PdI con i dati 2021-2029

| Riepilogo investimenti realizzati | UdM | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|-----------|-----------|-----------|
| Valore investimento annuo (lordo contributi) | euro | 1.591.044 | 3.343.066 | 2.684.301 |
| Entrate in esercizio al lordo contributi - da foglio "Pdl-cronoprogramma_investimenti" | euro | 3.182.625 | 1.460.260 | 1.607.686 |
| Contributi - da foglio "Pdl-cronoprogramma_investimenti" | euro | 1.931.404 | 1.765.429 | 1.775.636 |
| LIC dell'anno | euro | 137.319 | 1.905.886 | 1.093.159 |

Si riportano di seguito i dati in € relativi alle previsioni di spese per gli anni 2024 - 2029

| Riepilogo investimenti previsti | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Valore investimento annuo (lordo contributi)- da foglio "Pdl-cronoprogramma_investimenti" | euro | 4.844.065 | 4.416.500 | 4.404.500 | 4.579.000 | 4.686.000 | 4.735.000 |
| Entrata in esercizio al lordo dei contributi | euro | 3.507.502 | 7.697.000 | 2.217.000 | 4.387.000 | 4.087.000 | 4.117.000 |
| Contributi - da foglio "Pdl- cronoprogramma_investimenti" | euro | 290.000 | 70.000 | 385.967 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Valore investimento annuo (netto contributi) | euro | 4.554.065 | 4.346.500 | 4.018.533 | 4.509.000 | 4.616.000 | 4.665.000 |

Si riporta di seguito il Grafico che evidenzia gli interventi realizzati dagli anni 2012 al 2023 e gli interventi previsti nei prossimi anni (2024-2029).

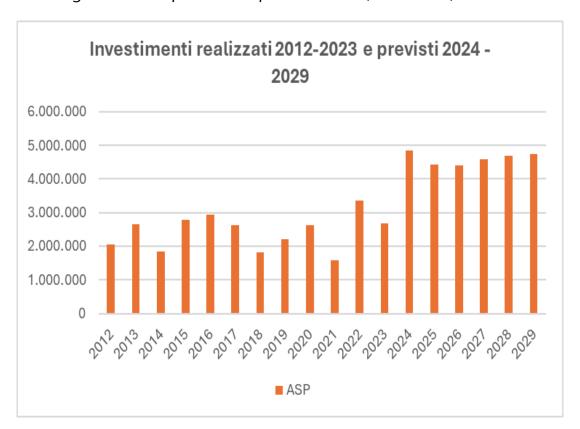

3.2.5 ASP - PIANO OPERE STRATEGICHE

Il Gestore ha proposto il Piano delle Opere Strategiche (POS) per lo sviluppo delle infrastrutture idriche in cui sono specificate le criticità riscontrate e gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione delle opere strategiche, con riferimento al periodo 2030-2035.

Gli interventi infrastrutturali indicati nel POS riguardano nuove opere la cui realizzazione richiede strutturalmente tempistiche pluriennali anche in ragione della relativa complessità tecnica, è considerata prioritaria ai fini del raggiungimento dei livelli di servizio fissati per il pertinente territorio.

In relazione alla scadenza degli affidamenti, attualmente prevista per l'anno 2030, questi Uffici riportano di seguito gli interventi previsti nel POS solo relativi all'anno 2030.

Nel file RDT vengono mantenuti i dati completi del POS come atto di indirizzo fermo restando che, il Gestore che avrà l'affidamento successivamente all'anno 2030 aggiornerà anche gli interventi previsti nel POS e i valori economici relativi.

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2030 |
|---------------------------|---|---|
| N49/2016 | Estensione della rete fognaria di Asti - 3° lotto (loc. Casabianca Sessant) | |
| N52/2016 | Razionalizzazione della rete acquedottistica di Asti | |
| N58/2017 | Realizzazione nuovo serbatoio Villaggio Aurora | |
| N66/2018 | Estensione della rete fognaria di Asti - 1° lotto (Variglie) | |
| N69/2019 | Razionalizzazione fognatura Asti Est | |
| N72/2019 | Realizzazione nuovo sgrigliatore canale idrovore | |
| N75/2020 | Razionalizzazione collettori fognari e realizzazione idrovore - Depuratore di Asti (ex N35/2013 e N51/2016) | |
| N76/2020 | Realizzazione condotta di adduzione da Bonoma a località Audenino | 3.245.000 |
| N77/2020 | Sostituzione condotte della rete alta - 1° LOTTO | |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2030 |
|------------------------------|--|---|
| N81/2020 | Razionalizzazione e potenziamento della rete acquedottistica in frazione Rilate | |
| N88/2020 | Sostituzione e realizzazione pozzo in Cantarana - Intervento 1 | |
| N89/2020 | Sostituzione e realizzazione pozzo in Cantarana - Intervento 2 | |
| N91/2022 | Interventi di ampliamento-manutenzione straordinaria Reti acquedottistiche frazionali di Asti | |
| N92/2022 | Interventi di ampliamento-manutenzione straordinaria fognatura nel concentrico di Asti(Crosio - Buozzi) | 500.000 |
| N94/2022 | Realizzazione di pannelli fotovoltaici campo pozzi di Cantarana | |
| N95/2022 | Estensione della rete fognaria di Asti - 4° lotto (loc. Valterza) | |
| N96/2024 | Estensione della rete fognaria di Asti - 2° lotto (loc. Castiglione) | |
| N97/2024 | Razionalizzazione Fognatura Asti Est (Lotto II) Ottimizzazione ed efficientamento del sistema di approvvigionamento della Rete | |
| N98/2024 | Alta | 93.000 |
| N99/2024 | Efficentamento energetico, ambientale e di processo del Depuratore Comunale | 500.000 |

3.3. Gestore Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

3.3.1 ANALISI DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PDI PROPOSTO DAL GESTORE IN RELAZIONE ALLE CRITICITÀ

Si raggruppano di seguito gli interventi secondo la criticità indicata dal Gestore. Si riporta anche gli importi di spesa suddivisi per anno (gli anni 2021 e 2022 sono indicati a consuntivo, il 2023 a pre consuntivo, mentre gli anni successivi sono a preventivo) ed i relativi totali.

Viene anche riportata la percentuale del totale degli interventi raggruppati per criticità con la somma totale della spesa (a consuntivo o preventivo) suddivisa per anno

CCAM - Interventi Acquedotto

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| APP1.1 | APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti di approvvigionamento | M0, M2 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | | | |
|---------------------------------|---|--------------|---|--------|-------|--------|--------|---|---------|---------|--|
| N152/2018 | Lavori per la perforazione di un nuovo pozzo di seconda falda (POZZO N. 9.2) presso il Campo Pozzi di C.na Giarrea in Comune di Saluggia (VC) compreso manufatto avanpozzo | APP1.1 | | | 2.735 | 10.000 | 20.000 | 200.000 | 370.000 | 400.000 | |
| N163/2020 | Lavori per la costruzione manufatto avanpozzo Campo Pozzi Cascina Giarrea in Comune di Saluggia (VC) – POZZO 1.2 | APP1.1 | 76.588 | 19.141 | 1.495 | | | | | | |
| N171/2020 | Raddoppio collettore in Loc. C.na Giarrea (Comune di Saluggia) Campo Pozzi | APP1.1 | | | | | | | | | |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------|---------|---|-------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|
| N13/2010 | Raddoppio potenziamento vecchio anello tratto Vignali (Brozolo)–Piovà Massaia | APP1.1 | 65.181 | 2.477 | | | | | | | |
| | TOTALE | | 141.769 | 21.618 | 4.230 | 10.000 | 20.000 | 200.000 | 370.000 | 400.000 | 0 |
| % di | SPESA rispetto al TOTALE | | 2,94% | 0,42% | 0,08% | 0,19% | 0,39% | 3,82% | 7,13% | 8,16% | 0,00% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| APP2.2 | APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di adduzione | M1, M2 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | |
|---------------------------------|--|--------------|--|--|--|---|--|
| N15/2010 | A) Sostituzione condotta di adduzione e distribuzione dal Comune di Vignale al Comune di Conzano E B)Realizzazione condotta di adduzione e rete di distribuzione all'interno dei Comuni di Lu e San Salvatore Mon.to - rifacimento fognatura in Comune di Camagna (AL) | APP2.2 | | | | | |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | |
|---------------------------------|---|--------------|---|--------|---|--------|---------|---------|---------|---|---------|
| N16/2010 | 1)Sostituzione condotta di adduzione dal Comune di Grana al Comune di Quattordio con sostituzione di tratti di distribuzione nei Comuni di Grana, Montemagno, Viarigi e Quattordio. | APP2.2 | | 0 | | | | | | | |
| N17/2010 | 1) Sostituzione condotta adduzione da tetti Coppa a Cavagnolo-Brusasco; sostituzione della condotta di distribuzione da fraz.Cortiglione-Comune di Robella a Fraz. Piai-Comune di Brozolo. E 2) Ramo secondario anello primario Borgatello al Comune di Gabiano (Varengo) e due tratti in Comune di Camino; | APP2.2 | | | | | | | | | |
| N110/2014 | Sostituzione tratto vecchio anello acciaio DN 500 da serbatoio di Monte Croce (Comune di Villamiroglio) alla Loc. La Cascinetta (Comune di Cerrina) - 1° LOTTO da serbatoio Monte Croce a Borgatello | APP2.2 | | | | | | | 50.000 | 300.000 | 500.000 |
| N112/2014 | Sostituzione adduzione da Penango a Vignale - 1° Lotto – nuova adduzione Grazzano Badoglio | APP2.2 | 0 | 4.249 | 13.215 | 50.000 | 150.000 | 500.000 | 420.000 | 300.000 | |
| N123/2016 | Sostituzione rete adduzione dal serbatoio di Fubine a Quargnento (AL) | APP2.2 | | 0 | | | | | | | |
| N125/2016 | Sostituzione valvola regolatrice ingresso serbatoio Centrale Verrua Savoia (TO) | APP2.2 | 4.451 | 11.000 | | | | | | | |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|--------------|---|---------|---|---------|---------|---------|---------|---|---|
| N130/2016 | Sostituzione tratto vecchio anello acciaio DN 500 da serbatoio di Monte Croce (Comune di Villamiroglio) alla Loc. La Cascinetta (Comune di Cerrina) - 2° LOTTO: Stazione di rilancio Borgatello - Loc. Cascinetta - compresa camera Blengi | APP2.2 | 47.293 | 156.747 | 86.192 | 10.000 | 30.000 | 250.000 | 500.000 | 500.000 | 800.000 |
| N158/2019 | Lavori per la sostituzione di tratto dell'anello principale - variante di tracciato in Comune di Murisengo (AL) | APP2.2 | 4.843 | 554 | 14.475 | 300.000 | 550.000 | | | | |
| N165/2020 | Sostituzione tratto vecchio ramo di distribuzione per Asti - 2° Lotto - da C.na Pellerina (Comune di Chiusano - AT) a loc. Meridiana (Comune di Settime - AT) | APP2.2 | | | | | | | 20.000 | 400.000 | 300.000 |
| N170/2020 | Sostituzione adduzione ramo Pontestura da serbatoio Montecroce (Comune di Villamiroglio - AL) a Loc. Due Punte (Comune di Ozzano M.to - AL) - 1° lotto - tratto da stacco in derivazione al serbatoio del Comune di Pontestura (AL) a Loc. Due Punte (Comune di Ozzano M.to - AL) | APP2.2 | | | | | | | | | |
| N18/2010 | Sostituzione e potenziamento adduzione al serbatoio di Cocconato (AT) | APP2.2 | 747 | 0 | 1.323 | 20.000 | 100.000 | 407.000 | 250.000 | | |
| N19/2010 | 1)Realizzazione condotta di adduzione dal Comune di Murisengo al Comune di Penango 2) Sostituzione | APP2.2 | 11.736 | 0 | | | | | | | |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|--|--------------|---|---------|---------|---|---------|---|---|
| | condotta di adduzione dal Comune di Cossombrato al Comune di Frinco | | | | | | | | |
| N62/2010 | Sostituzione con potenziamento della condotta di adduzione al serbatoio del Comune di Frassinello (AL) | APP2.2 | 34.761 | 267.753 | 5.417 | 25.000 | | | |
| N102/2013 | Sostituzione con potenziamento "Ramo Asti" da Località San Candido (Comune di Murisengo) a Località Ponte Rosso (Comune di Piea) | APP2.2 | 17.098 | 15.032 | 574.479 | 1.300.000 | 528.000 | | |
| N111/2014 | Distribuzione dal serbatoio di San Desiderio (Calliano) a Grana | APP2.2 | | 15.171 | | | | | |
| N127/2016 | Adduzione serbatoio di Piea e adduzione serbatoio Passerano | APP2.2 | | 3.110 | | | | | |
| N156/2018 | Lavori per la sostituzione della rete idrica di adduzione al serbatoio di LU (AL) - 1° lotto Comune di Vignale M.to (AL) | APP2.2 | 158.043 | -1.541 | 3.272 | | | | |
| N157/2019 | Lavori per la sostituzione della rete idrica di adduzione al | APP2.2 | 38.117 | -499 | 3.377 | | | | |
| N164/2020 | Sostituzione tratto vecchio ramo di distribuzione per Asti - 1° Lotto - da Bric Sabbione (Comune di Cortanze - AT) a C.na Margherita (Comune di Camerano Casasco - AT) | APP2.2 | | | | | | | 100.000 |
| N166/2020 | Sostituzione tratto vecchio ramo di distribuzione per Asti - 3° Lotto - da loc. Meridiana | APP2.2 | | | | | | | |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|--------------|-----|--------|---|---------|---------|--------|---------|---|---|
| | (Comune di Settime - AT) a stacco per serbatoio di Sessant (Comune di Asti) | | | | | | | | | | |
| N167/2020 | Sostituzione tratto vecchio ramo di distribuzione per Asti - 4° Lotto - da stacco per serbatoio di Sessant (Comune di Asti) a incrocio tra SP 458 e viadotto autostradale | APP2.2 | | | | | | | | | |
| N168/2020 | Sostituzione adduzione da bivio Penango a Vignale - 2° Lotto – tratto da Bivio Comune di Penango (AT) a C.ne Roberto (Comune di Grazzano Badoglio - AT) | APP2.2 | | | | | | | | | 100.000 |
| N169/2020 | Sostituzione adduzione da Penango a Vignale - 3° Lotto – tratto da bivio C.ne Napoli in Comune di Grazzano Badoglio (AT) a Località Tronco in Comune di Vignale (AL) | APP2.2 | | | | | | | | | |
| N172/2020 | Sostituzione ultimo tratto rete adduzione arrivo al serbatoio Tetti Coppa in Comune di Brusasco (TO) e rifacimento gruppo idraulico nell'avancamera al serbatoio di Tetti Coppa | APP2.2 | | 400 | 10.066 | | | 20.000 | 300.000 | 370.000 | |
| N177/2022 | Lavori di consolidamento statico del serbatoio idrico in Comune di Lauriano (TO) Località Mezzana e rifacimento del gruppo idraulico | APP2.2 | 337 | 102 | 1.821 | 20.000 | 110.000 | | | | |
| N178/2022 | Lavori per la sostituzione rete idrica di distribuzione in Comune di Piovà Massaia (AT) | APP2.2 | | 24.152 | 113.654 | 120.000 | | | | | |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | - Frazione San Pietro | | | | | | | | | |
| | TOTALE | 317.426 | 496.230 | 827.291 | 1.845.000 | 1.468.000 | 1.177.000 | 1.540.000 | 1.870.000 | 1.800.000 |
| % di \$ | SPESA rispetto al TOTALE | 6,59% | 9,73% | 15,36% | 35,81% | 28,87% | 22,46% | 29,68% | 38,15% | 37,45% |

CCAM - Interventi Depurazione

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| DEP2.1 | DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, dei sistemi di monitoraggio, dei trattamenti di rimozione | M6, Altro |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------|---------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| G13 a) | Manutenz.Straordinaria Imp. Depurazione - primaria- secondaria_terziaria | DEP2.1 | 256.561 | 156.125 | 82.719 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| G13 b) | Manutenz.Straordinaria Imp. Depurazione -impianti sollevamento | DEP2.1 | 27.116 | 6.062 | 20.537 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| G13 c) | Manutenz.Straordinaria Imp. Depurazione - gruppi di misura | DEP2.1 | 732 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | | | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | |
|---------------------------------|---|--------------|---------|---|---------|--------|--------|--------|--------|---|--------|
| G13 d) | Manutenz.Straordinaria Imp. Depurazione - fitodepurazione | DEP2.1 | 2.291 | 4.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G14 | Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di Depurazione | DEP2.1 | 45.776 | 54.181 | 31.342 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | TOTALE | | 332.476 | 220.661 | 134.598 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| % di \$ | SPESA rispetto al TOTALE | | 6,90% | 4,33% | 2,50% | 1,46% | 1,47% | 1,43% | 1,45% | 1,53% | 1,56% |

CCAM - Interventi Depurazione

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| DEP3.1 | DEP3.1 Inadeguato recupero di materia e/o di energia dei fanghi residui di depurazione | M5 |

| ID intervento pianificato | | ID Criticità | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | | | | |
|---------------------------------|---|--------------|--|---|--|--------|---------|---------|
| N188/2024 | Interventi finalizzati all'ottimizzazione dei costi di smaltimento dei residui solidi e liquidi del sistema depurativo gestito dal Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato | DEP3.1 | | 8.112 | | 10.000 | 100.000 | 140.000 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|--------|---------|---------|
| TOTALE | | | 0 | 0 | 8.112 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 100.000 | 140.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | 0,00% | 0,00% | 0,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 2,04% | 2,91% | |

CCAM - Interventi Depurazione

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| DEP3.3 | DEP3.3 Impatto negativo sul recapito finale | M6, Altro |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | | |
|---------------------------------|--|--------------|---|-------|---------|---------|---------|---|--|--|
| N78/2010 | APQ Stato-Regione per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche. Riprogrammazione delle economie - progetto n. 10 – adeguamento sistema di depurazione in Valle Versa nei Comuni di Montiglio d'asti e Cocconato (AT)- stralcio funzionale | DEP3.3 | | 0 | | | | | | |
| N118/2015 | Potenziamento/adeguamento Impianto di Depurazione di Baldichieri (AT) | DEP3.3 | 7.348 | 3.098 | 212.195 | 600.000 | 150.000 | | | |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|--------------|---|--------|---|---------|--|-------|--------|---|
| N120/2015 | Potenziamento impianto di depurazione in Frazione Quarti del Comune di Pontestura (AL) | DEP3.3 | 5.132 | 20.979 | 314.506 | 60.000 | | | | |
| N132/2016 | Comune di Castellero (AT) - Opere igienico sanitarie: dismissione impianto di depurazione in Loc. Bricco Trombetta (realizzazione sollevamento e nuovo tratto fognario) - adeguamento impianto di depurazione in Loc. Vallotte - 1° LOTTO | DEP3.3 | 144.086 | 17.336 | | | | | | |
| N161/2019 | Lavori per la realizzazione di condotta fognaria per la dismissione di uno scarico in località S.Sebastiano del Comune di Felizzano (AL) e contestuale realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento fognario con conferimento dei reflui nel depuratore di località Strada dell'Acquarola | DEP3.3 | 0 | 2.184 | | | | | | |
| N162/2019 | Lavori di adeguamento impianto di depurazione esistente in località Str.Prov Alessandria/Moncalvo del Comune di Quargnento (AL)- Lotti 1 e 2 | DEP3.3 | 3.581 | 544 | 136.261 | 230.000 | | | | |
| N189/2024 | Lavori di adeguamento e ammodernamento impianto di depurazione in Comune di Cocconato (AT) Località Pozzo | DEP3.3 | | | | | | 5.000 | 50.000 | 145.000 |
| N190/2024 | Lavori di adeguamento impianto di depurazione gestito da C.C.A.M. nel comune di Refrancore (AT) | DEP3.3 | | | | | | 5.000 | 50.000 | 290.000 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--|---|--------|---------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|
| | TOTALE | | 160.147 | 44.141 | 662.962 | 890.000 | 150.000 | 0 | 10.000 | 100.000 | 435.000 |
| % di \$ | % di SPESA rispetto al TOTALE | | 3,33% | 0,87% | 12,31% | 17,27% | 2,95% | 0,00% | 0,19% | 2,04% | 9,05% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| DIS1.1 | DIS1.1 Assenza parziale o totale delle reti di distribuzione | M3, Altro, MC1, MC2 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--------|--------|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| G1 | Acquedotto Estensione nuove reti | DIS1.1 | 80.339 | 97.238 | 138.393 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | TOTALE | | 80.339 | 97.238 | 138.393 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | | 1,67% | 1,91% | 2,57% | 1,55% | 1,57% | 1,53% | 1,54% | 1,63% | 1,66% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| DIS1.2 | DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche) | M1, M2, M3 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|--|--------------|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|
| G3 | Acquedotto Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica | DIS1.2 | 1.373.361 | 1.387.872 | 1.485.470 | 800.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| G8 | Acquedotto Manutenzione Straordinaria Telecontrollo | DIS1.2 | 22.620 | 672 | 23.534 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| G6 | Acquedotto Manutenzione Straordinaria Altri Impianti | DIS1.2 | 0 | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| G7a) | Acquedotto Manutenzione Straordinaria Prese | DIS1.2 | 835.994 | 854.351 | 930.266 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| N135/2017 | Comune di Castell'Alfero (AT) - Lavori per la posa di rete idrica e rete fognaria nelle Vie Alfieri e Amico | DIS1.2 | 234.350 | 43.714 | 107.257 | | | | | | |
| N140/2017 | Comune di Moncalvo (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in Via Roma | DIS1.2 | | 0 | 1.029 | | 25.000 | 200.000 | 590.000 | | |
| N141/2017 | Comune di Rosignano (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in fraz. Colma - Ramo Pomaro | DIS1.2 | 5.829 | 0 | 3.793 | 25.000 | 400.000 | 400.000 | | | |
| N142/2017 | Comune di Villadeati (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in fraz. Zanco Via Roma | DIS1.2 | 51.274 | | | | | | | | |
| N143/2017 | Comune di Cuccaro (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in Via Montaldo | DIS1.2 | 34.601 | 4.605 | | | | | | | |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|--|--------------|---|---|--------|---------|---------|---|---|---|
| N146/2017 | Comune di Grazzano Badoglio (AT) - Lavori per la posa di rete idrica in Casscine Napoli | DIS1.2 | 1.043 | | | | | | | |
| N184/2024 | COMUNE DI COSSOMBRATO (AT) - Frazione dell'Olmetto - Adeguamento, riqualificazione ed efficientamento delle reti idriche comunali del consorzio caratterizzate da un elevato indice di dispersione idrica_ interventi di rifacimento delle reti idriche di distribuzione | DIS1.2 | | | 10.000 | 100.000 | 260.000 | | | |
| N185/2024 | COMUNE DI MONCESTINO (AL) -Frazione Seminenga - Adeguamento, riqualificazione ed efficientamento delle reti idriche comunali del consorzio caratterizzate da un elevato indice di dispersione idrica_ interventi di rifacimento delle reti idriche di distribuzione | DIS1.2 | | | 10.000 | 100.000 | 121.000 | | | |
| N186/2024 | Lavori di sostituzione rete idrica a seguito interventi di risanamento e ricostruzione del corpo stradale della s.p. n. 590 | DIS1.2 | | | 20.000 | 280.000 | 450.000 | | | |
| N187/2024 | Lavori di: Inserimento di nuova condotte in PEAD per potenziamento servizio idrico da realizzarsi nell'ambito dell'intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Po alla S.P. 107 Brusasco km 5+200 in comune di Verrua Savoia proposto dalla Città Metropolitana di Torino | DIS1.2 | | 2.704 | 10.000 | 150.000 | 40.000 | | | |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| G4 | Acquedotto Manutenzione Straordinaria Serbatoi | DIS1.2 | 7.454 | 26.110 | 14.510 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| G5 | Acquedotto Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento | DIS1.2 | 68.694 | 0 | 769 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | TOTALE | | 2.635.220 | 2.317.324 | 2.569.332 | 1.411.000 | 2.441.000 | 2.857.000 | 1.976.000 | 1.386.000 | 1.386.000 |
| % di \$ | SPESA rispetto al TOTALE | | 54,71% | 45,42% | 47,70% | 27,39% | 48,00% | 54,52% | 38,08% | 28,27% | 28,83% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| DIS3.2 | DIS3.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori di utenza | Prerequisito 1, M1, MC2 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| G2 | Acquedotto Sostituzione contatori | DIS3.2 | 107.455 | 93.762 | 149.779 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | TOTALE | | 107.455 | 93.762 | 149.779 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | | 2,23% | 1,84% | 2,78% | 3,88% | 3,93% | 3,82% | 4,82% | 5,10% | 5,20% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| EFF1.1 | EFF1.1 Margini di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di acquedotto (approvvigionamento, potabilizzazione, distribuzione) | Altro |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------|-------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| G20 | Attrezzatura Varia Minuta | EFF1.1 | 7.799 | 17.619 | 26.055 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | TOTALE | | 7.799 | 17.619 | 26.055 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | | 0,16% | 0,35% | 0,48% | 0,39% | 0,39% | 0,38% | 0,39% | 0,41% | 0,42% |

CCAM – Interventi vari

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|---|
| EFF2.1 | EFF2.1 Necessità di sviluppo di una pianificazione degli interventi di manutenzione e di sostituzione periodica degli asset | M0, M1, M2, M3, M4a, M4b, M4c, M5, M6, Altro |

| ID intervento pianificato | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| G16 | Acquisto automezzi | EFF2.1 | 40.490 | 21.789 | 12.965 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 50.000 | 15.000 | 15.000 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | | | |
|---------------------------------|---|--------------|--------|---|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| G17 | Manutenzione Straordinaria automezzi | EFF2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| N160/2019 | Bando 2019-2020 EGATO 5 per l'assegnazione di contributi ai gestori del SII per l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti e interventi di miglioramento dell'efficienza energetica | EFF2.1 | 1.632 | 0 | | | | | | | |
| | TOTALE | | 42.122 | 21.789 | 12.965 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 51.000 | 16.000 | 16.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | | 0,87% | 0,43% | 0,24% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,98% | 0,33% | 0,33% |

CCAM – Interventi vari

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| EFF3.1 | EFF3.1 Criticità nella sicurezza delle condizioni di lavoro | Altro |

| ID intervento pianificato | | | | | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | | | |
|---------------------------------|--|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| G15 | Manutenzione Straordinaria Immobili | EFF3.1 | 134.875 | 49.530 | 32.926 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOTALE | | | 134.875 | 49.530 | 32.926 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | 2,80% | 0,97% | 0,61% | 0,58% | 0,59% | 0,57% | 0,58% | 0,61% | 0,62% | |

CCAM – Interventi Fognatura

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| FOG1.2 | FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui in agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 A.E. | M5 (attraverso G5.2), M6, Altro |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | | | |
|---------------------------------|---|--------------|---|-------|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| G9 | Fognatura Estensioni nuove reti | FOG1.2 | 22.865 | 7.991 | 29.144 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| N109/2014 | Realizzazione trattamento scarichi non depurati in Rosignano (AL) - 2° lotto - fognatura in Fraz. Castagnoni | FOG1.2 | 122.860 | | | | | | | | |
| N128/2016 | Realizzazione rete fognaria a gravità in Comune di Fubine (AL) - Località San Rocco | FOG1.2 | 47.547 | 2.322 | | | | | | | |
| N154/2018 | Nuovo tratto di collettore fognario per convogliare uno scarico attualmente non autorizzato nella fognatura | FOG1.2 | | 110 | | | | | 60.000 | | |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|--------------|---------|--------|--------|---|--------|--------|---|---|---|
| | esistente nel Comune di Castagnole Monferrato (AT) | | | | | | | | | | |
| N159/2019 | Realizzazione nuovo tratto fognario in Comune di Cerrina (AL) frazione Pezzere | FOG1.2 | 926 | 0 | | | | | | | |
| N174/2020 | Estensioni reti fognarie nei Comuni di Cavagnolo e Brusasco (TO): in Via Roccabauda e Villaggio Maddalena (Cavagnolo) e Località Bricco (Brusasco) | FOG1.2 | | | 1.297 | | | | | | |
| | TOTALE | | 194.198 | 10.423 | 30.441 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 70.000 | 10.000 | 10.000 |
| % di : | SPESA rispetto al TOTALE | | 4,03% | 0,20% | 0,57% | 0,19% | 0,20% | 0,19% | 1,35% | 0,20% | 0,21% |

CCAM – Interventi Fognatura

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| FOG2.1 | FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie, delle opere civili, delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti | M4a, M4b |

| ID intervento pianificato | | | | | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | | | |
|---------------------------------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|
| G7b) | Fognatura Manutenzione Straordinaria Prese | FOG2.1 | 112.506 | 174.534 | 176.473 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G10 | Fognatura Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria | FOG2.1 | 377.616 | 549.065 | 517.218 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| G11 | Fognatura Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari impianti di sollevamento ecc | FOG2.1 | 12.836 | 19.606 | 3.622 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| G12 | Fognatura Manutenzione Straordinaria Telecontrollo | FOG2.1 | 11.685 | 10.944 | 18.627 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| N176/2021 | Lavori di manutenzione straordinaria condotta fognaria DN 500 sita in Comune di Portacomaro (AT) C.so Matteotti | FOG2.1 | 2.841 | 0 | | | 10.000 | 10.000 | 112.159 | | |
| | TOTALE | | 517.484 | 754.149 | 715.940 | 465.000 | 475.000 | 475.000 | 577.159 | 465.000 | 465.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | | 10,74% | 14,78% | 13,29% | 9,03% | 9,34% | 9,06% | 11,12% | 9,49% | 9,67% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| KNW1.1 | KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di acquedotto | Prerequisito 4, M1, M2, M3 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------|-------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N182/2022 | Informatizzazione reti e impianti acquedotto | KNW1.1 | | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | TOTALE | | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| % di : | SPESA rispetto al TOTALE | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,58% | 0,59% | 0,57% | 0,58% | 0,61% | 0,62% |

CCAM – Interventi vari fognatura

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| KNW1.2 | KNW1.2 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di fognatura | Prerequisito 4, M4a, M4b, M4c |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | | | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | | | |
|---------------------------------|---|--------------|-------|-------|-------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| N183/2022 | Informatizzazione reti e impianti fognatura | KNW1.2 | | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | TOTALE | | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 0,20% | 0,19% | 0,19% | 0,20% | 0,21% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| POT1.1 | POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, di monitoraggio, dei trattamenti | M3, M0, M1 (eventuale residuale) |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------|---|--------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| N175/2021 | Lavori di ristrutturazione fabbricato esistente per inserimento deposito stoccaggio ipoclorito presso centrale di sollevamento in comune di Verrua Savoia (TO) | POT1.1 | 7.176 | 15.057 | 41.871 | | | | | | |
| | TOTALE | | 7.176 | 15.057 | 41.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di : | SPESA rispetto al TOTALE | | 0,15% | 0,30% | 0,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

CCAM – Interventi vari

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| UTZ2.1 | UTZ2.1 Inadeguatezza del servizio di assistenza all'utenza (es. call center, pronto intervento, sportelli e trattamento dei reclami) | M2, M3, M4a,M4b, Altro, MC1, MC2 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|--------------|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| N181/2022 | Acquisto immobile sito in Moncalvo (AT) denominato "Palazzo Manacorda" sede Uffici | UTZ2.1 | | 735.743 | | | | | | | |
| G18 | Software | UTZ2.1 | 60.223 | 115.270 | 23.856 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| G19 | Hardware | UTZ2.1 | 77.709 | 91.330 | 7.641 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 |
| | TOTALE | | 137.932 | 942.343 | 31.497 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 90.000 | 60.000 | 60.000 |
| % di \$ | SPESA rispetto al TOTALE | | 2,86% | 18,47% | 0,58% | 1,16% | 1,18% | 1,15% | 1,73% | 1,22% | 1,25% |

3.3.2 CCAM - TOTALE INTERVENTI DEL PDI RAGGRUPPATI PER CRITICITÀ CON RELATIVE PERCENTUALI DI SPESA

| ID Criticità | Valore investimento annuo 2021 | Valore investimento annuo 2022 | Valore investimento annuo 2023 | Valore investimento annuo 2024 | Valore investimento annuo 2025 | Valore investimento annuo 2026 | Valore investimento annuo 2027 | Valore investimento annuo 2028 | Valore investimento annuo 2029 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti di approvvigionamento | 141.769 | 21.618 | 4.230 | 10.000 | 20.000 | 200.000 | 370.000 | 400.000 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 2,94% | 0,42% | 0,08% | 0,19% | 0,39% | 3,82% | 7,13% | 8,16% | 0,00% |
| APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di adduzione | 317.426 | 496.230 | 827.291 | 1.845.000 | 1.468.000 | 1.177.000 | 1.540.000 | 1.870.000 | 1.800.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 6,59% | 9,73% | 15,36% | 35,81% | 28,87% | 22,46% | 29,68% | 38,15% | 37,45% |
| DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, dei sistemi di monitoraggio, dei trattamenti di rimozione | 332.476 | 220.661 | 134.598 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 6,90% | 4,33% | 2,50% | 1,46% | 1,47% | 1,43% | 1,45% | 1,53% | 1,56% |
| DEP3.1 Inadeguato recupero di materia e/o di energia dei fanghi residui di depurazione | 0 | 0 | 8.112 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 100.000 | 140.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,00% | 0,00% | 0,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 2,04% | 2,91% |
| DEP3.3 Impatto negativo sul recapito finale | 160.147 | 44.141 | 662.962 | 890.000 | 150.000 | 0 | 10.000 | 100.000 | 435.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 3,33% | 0,87% | 12,31% | 17,27% | 2,95% | 0,00% | 0,19% | 2,04% | 9,05% |
| DIS1.1 Assenza parziale o totale delle reti di distribuzione | 80.339 | 97.238 | 138.393 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 1,67% | 1,91% | 2,57% | 1,55% | 1,57% | 1,53% | 1,54% | 1,63% | 1,66% |

| ID Criticità | Valore investimento annuo 2021 | Valore investimento annuo 2022 | Valore investimento annuo 2023 | Valore investimento annuo 2024 | Valore investimento annuo 2025 | Valore investimento annuo 2026 | Valore investimento annuo 2027 | Valore investimento annuo 2028 | Valore investimento annuo 2029 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche) | 2.635.220 | 2.317.324 | 2.569.332 | 1.411.000 | 2.441.000 | 2.857.000 | 1.976.000 | 1.386.000 | 1.386.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 54,71% | 45,42% | 47,70% | 27,39% | 48,00% | 54,52% | 38,08% | 28,27% | 28,83% |
| DIS3.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori di utenza | 107.455 | 93.762 | 149.779 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 2,23% | 1,84% | 2,78% | 3,88% | 3,93% | 3,82% | 4,82% | 5,10% | 5,20% |
| EFF1.1 Margini di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di acquedotto (approvvigionamento, potabilizzazione, distribuzione) | 7.799 | 17.619 | 26.055 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,16% | 0,35% | 0,48% | 0,39% | 0,39% | 0,38% | 0,39% | 0,41% | 0,42% |
| EFF2.1 Necessità di sviluppo di una pianificazione degli interventi di manutenzione e di sostituzione periodica degli asset | 42.122 | 21.789 | 12.965 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 51.000 | 16.000 | 16.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,87% | 0,43% | 0,24% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,98% | 0,33% | 0,33% |
| EFF3.1 Criticità nella sicurezza delle condizioni di lavoro | 134.875 | 49.530 | 32.926 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 2,80% | 0,97% | 0,61% | 0,58% | 0,59% | 0,57% | 0,58% | 0,61% | 0,62% |
| FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui in agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 A.E. | 194.198 | 10.423 | 30.441 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 70.000 | 10.000 | 10.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 4,03% | 0,20% | 0,57% | 0,19% | 0,20% | 0,19% | 1,35% | 0,20% | 0,21% |
| FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie, delle opere civili, delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti | 517.484 | 754.149 | 715.940 | 465.000 | 475.000 | 475.000 | 577.159 | 465.000 | 465.000 |

| ID Criticità | Valore investimento annuo 2021 | Valore investimento annuo 2022 | Valore investimento annuo 2023 | Valore investimento annuo 2024 | Valore investimento annuo 2025 | Valore investimento annuo 2026 | Valore investimento annuo 2027 | Valore investimento annuo 2028 | Valore investimento annuo 2029 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 10,74% | 14,78% | 13,29% | 9,03% | 9,34% | 9,06% | 11,12% | 9,49% | 9,67% |
| KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di acquedotto | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,58% | 0,59% | 0,57% | 0,58% | 0,61% | 0,62% |
| KNW1.2 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di fognatura | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 0,20% | 0,19% | 0,19% | 0,20% | 0,21% |
| POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, di monitoraggio, dei trattamenti | 7.176 | 15.057 | 41.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,15% | 0,30% | 0,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| UTZ2.1 Inadeguatezza del servizio di assistenza all'utenza (es. call center, pronto intervento, sportelli e trattamento dei reclami) | 137.932 | 942.343 | 31.497 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 90.000 | 60.000 | 60.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 2,86% | 18,47% | 0,58% | 1,16% | 1,18% | 1,15% | 1,73% | 1,22% | 1,25% |
| | 4.816.418 | 5.101.884 | 5.386.392 | 5.152.000 | 5.085.000 | 5.240.000 | 5.189.159 | 4.902.000 | 4.807.000 |

3.3.3 CCAM - Analisi delle spese (consuntivo e preventivo) previste nel pdi anni 2021-2029

Relativamente al PdI in esame, al fine di mettere in evidenza le aree oggetto di maggiori investimenti nel periodo 2021 – 2029 vengono di seguito riportati gli interventi raggruppati per criticità con la percentuale media (anni 2021-2029) delle spese (gli anni 2021 e 2022 sono indicati a consuntivo, il 2023 a pre consuntivo, mentre gli anni successivi sono a preventivo) elencati in base alla % di spesa.

| ID Criticità | % spesa distinta per criticità 2021 - 2029 |
|---|---|
| DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche) | 41,44% |
| APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di adduzione | 24,90% |
| FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie, delle opere civili, delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti | 10,73% |
| DEP3.3 Impatto negativo sul recapito finale | 5,33% |
| DIS3.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori di utenza | 3,73% |
| UTZ2.1 Inadeguatezza del servizio di assistenza all'utenza (es. call center, pronto intervento, sportelli e trattamento dei reclami) | 3,29% |
| APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti di approvvigionamento | 2,57% |
| DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, dei sistemi di monitoraggio, dei trattamenti di rimozione | 2,51% |
| DIS1.1 Assenza parziale o totale delle reti di distribuzione | 1,74% |
| EFF3.1 Criticità nella sicurezza delle condizioni di lavoro | 0,88% |
| FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui in agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 A.E. | 0,79% |
| DEP3.1 Inadeguato recupero di materia e/o di energia dei fanghi residui di depurazione | 0,59% |
| EFF2.1 Necessità di sviluppo di una pianificazione degli interventi di manutenzione e di sostituzione periodica degli asset | 0,46% |
| KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di acquedotto | 0,40% |

| ID Criticità | % spesa distinta per criticità 2021 - 2029 |
|---|---|
| EFF1.1 Margini di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di acquedotto (approvvigionamento, potabilizzazione, distribuzione) | 0,37% |
| POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, di monitoraggio, dei trattamenti | 0,14% |
| KNW1.2 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di fognatura | 0,13% |
| | 100,00% |

3.3.4 CCAM - RIEPILOGO PDI ANNI 2021 – 2029

Si riportano di seguito i dati in € relativi al riepilogo PdI con i dati 2021-2029

| Riepilogo investimenti realizzati | UdM | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|-----------|-----------|-----------|
| Valore investimento annuo (lordo contributi) | euro | 4.816.418 | 5.101.884 | 5.386.392 |
| Entrate in esercizio al lordo contributi - da foglio "Pdl-cronoprogramma_investimenti" | euro | 5.070.923 | 5.418.962 | 4.217.813 |
| Contributi - da foglio "Pdl-cronoprogramma_investimenti" | euro | 3.688.093 | 4.418.734 | 3.951.026 |
| LIC dell'anno | euro | 970.588 | 675.638 | 1.674.544 |

Si riportano di seguito i dati in € relativi alle previsioni di spese per gli anni 2024 - 2029

| Riepilogo investimenti previsti | UdM | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Valore investimento annuo (lordo contributi)- da foglio "Pdl-cronoprogramma_investimenti" | euro | 5.152.000 | 5.085.000 | 5.240.000 | 5.189.159 | 4.902.000 | 4.807.000 |
| Entrata in esercizio al lordo dei contributi | euro | 3.712.000 | 6.892.000 | 4.773.000 | 4.349.000 | 5.612.000 | 3.217.000 |
| Contributi - da foglio "Pdl- cronoprogramma_investimenti" | euro | 1.019.500 | 743.500 | 275.000 | 259.265 | 218.679 | 190.000 |
| Valore investimento annuo (netto contributi) | euro | 4.132.500 | 4.341.500 | 4.965.000 | 4.929.894 | 4.683.321 | 4.617.000 |

Si riporta di seguito il Grafico che evidenzia gli interventi realizzati dagli anni 2012 al 2023 e gli interventi previsti nei prossimi anni (2024-2029).



3.3.5 CCAM - PIANO OPERE STRATEGICHE

Il Gestore ha proposto il Piano delle Opere Strategiche (POS) per lo sviluppo delle infrastrutture idriche in cui sono specificate le criticità riscontrate e gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione delle opere strategiche, con riferimento al periodo 2030-2035.

Gli interventi infrastrutturali indicati nel POS riguardano nuove opere la cui realizzazione richiede strutturalmente tempistiche pluriennali anche in ragione della relativa complessità tecnica, è considerata prioritaria ai fini del raggiungimento dei livelli di servizio fissati per il pertinente territorio.

In relazione alla scadenza degli affidamenti, attualmente prevista per l'anno 2030, si riportano di seguito gli interventi previsti nel POS solo relativi all'anno 2030.

Nel file RDT vengono, comunque, mantenuti i dati completi del POS indicati dai Gestori, quale mero atto di indirizzo sugli interventi strategici da realizzare, fermo restando che il Gestore che opererà post 2030 potrà provvedere al motivato aggiornamento degli

interventi previsti sulla base delle indicazioni che saranno contenute nel nuovo Piano d'Ambito da definirsi nei prossimi anni.

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2030 |
|---------------------------------|--|--|
| N102/2013 | Sostituzione con potenziamento "Ramo Asti" da Località San Candido (Comune di Murisengo) a Località Ponte Rosso (Comune di Piea) | |
| N110/2014 | Sostituzione tratto vecchio anello acciaio DN 500 da serbatoio di Monte Croce (Comune di Villamiroglio) alla Loc. La Cascinetta (Comune di Cerrina) - 1° LOTTO da serbatoio Monte Croce a Borgatello | 500.000 |
| N112/2014 | Sostituzione adduzione da Penango a Vignale - 1° Lotto – nuova adduzione Grazzano Badoglio | |
| N118/2015 | Potenziamento/adeguamento Impianto di Depurazione di Baldichieri (AT) | |
| N120/2015 | Potenziamento impianto di depurazione in Frazione Quarti del Comune di Pontestura (AL) | |
| N130/2016 | Sostituzione tratto vecchio anello acciaio DN 500 da serbatoio di Monte Croce (Comune di Villamiroglio) alla Loc. La Cascinetta (Comune di Cerrina) - 2° LOTTO: Stazione di rilancio Borgatello - Loc. Cascinetta - compresa camera Blengi | 500.000 |
| N152/2018 | Lavori per la perforazione di un nuovo pozzo di seconda falda (POZZO N. 9.2) presso il Campo Pozzi di C.na Giarrea in Comune di Saluggia (VC) compreso manufatto avanpozzo | |
| N158/2019 | Lavori per la sostituzione di tratto dell'anello principale - variante di tracciato in Comune di Murisengo (AL) | |
| N164/2020 | Sostituzione tratto vecchio ramo di distribuzione per Asti - 1° Lotto - da Bric Sabbione (Comune di Cortanze - AT) a C.na Margherita (Comune di Camerano Casasco - AT) | 100.000 |
| N165/2020 | Sostituzione tratto vecchio ramo di distribuzione per Asti - 2° Lotto - da C.na Pellerina (Comune di Chiusano - AT) a loc. Meridiana (Comune di Settime - AT) | 180.000 |
| N166/2020 | Sostituzione tratto vecchio ramo di distribuzione per Asti - 3° Lotto - da loc. Meridiana (Comune di Settime - AT) a stacco per serbatoio di Sessant (Comune di Asti) | 0 |
| N167/2020 | Sostituzione tratto vecchio ramo di distribuzione per Asti - 4° Lotto - da stacco per serbatoio di Sessant (Comune di Asti) a incrocio tra SP 458 e viadotto autostradale | 0 |
| N168/2020 | Sostituzione adduzione da bivio Penango a Vignale - 2° Lotto – tratto da Bivio Comune di Penango (AT) a C.ne Roberto (Comune di Grazzano Badoglio - AT) | 100.000 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2030 | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|
| N169/2020 | Sostituzione adduzione da Penango a Vignale - 3° Lotto – tratto da bivio C.ne Napoli in Comune di Grazzano Badoglio (AT) a Località Tronco in Comune di Vignale (AL) | 100.000 | | |
| N170/2020 | Sostituzione adduzione ramo Pontestura da serbatoio Montecroce (Comune di Villamiroglio - AL) a Loc. Due Punte (Comune di Ozzano M.to - AL) - 1° lotto - tratto da stacco in derivazione al serbatoio del Comune di Pontestura (AL) a Loc. Due Punte (Comune di Ozzano M.to - AL) | 300.000 | | |
| N171/2020 | Raddoppio collettore in Loc. C.na Giarrea (Comune di Saluggia) Campo Pozzi | 100.000 | | |

3.4 Gestore Acquedotto della Piana S.p.A.

3.4.1 ANALISI DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PDI PROPOSTO DAL GESTORE IN RELAZIONE ALLE CRITICITÀ

Si raggruppano di seguito gli interventi secondo la criticità indicata dal Gestore. Si riporta anche gli importi di spesa suddivisi per anno (gli anni 2021 e 2022 sono indicati a consuntivo, il 2023 a pre consuntivo, mentre gli anni successivi sono a preventivo) ed i relativi totali.

Viene anche riportata la percentuale del totale degli interventi raggruppati per criticità con la somma totale della spesa (a consuntivo o preventivo) suddivisa per anno

| PIANA – Intervent | PIANA – Interventi Acquedotto | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito | | | | | | | | | |
| APP1.1 | APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti di approvvigionamento | M0, M2 | | | | | | | | | |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio PdI- legenda | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| N72/632/2 020 | Nuovo Campo Pozzi in Comune di Villafranca:realizzazione di perforazione e sondaggio a carotaggio continuo e posa di piezometro. | APP1.1 | 0 | 41.306 | 6.656 | | | | | | |
| N77/2022 | Nuovo campo pozzi nel Comune di Villfranca d'Asti: Realizzazione e collegamento del nuovo pozzo alla rete di distribuzione esistente tramite realizzazione condotta idrica e revamping dell'impianto di potabilizzazione. | APP1.1 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 300.000 | 26.000 | 50.000 | 300.000 | 300.000 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio PdI- legenda | | | | | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | |
|---------------------------------|-------------------------------|---|-------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|---|---------|
| | TOTALE | | 0 | 41.306 | 6.656 | 24.000 | 300.000 | 26.000 | 50.000 | 300.000 | 300.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | | 0,00% | 7,16% | 0,42% | 1,38% | 12,36% | 1,75% | 5,24% | 27,96% | 25,34% |

PIANA – Interventi Acquedotto

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| APP2.1 | APP2.1 Assenza parziale o totale delle reti di adduzione | M0, M2 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio PdI- legenda | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N68/542/5 94/2018 | Potenziamento e adeguamento infrastrutture idriche tramite collegamenti ed interconnessioni acquedottistiche tra le reti e gli impianti esistenti: Lotto 1 Collegamento Valfenera Cellarengo | APP2.1 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 200.000 | 222.759 | | |
| N78/594/6 36/2022 | Potenziamento e adeguamento infrastrutture idriche tramite collegamenti ed interconnessioni acquedottistiche tra le reti e gli impianti esistenti: Lotto 2 | AFFZ.1 | 0 | 4.014 | 0 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 50.000 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio Pdl- legenda | | | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | | | |
|---------------------------------|--|---|-------|-------|-------|--------|--------|---|---------|--------|--------|
| | Completamento Interconnessione acquedottistica Valfenera- Cellarengo e collegamento Loc. Bii; Lotto 3 Collegamento Valfenera-Ferrere; Lotto 4 Collegamento San Damiano- Cisterna | | | | | | | | | | |
| | TOTALE | | 0 | 4.014 | 0 | 15.000 | 20.000 | 210.000 | 232.759 | 30.000 | 50.000 |
| % di | SPESA rispetto al TOTALE | | 0,00% | 0,70% | 0,00% | 0,86% | 0,82% | 14,12% | 24,41% | 2,80% | 4,22% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| DEP1.2 | DEP1.2 Assenza totale o parziale del servizio di depurazione in agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 A.E. | M5 (attraverso G5.2), M6, Altro |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio PdI- legenda | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| G13 | Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione | DEP1.2 | 47.674 | 21.362 | 63.816 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | TOTALE | | 47.674 | 21.362 | 63.816 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | | 6,64% | 3,70% | 4,02% | 1,15% | 0,82% | 1,34% | 2,10% | 1,86% | 1,69% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| DEP2.3 | DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di trattamento | M6 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio Pdl- legenda | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N59/627/2 015 | Realizzazione del collegamento della fognatura della Frazione Stazione al depuratore Capoluogo nel Comune di Villanova d'Asti | DEP2.3 | 0 | 5.007 | 6.074 | 10.000 | 20.000 | 100.000 | 300.000 | 308.920 | |
| N67/514/2 018 | Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei Comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impiento di depurazione di Villanova d'Asti | DEP2.3 | 11.870 | 26.820 | 26.018 | 300.000 | 1.200.000 | 586.384 | | | |
| | TOTALE | | 11.870 | 31.827 | 32.091 | 310.000 | 1.220.000 | 686.384 | 300.000 | 308.920 | 0 |
| % di | SPESA rispetto al TOTALE | | 1,65% | 5,52% | 2,02% | 17,84% | 50,26% | 46,14% | 31,46% | 28,79% | 0,00% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| DEP3.1 | DEP3.1 Inadeguato recupero di materia e/o di energia dei fanghi residui di depurazione | M5 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio PdI- legenda | | | | | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | |
|---------------------------------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|
| N55/490/2 014 | Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione centrale del Comune di San Damiano d'Asti | DEP3.1 | 7.400 | 0 | 0 | | | | | | |
| | TOTALE | | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | | 1,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

PIANA – Interventi Acquedotto

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| DIS1.1 | DIS1.1 Assenza parziale o totale delle reti di distribuzione | M3, Altro, MC1, MC2 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio Pdl- legenda | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| G1 | Estensione nuove reti acquedotto | DIS1.1 | 25.000 | 33.755 | 78.956 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio PdI- legenda | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---------|--------|--------|---|---|
| G21 | Nuovi allacciamenti | DIS1.1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| N76/637/2 022 | Collegamento, potenziamento ed interconnessione acquedottistica tra la rete del Comune di Villanova d'Asti ed il Comune di Montafia | DIS1.1 | 0 | 5.753 | 91.711 | 50.000 | 350.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| G21 | Nuovi allacciamenti | DIS1.1 | 0 | 0 | | | | | | | |
| TOTALE | | | 25.000 | 39.508 | 170.666 | 70.000 | 370.000 | 70.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | | 3,48% | 6,85% | 10,75% | 4,03% | 15,24% | 4,71% | 3,15% | 2,80% | 2,53% |

PIANA – Interventi Acquedotto

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| | DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche) | M1, M2, M3 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio Pdl- legenda | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---------|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| G3 | Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica | DIS1.2 | 200.483 | 134.112 | 112.577 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| G5 | Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento | DIS1.2 | 4.149 | 5.320 | 27.543 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio Pdl- legenda | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | Manutenzione Straordinaria Prese | DIS1.2 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| G3 | Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica | DIS1.2 | | 0 | | | | | | | |
| N65/567/5 68/2018 | Interventi per la sostituzione di alcuni tratti della rete idrica finalizzati al risanamento delle condotte e alla riduzione delle perdite | DIS1.2 | 10.868 | 4.160 | 228.090 | 221.442 | | | | | |
| N70/2020 | Manutenzione straordinaria serbatoi pensili | DIS1.2 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| N74/617/2 020 | Sostituzione e potenziamento reti di distribuzione vetuste dell'Acquedotto della Piana | DIS1.2 | 12.516 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100.000 | 500.000 |
| N79/647/2 023 | Ottimizzazione pressioni della rete Comuni di San Damiano d'Asti e San Martino Alfieri | DIS1.2 | | | 16.763 | 50.000 | 73.237 | | | | |
| | TOTALE | | 228.016 | 143.592 | 384.972 | 321.442 | 123.237 | 95.000 | 95.000 | 185.000 | 585.000 |
| % di | SPESA rispetto al TOTALE | | 31,77% | 24,89% | 24,25% | 18,50% | 5,08% | 6,39% | 9,96% | 17,24% | 49,41% |

PIANA – Interventi Acquedotto

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| DIS1.4 | DIS1.4 Inadeguate capacità di compenso e di riserva dei serbatoi | M0, M2 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio PdI- legenda | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | | | | | |
|---------------------------------|--|---|-------|-------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| G4 | Manutenzione Straordinaria Serbatoi | DIS1.4 | 4.250 | 0 | 60.968 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | TOTALE | | 4.250 | 0 | 60.968 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| % di | SPESA rispetto al TOTALE | | 0,59% | 0,00% | 3,84% | 1,15% | 0,82% | 1,34% | 2,10% | 1,86% | 1,69% |

PIANA – Interventi vari

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| EFF1.1 | EFF1.1 Margini di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di acquedotto (approvvigionamento, potabilizzazione, distribuzione) | Altro |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio Pdl- legenda | | | | | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | |
|---------------------------------|--|---|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---|--------|
| G8 | Manutenzione Straordinaria Telecontrollo | EFF1.1 | 7.647 | 3.803 | 3.230 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| G15 | Manutenzione Straordinaria Immobili | EFF1.1 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| G16 | Acquisto automezzi | EFF1.1 | 15.043 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio PdI- legenda | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|--|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| G17 | Manutenzione Straordinaria automezzi | EFF1.1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| G18 | Software | EFF1.1 | 4.000 | 2.750 | 9.363 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| G19 | Hardware | EFF1.1 | 1.905 | 8.233 | 8.630 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| G20 | Attrezzatura Varia Minuta | EFF1.1 | 2.384 | 1.469 | 3.079 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| G6 | Manutenzione Straordinaria Altri Impianti | EFF1.1 | 0 | 0 | | | | | | | |
| TOTALE | | | 30.979 | 16.255 | 24.302 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| % di | % di SPESA rispetto al TOTALE | | 4,32% | 2,82% | 1,53% | 2,59% | 1,85% | 3,03% | 4,72% | 4,19% | 3,80% |

PIANA – Interventi vari Fognatura

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| | EFF1.2 Margini di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di fognatura. | Altro |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio Pdl- legenda | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | | | | | |
|---------------------------------|---|---|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| G12 | Manutenzione Straordinaria Telecontrollo fognatura | EFF1.2 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | TOTALE | | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,12% | 0,08% | 0,13% | 0,21% | 0,19% | 0,17% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| EFF1.3 | EFF1.3 Margini di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di depurazione. | Altro |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio PdI- legenda | | | | | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | |
|---------------------------------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|
| G14 | Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di Depurazione | EFF1.3 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| TOTALE | | | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,12% | 0,08% | 0,13% | 0,21% | 0,19% | 0,17% |

PIANA – Interventi vari Acquedotto

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| EFF4.1 | EFF4.1 Elevati consumi di energia elettrica in acquedotto | Altro |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio Pdl- legenda | | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | |
|---------------------------------|---|---|---------|---|--|--|---|--|
| N73/609/2 020 | Implementazione sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti e interventi di miglioramento dell'efficienza | EFF4.1 | 144.805 | 0 | | | | |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio PdI- legenda | | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 | | | | |
|---------------------------------|---|---|---------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| | energetica | | | | | | | | | | |
| N73/609/2 020 | Implementazione sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti e interventi di miglioramento dell'efficienza energetica | EFF4.1 | | 0 | | | | | | | |
| TOTALE | | | 144.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | | 20,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

PIANA – Interventi Fognatura

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| FOG1.2 | FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui in agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 A.E. | M5 (attraverso G5.2), M6, Altro |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio Pdl- legenda | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|-------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| G9 | Estensioni nuove reti fognatura | FOG1.2 | 0 | 5.020 | 87.487 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| G9 | Estensioni nuove reti fognatura | FOG1.2 | 0 | 0 | | | | | | | |
| N29/483/2 010 | Collettamento scarichi della zona nord-ovest del concentrico e della zona | FOG1.2 | 0 | 0 | 1.486 | | | | | | |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio Pdl- legenda | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | industriale al nuovo depuratore Capoluogo Comune di Villanova | | | | | | | | | | |
| N30/503/2 010 | Realizzazione di un tronco di fognatura di collegamento da impianto di depurazione del concentrico a Località Doglioni nel Comune di Tigliole. | FOG1.2 | 0 | 5.460 | 11.458 | 160.682 | | | | | |
| N37/454/2 010 | Razionalizzazione del sistema di fognatura e depurazione del Comune di San Martino Alfieri e convogliamento reflui verso San Damiano d'Asti | FOG1.2 | 7.870 | 4.553 | 363.095 | 131.258 | | | | | |
| N62/615/2 016 | Estensione del sistema fognario nei Comuni di Cantarana in Località Serralunga e Tigliole. | FOG1.2 | 2.080 | 0 | 1.040 | 20.000 | 80.000 | 80.000 | 26.880 | | |
| N64/524/2 018 | Collettamento scarichi Collina di San Rocco nel Comune di Ferrere | FOG1.2 | 0 | 0 | 3.224 | 20.000 | 100.000 | 101.136 | | | |
| | TOTALE | | 9.950 | 15.032 | 467.790 | 341.940 | 190.000 | 191.136 | 36.880 | 10.000 | 10.000 |
| % di | SPESA rispetto al TOTALE | | 1,39% | 2,61% | 29,47% | 19,68% | 7,83% | 12,85% | 3,87% | 0,93% | 0,84% |

PIANA – Interventi Fognatura

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| FOG2.3 | FOG2.3 Inadeguatezza dimensionale delle condotte fognarie | M4a |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio Pdl- legenda | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G10 | Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria | FOG2.3 | 31.489 | 45.553 | 52.998 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| G11 | Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di sollevamento ecc) | FOG2.3 | 1.680 | 9.920 | 3.878 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| G10 | Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria | FOG2.3 | 0 | 0 | | | | | | | |
| N69/602/2 020 | Risoluzione delle problematiche di deflusso della rete fognaria di Frazione Stazione nel Comune di Villanova d'Asti | FOG2.3 | 4.888 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| N75/613/2 021 | Nuovo scolmatore a servizio della rete fognaria a nord del concentrico nel Comune di Villanova d'Asti | FOG2.3 | 32.504 | 61.126 | 206.674 | 450.823 | | | | | |
| | TOTALE | | 70.561 | 116.599 | 263.551 | 480.823 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | | 9,83% | 20,21% | 16,60% | 27,68% | 1,24% | 2,35% | 3,67% | 3,26% | 2,96% |

PIANA – Interventi Acquedotto

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| POT1.1 | POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, di monitoraggio, dei trattamenti | M3, M0, M1 (eventuale residuale) |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio PdI- legenda | | | | | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | |
|---------------------------------|---|---|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---|-------|
| G6 | Manutenzione Straordinaria Altri Impianti (potabilizzazione) | POT1.1 | 53.101 | 57.852 | 31.717 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| TOTALE | | | 53.101 | 57.852 | 31.717 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | | 7,40% | 10,03% | 2,00% | 0,29% | 0,21% | 0,34% | 0,52% | 0,47% | 0,42% |

PIANA – Interventi vari

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| UTZ1.1 | UTZ1.1 Inadeguatezza del sistema di lettura e fatturazione | Prerequisito 1, M1, Altro, MC1, MC2 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio PdI- legenda | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| G2 | Sostituzione contatori | UTZ1.1 | 84.107 | 89.557 | 80.796 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| G2 | Sostituzione contatori | UTZ1.1 | 0 | 0 | | | | | | | |

| ID interv pianifi | ento Titolo Intervento pianificato | Criticità ex foglio Pdl- legenda | | | | | | | | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|-------------------------|------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| | TOTALE | | 84.107 | 89.557 | 80.796 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | % di SPESA rispetto al TOTALE | | 11,72% | 15,52% | 5,09% | 4,61% | 3,30% | 5,38% | 8,39% | 7,46% | 6,76% |

3.4.2 ACQ. PIANA - TOTALE INTERVENTI DEL PDI RAGGRUPPATI PER CRITICITÀ CON RELATIVE PERCENTUALI DI SPESA

| Criticità | Valore investimento annuo 2021 | Valore investimento annuo 2022 | Valore investimento annuo 2023 | Valore investimento annuo 2024 | Valore investimento annuo 2025 | Valore investimento annuo 2026 | Valore investimento annuo 2027 | Valore investimento annuo 2028 | Valore investimento annuo 2029 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti di approvvigionamento | 0 | 41.306 | 6.656 | 24.000 | 300.000 | 26.000 | 50.000 | 300.000 | 300.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,00% | 7,16% | 0,42% | 1,38% | 12,36% | 1,75% | 5,24% | 27,96% | 25,34% |
| APP2.1 Assenza parziale o totale delle reti di adduzione | 0 | 4.014 | 0 | 15.000 | 20.000 | 210.000 | 232.759 | 30.000 | 50.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,00% | 0,70% | 0,00% | 0,86% | 0,82% | 14,12% | 24,41% | 2,80% | 4,22% |
| DEP1.2 Assenza totale o parziale del servizio di depurazione in agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 A.E. | 47.674 | 21.362 | 63.816 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 6,64% | 3,70% | 4,02% | 1,15% | 0,82% | 1,34% | 2,10% | 1,86% | 1,69% |
| DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di trattamento | 11.870 | 31.827 | 32.091 | 310.000 | 1.220.000 | 686.384 | 300.000 | 308.920 | 0 |

| Criticità | Valore investimento annuo 2021 | Valore investimento annuo 2022 | Valore investimento annuo 2023 | Valore investimento annuo 2024 | Valore investimento annuo 2025 | Valore investimento annuo 2026 | Valore investimento annuo 2027 | Valore investimento annuo 2028 | Valore investimento annuo 2029 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 1,65% | 5,52% | 2,02% | 17,84% | 50,26% | 46,14% | 31,46% | 28,79% | 0,00% |
| DEP3.1 Inadeguato recupero di materia e/o di energia dei fanghi residui di depurazione | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 1,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| DIS1.1 Assenza parziale o totale delle reti di distribuzione | 25.000 | 39.508 | 170.666 | 70.000 | 370.000 | 70.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 3,48% | 6,85% | 10,75% | 4,03% | 15,24% | 4,71% | 3,15% | 2,80% | 2,53% |
| DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche) | 228.016 | 143.592 | 384.972 | 321.442 | 123.237 | 95.000 | 95.000 | 185.000 | 585.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 31,77% | 24,89% | 24,25% | 18,50% | 5,08% | 6,39% | 9,96% | 17,24% | 49,41% |
| DIS1.4 Inadeguate capacità di compenso e di riserva dei serbatoi | 4.250 | 0 | 60.968 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,59% | 0,00% | 3,84% | 1,15% | 0,82% | 1,34% | 2,10% | 1,86% | 1,69% |
| EFF1.1 Margini di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di acquedotto (approvvigionamento, potabilizzazione, distribuzione) | 30.979 | 16.255 | 24.302 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 4,32% | 2,82% | 1,53% | 2,59% | 1,85% | 3,03% | 4,72% | 4,19% | 3,80% |
| EFF1.2 Margini di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di fognatura. | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,12% | 0,08% | 0,13% | 0,21% | 0,19% | 0,17% |

| Criticità | Valore investimento annuo 2021 | Valore investimento annuo 2022 | Valore investimento annuo 2023 | Valore investimento annuo 2024 | Valore investimento annuo 2025 | Valore investimento annuo 2026 | Valore investimento annuo 2027 | Valore investimento annuo 2028 | Valore investimento annuo 2029 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| EFF1.3 Margini di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di depurazione. | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,12% | 0,08% | 0,13% | 0,21% | 0,19% | 0,17% |
| EFF4.1 Elevati consumi di energia elettrica in acquedotto | 144.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 20,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui in agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 A.E. | 9.950 | 15.032 | 467.790 | 341.940 | 190.000 | 191.136 | 36.880 | 10.000 | 10.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 1,39% | 2,61% | 29,47% | 19,68% | 7,83% | 12,85% | 3,87% | 0,93% | 0,84% |
| FOG2.3 Inadeguatezza dimensionale delle condotte fognarie | 70.561 | 116.599 | 263.551 | 480.823 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 9,83% | 20,21% | 16,60% | 27,68% | 1,24% | 2,35% | 3,67% | 3,26% | 2,96% |
| POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, di monitoraggio, dei trattamenti | 53.101 | 57.852 | 31.717 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 7,40% | 10,03% | 2,00% | 0,29% | 0,21% | 0,34% | 0,52% | 0,47% | 0,42% |
| UTZ1.1 Inadeguatezza del sistema di lettura e fatturazione | 84.107 | 89.557 | 80.796 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 11,72% | 15,52% | 5,09% | 4,61% | 3,30% | 5,38% | 8,39% | 7,46% | 6,76% |
| | 717.713 | 576.903 | 1.587.326 | 1.737.206 | 2.427.237 | 1.487.520 | 953.639 | 1.072.920 | 1.184.000 |

3.4.3 ACQ. PIANA - ANALISI DELLE SPESE (CONSUNTIVO E PREVENTIVO) PREVISTE NEL PDI ANNI 2021-2029

Relativamente al PdI in esame, al fine di mettere in evidenza le aree oggetto di maggiori investimenti nel periodo 2021 – 2029 vengono di seguito riportati gli interventi raggruppati per criticità con la percentuale media (anni 2021-2029) delle spese (gli anni 2021 e 2022 sono indicati a consuntivo, il 2023 a pre consuntivo, mentre gli anni successivi sono a preventivo) elencati in base alla % di spesa.

| Criticità | % spesa distinta per criticità 2021 - 2029 |
|---|---|
| DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche) | 20,83% |
| DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di trattamento | 20,41% |
| FOG2.3 Inadeguatezza dimensionale delle condotte fognarie | 9,76% |
| APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti di approvvigionamento | 9,07% |
| FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui in agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 A.E. | 8,83% |
| UTZ1.1 Inadeguatezza del sistema di lettura e fatturazione | 7,58% |
| DIS1.1 Assenza parziale o totale delle reti di distribuzione | 5,95% |
| APP2.1 Assenza parziale o totale delle reti di adduzione | 5,33% |
| EFF1.1 Margini di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di acquedotto (approvvigionamento, potabilizzazione, distribuzione) | 3,21% |
| DEP1.2 Assenza totale o parziale del servizio di depurazione in agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 A.E. | 2,59% |
| POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, di monitoraggio, dei trattamenti | 2,41% |
| EFF4.1 Elevati consumi di energia elettrica in acquedotto | 2,24% |
| DIS1.4 Inadeguate capacità di compenso e di riserva dei serbatoi | 1,49% |
| DEP3.1 Inadeguato recupero di materia e/o di energia dei fanghi residui di depurazione | 0,11% |

| Criticità | % spesa distinta per criticità 2021 - 2029 |
|---|---|
| EFF1.2 Margini di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di fognatura. | 0,10% |
| EFF1.3 Margini di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di depurazione. | 0,10% |
| | 100,00% |

3.4.4 ACQ. PIANA - RIEPILOGO PDI ANNI 2021 – 2029


Si riportano di seguito i dati in € relativi al riepilogo PdI con i dati 2021-2029

| Riepilogo investimenti realizzati | UdM | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|---------|---------|-----------|
| Valore investimento annuo (lordo contributi) | euro | 717.713 | 576.903 | 1.587.326 |
| Entrate in esercizio al lordo contributi - da foglio "Pdl-cronoprogramma_investimenti" | euro | 635.117 | 418.705 | 674.487 |
| Contributi - da foglio "Pdl-cronoprogramma_investimenti" | euro | 950.256 | 439.052 | 645.174 |
| LIC dell'anno | euro | 82.596 | 158.198 | 954.145 |

Si riportano di seguito i dati in € relativi alle previsioni di spese per gli anni 2024 - 2029

| Riepilogo investimenti previsti | UdM | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| Valore investimento annuo (lordo contributi)- da foglio "Pdl-cronoprogramma_investimenti" | euro | 1.737.206 | 2.427.237 | 1.487.520 | 953.639 | 1.072.920 | 1.184.000 |
| Entrata in esercizio al lordo dei contributi | euro | 2.291.743 | 728.000 | 3.114.000 | 974.000 | 1.064.000 | 990.000 |
| Contributi - da foglio "Pdl- cronoprogramma_investimenti" | euro | 1.122.795 | 1.641.145 | 567.000 | 175.000 | 70.000 | 70.000 |
| Valore investimento annuo (netto contributi) | euro | 614.411 | 786.092 | 920.520 | 778.639 | 1.002.920 | 1.114.000 |

Si riporta di seguito il Grafico che evidenzia gli interventi realizzati dagli anni 2012 al 2023 e gli interventi previsti nei prossimi anni (2024-2029).

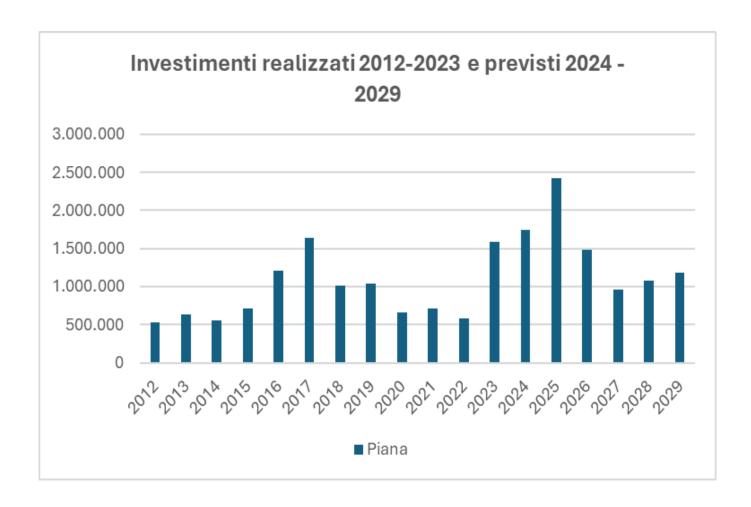

3.4.5 Aco. Piana - Piano Opere Strategiche

riporta anche gli importi di spesa suddivisi per anno (gli anni 2021 e 2022 sono indicati a consuntivo, il 2023 a pre consuntivo, mentre gli anni successivi sono a preventivo)ed

Il Gestore ha proposto il Piano delle Opere Strategiche (POS) per lo sviluppo delle infrastrutture idriche in cui sono specificate le criticità riscontrate e gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione delle opere strategiche, con riferimento al periodo 2030-2035.

Gli interventi infrastrutturali indicati nel POS riguardano nuove opere la cui realizzazione richiede strutturalmente tempistiche pluriennali anche in ragione della relativa complessità tecnica, è considerata prioritaria ai fini del raggiungimento dei livelli di servizio fissati per il pertinente territorio.

In relazione alla scadenza degli affidamenti, attualmente prevista per l'anno 2030, si riportano di seguito gli interventi previsti nel POS solo relativi all'anno 2030.

Nel file RDT vengono, comunque, mantenuti i dati completi del POS indicati dai Gestori, quale mero atto di indirizzo sugli interventi strategici da realizzare, fermo restando che il Gestore che opererà post 2030 potrà provvedere al motivato aggiornamento degli interventi previsti sulla base delle indicazioni che saranno contenute nel nuovo Piano d'Ambito da definirsi nei prossimi anni.

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2030 |
|------------------------------|---|--|
| N78/594/6362022 | Potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche tramite collegamenti ed interconnessioni acquedottistiche tra le reti e gli impianti esistenti: Lotto 2 Completamento Interconnessione acquedottistica Valfenera-Cellarengo e collegamento Loc. Bii; Lotto 3 Collegamento Valfenera-Ferrere; Lotto 4 Collegamento San Damiano-Cisterna | 2.090.986 |
| N69/602/2020 | Risoluzione delle problematiche di deflusso della rete fognaria di Frazione Stazione nel Comune di Villanova d'Asti | 320.112 |
| N70/2020 | Manutenzione straordinaria serbatoi pensili | 90.000 |
| N74/617/2020 | Sostituzione e potenziamento reti di distribuzione vetuste dell'Acquedotto della Piana | 1.011.484 |
| N76/637/2022 | Collegamento, potenziamento ed interconnessione acquedottistica tra la rete del Comune di Villanova d'Asti ed il Comune di Montafia | 797.537 |

3.5 Gestore Acquedotto Valtiglione S.p.A.

3.5.1 ANALISI DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PDI PROPOSTO DAL GESTORE IN RELAZIONE ALLE CRITICITÀ

Si raggruppano di seguito gli interventi secondo la criticità indicata dal Gestore. Si riporta anche gli importi di spesa suddivisi per anno (gli anni 2021 e 2022 sono indicati a consuntivo, il 2023 a pre consuntivo, mentre gli anni successivi sono a preventivo) ed i relativi totali.

Viene anche riportata la percentuale del totale degli interventi raggruppati per criticità con la somma totale della spesa (a consuntivo o preventivo) suddivisa per anno

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|---|
| | APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti di approvvigionamento | M0, M2 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N43/2018/I RETI | Mtz pozzi Belbo CANELLI revamping-K22 | APP1.1 | 13.783 | 917 | 0 | | | | | | |
| | TOTALE | | 13.783 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | | 0,44% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| APP1.2 | APP1.2 Inadeguatezza della qualità delle fonti di approvvigionamento | M0, M3 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|--|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N42/2014/ AV | Collegam sist . Idr. Costigliole d'Asti Castagnole Lanze Valle Tanaro | APP1.2 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 158.421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N66/2022/ AV | Interconnessione tra CCAM-ASP-AV e i Comuni di Azzano d'Asti, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro e Cerro Tanaro (LOTTO 1 Azzano d'Asti) | APP1.2 | 0 | 0 | 6.000 | 390.000 | 344.111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE | | 0 | 0 | 6.000 | 590.000 | 502.532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di S | SPESA rispetto al TOTALE | | 0,00% | 0,00% | 0,14% | 25,62% | 10,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| APP2.1 | APP2.1 Assenza parziale o totale delle reti di adduzione | M0, M2 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|--|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G41/IRETI | Estensione rete in loc AIE | APP2.1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| G42/IRETI | Estensione rete in loc Rocchea/Pianezza | APP2.1 | 0 | 0 | 0 | | 550.000 | | | | |
| 2016ATSI0 031 | CANELLI - Est.rete dist. loc.Aie-D | APP2.1 | 0 | 36.432 | 42.732 | | | | | | |
| TOTALE | | | 0 | 36.432 | 42.732 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di S | % di SPESA rispetto al TOTALE | | 0,00% | 1,06% | 1,02% | 0,00% | 11,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| APP2.2 | APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di adduzione | M1, M2 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N65/2021/ AV | Opere di manutenzione rifacimento tratti di condotte idriche nel Comune di Isola d'Asti | APP2.2 | 0 | 92.395 | 22.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G3/IRETI | Acquedotto Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica | APP2.2 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | | | | |
| G5/IRETI | Acquedotto Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento | APP2.2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| G6/IRETI | Acquedotto Manutenzione Straordinaria Altri Impianti | APP2.2 | 172 | 104.404 | 33.926 | 30.000 | 30.000 | | | | |
| G7/IRETI | Acquedotto Manutenzione Straordinaria Prese | APP2.2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | TOTALE | | 172 | 196.799 | 56.798 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di S | SPESA rispetto al TOTALE | | 0,01% | 5,72% | 1,36% | 2,82% | 1,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| | DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, dei sistemi di monitoraggio, dei trattamenti di rimozione | M6, Altro |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G13/AV | Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione | DEP2.1 | 62.100 | 0 | 70.951 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| G14/AV | Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di Depurazione | DEP2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G13/IRETI | Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione | DEP2.1 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | | | | |
| 2016ATSI0 020 | MTZ.STR.CONSERVAT.IM PIANTI DEP Canelli | DEP2.1 | 6.303 | 84.484 | 13.336 | | | | | | |
| TOTALE | | | 68.403 | 84.484 | 84.287 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | | 2,20% | 2,45% | 2,01% | 0,87% | 0,42% | 1,17% | 3,85% | 3,23% | 3,70% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| DEP2.2 | DEP2.2 Estrema frammentazione del servizio di depurazione | M6, Altro |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N69/2023/ AV | PNRR - Investimenti fognatura e depurazione - Eliminazione di impianti di depurazione nella Valle del Rio Nizza, collettamento dei reflui e loro invio alla rete fognaria e all'impianto di depurazione di Nizza Monferrato | DEP2.2 | 0 | 0 | 118.975 | 385.000 | 2.600.000 | 595.000 | 0 | 0 | 0 |
| N70/2023/ AV | Razionalizzazione del sistema fognario e di depurazione dei reflui degli insediamenti civili ed industriali nella Valle del Rio Cervino in Provincia di Asti | DEP2.2 | 0 | 0 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE | | 0 | 0 | 133.475 | 385.000 | 2.600.000 | 595.000 | 0 | 0 | 0 |
| % di S | SPESA rispetto al TOTALE | | 0,00% | 0,00% | 3,19% | 16,72% | 54,08% | 69,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| DEP2.3 | DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di trattamento | M6 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N63/2019/ AV | Potenziamento ed adeguamento degli impianti di depurazione nel Comune di Montegrosso d'Asti Loc. Osterie, Vallumida, Gorra e Pratolungo; nel Comune di Vigliano d'Asti Loc. Tiglione e nel Comune di Mombercelli Loc. Piana (PIES 23) | DEP2.3 | 57.539 | 294.798 | 138.387 | 56.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N26/2013/I RETI | Potenziamento Depuratore | DEP2.3 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| N41/2018/I RETI | Adeguamento e potenziamento del depuratore di Canelli - Lotto2 | DEP2.3 | 587.898 | 30.578 | 5.281 | | | | | | |
| 2016ATSI0 028 | CANELLI-Adeg.e potenz dep.LOTTO 2 - 2019 | DEP2.3 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2016ATSI0 030 | NIZZA- Miglioramen.rimozi.fosforo depurat | DEP2.3 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2016ATSI0 043 | Nizza Trattamenti secondari | DEP2.3 | 14.031 | 43.345 | 36.051 | | | | | | |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTALE | | 659.468 | 368.720 | 179.719 | 56.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | | 21,16% | 10,71% | 4,29% | 2,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| DEP2.3 | DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di trattamento | M6 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N63/2019/ AV | Potenziamento ed adeguamento degli impianti di depurazione nel Comune di Montegrosso d'Asti Loc. Osterie, Vallumida, Gorra e Pratolungo; nel Comune di Vigliano d'Asti Loc. Tiglione e nel Comune di Mombercelli Loc. Piana (PIES 23) | DEP2.3 | 57.539 | 294.798 | 138.387 | 56.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N26/2013/I RETI | Potenziamento Depuratore | DEP2.3 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N41/2018/I RETI | adeguamento/potenziam.to del depuratore di Canelli - Lotto2 | DEP2.3 | 587.898 | 30.578 | 5.281 | | | | | | |
| 2016ATSI0 028 | CANELLI-Adeg.e potenz dep.LOTTO 2 - 2019 | DEP2.3 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2016ATSI0 030 | NIZZA- Miglioramen.rimozi.fosforo depurat | DEP2.3 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2016ATSI0 043 | Nizza Trattamenti secondari | DEP2.3 | 14.031 | 43.345 | 36.051 | | | | | | |
| | TOTALE | | 659.468 | 368.720 | 179.719 | 56.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di S | % di SPESA rispetto al TOTALE | | 21,16% | 10,71% | 4,29% | 2,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| DEP2.3 | DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di trattamento | M6 |

| ID intervento pianificato | | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N63/2019/ AV | Potenziamento ed adeguamento degli impianti | DEP2.3 | 57.539 | 294.798 | 138.387 | 56.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|--|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | di depurazione nel Comune di Montegrosso d'Asti Loc. Osterie, Vallumida, Gorra e Pratolungo; nel Comune di Vigliano d'Asti Loc. Tiglione e nel Comune di Mombercelli Loc. Piana (PIES 23) | | | | | | | | | | |
| N26/2013/I RETI | Potenziamento Depuratore | DEP2.3 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| N41/2018/I RETI | Adeguamento e potenziamento del depuratore di Canelli - Lotto2 | DEP2.3 | 587.898 | 30.578 | 5.281 | | | | | | |
| 2016ATSI0 028 | CANELLI-Adeg.e potenz dep.LOTTO 2 - 2019 | DEP2.3 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2016ATSI0 030 | NIZZA- Miglioramen.rimozi.fosforo depurat | DEP2.3 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2016ATSI0 043 | Nizza Trattamenti secondari | DEP2.3 | 14.031 | 43.345 | 36.051 | | | | | | |
| | TOTALE | | 659.468 | 368.720 | 179.719 | 56.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di S | SPESA rispetto al TOTALE | | 21,16% | 10,71% | 4,29% | 2,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| DEP3.3 | DEP3.3 Impatto negativo sul recapito finale | M6, Altro |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|--|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N36/2015/I RETI | Ripristino dell'immissione nel Torrente Belbo dello scarico del Depuratore. | DEP3.3 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | TOTALE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| DIS1.1 | DIS1.1 Assenza parziale o totale delle reti di distribuzione | M3, Altro, MC1, MC2 |

| ID intervento pianificato | | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/AV | Estensione nuove reti | DIS1.1 | 0 | 0 | 53.776 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTALE | | 0 | 0 | 53.776 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | | 0,00% | 0,00% | 1,29% | 0,87% | 0,42% | 2,34% | 7,69% | 6,45% | 7,41% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| DIS1.2 | DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche) | M1, M2, M3 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|--|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3/AV | Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica | DIS1.2 | 722.752 | 908.716 | 583.698 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| G4/AV | Manutenzione Straordinaria Serbatoi | DIS1.2 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| G5/AV | Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento | DIS1.2 | 86.619 | 0 | 48.297 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| G6/AV | Manutenzione Straordinaria Altri Impianti | DIS1.2 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| G7/AV | Manutenzione Straordinaria Prese | DIS1.2 | 0 | 0 | 436.037 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|--|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8/AV | Manutenzione Straordinaria Telecontrollo | DIS1.2 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| N67/2022/ AV | Lavori di risanamento tubazioni di adduzione finalizzati alla riduzione delle perdite nei comuni di Calamandrana, Mombaruzzo, Montaldo Scarampi e Vigliano d'Asti (51_A_5/AV) | DIS1.2 | 10.400 | 87.778 | 314.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N72/2023/ AV | Lavori di sostituzione condotte nel concentrico di San Marzano Oliveto (Lotto1-Lotto2-Lotto 3) | DIS1.2 | 0 | 0 | 115.555 | 134.445 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 60.000 |
| N73/2024/ AV | Progetto per il miglioramento della Qualità Tecnica del Nacro- indicatore M1 | DIS1.2 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 250.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| G4/IRETI | Acquedotto Manutenzione Straordinaria Serbatoi | DIS1.2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| N22/2012/I RETI | Sostituzione rete acquedotto Via Asti | DIS1.2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| N27/2013/I RETI | Realizzazione rete Ospedale | DIS1.2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| G14/IRETI | Potenziamenmto rete distribuzione via Pio Corsi | DIS1.2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| G15/IRETI | NIZZA M-Pot.rete dist.via dell'ORATORIO | DIS1.2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2016ATSI0 016 | CANELLI-SOSTITUZIONE CONDOTTA V. ASTI | DIS1.2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016ATSI0 033 | MTZ. STR.CONS. RETI ACQ Canelli e Nizza Monfer | DIS1.2 | 92.576 | 211.947 | 265.950 | | | | | | |
| 2016ATSI0 034 | MTZ.STR.CONSERV.SERB ATOI ACQ Canelli e Nizza Monfer | DIS1.2 | 1.947 | 66.281 | 31.720 | | | | | | |
| 2016ATSI0 035 | MTZ STR CONS.SOL.DISTR.CANEL LI E NIZZA MONFER | DIS1.2 | 4.921 | 27.413 | 6.546 | | | | | | |
| 2016ATSI0 037 | MTZ.STR.CONS.DERIV.UT ENZA ACQ Canelli e Nizza Monfer | DIS1.2 | 64.382 | 115.997 | 69.557 | | | | | | |
| G37/IRETI | DER. UTENZA C/CLIENTE ACQ Canelli e Nizza Monf | DIS1.2 | 255.527 | 0 | 0 | | | | | | |
| G44/IRETI | sostituzione potenziamento condotta via Italia | DIS1.2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| G47/IRETI | Sostituzione e potenziamento condotta via Roma | DIS1.2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| G50/IRETI | NIZZA M-Potenz.rete dist. vie varie-R | DIS1.2 | 0 | 129.091 | 101.192 | | | | | | |
| G51/IRETI | CANELLIPotenz.rete dist. vie varie-D | DIS1.2 | 0 | 80.978 | 16.900 | | | | | | |
| G59/IRETI | Serbatoi | DIS1.2 | 0 | | 131.780 | | | | | | |
| G58/IRETI | Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | DIS1.2 | 0 | | 156.171 | | | | | | |
| Nuovo 2024 | CANELLIsostituzione e potenziamento condotta via Italia II° lotto | DIS1.2 | | | | 20.000 | 220.000 | | | | |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|--|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuovo 2024 | NIZZA- Centro Storico (via Pistone - S, Giulia) | DIS1.2 | | | | 170.000 | | | | | |
| | TOTALE | | 1.239.123 | 1.628.201 | 2.277.775 | 644.445 | 585.000 | 165.000 | 165.000 | 215.000 | 175.000 |
| % di S | SPESA rispetto al TOTALE | | 39,76% | 47,28% | 54,43% | 27,99% | 12,17% | 19,30% | 63,46% | 69,35% | 64,81% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--------------------------------|--|
| DIS2.1 | DIS2.1 Pressioni insufficienti | M2, M3 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G45/IRETI | Realizzazione nuovo impianto di innalzamento pressione via Rosselli ed individualizzazione utenze condomini Belvedere | DIS2.1 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | | | | | |
| | TOTALE | | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di S | SPESA rispetto al TOTALE | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|----------------------------|--|
| DIS2.2 | DIS2.2 Pressioni eccessive | M1 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|--|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N33/2015/I RETI | Installazione di due sistemi di riduzione di pressione in loc. Valle S. Giovanni - Calamandra | DIS2.2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | TOTALE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di S | SPESA rispetto al TOTALE | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| DIS3.2 | DIS3.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori di utenza | Prerequisito 1, M1, MC2 |

| ID intervento pianificato | | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2/AV | Sostituzione contatori | DIS3.2 | 105.353 | 95.166 | 449.508 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2/IRETI | Acquedotto Sostituzione contatori | DIS3.2 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | | | | |
| 2016ATSI0 032 | SOST. GRUPPI DI MISURA ACQ Canelli e Nizza Monfer | DIS3.2 | 11.079 | 12.315 | 6.715 | | | | | | |
| G36/IRETI | POSA GRUPPI DI MISURA ACQ Canelli e Nizza Monf | DIS3.2 | 4.752 | 3.556 | 3.541 | | | | | | |
| | TOTALE | | 121.184 | 111.037 | 459.765 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| % di S | SPESA rispetto al TOTALE | | 3,89% | 3,22% | 10,99% | 1,30% | 0,62% | 2,34% | 7,69% | 6,45% | 7,41% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| EFF1.1 | EFF1.1 Margini di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di acquedotto (approvvigionamento, potabilizzazione, distribuzione) | Altro |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|--|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G15/AV | Manutenzione Straordinaria Immobili | EFF1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G64/IRETI | Costruzioni leggere | EFF1.1 | 0 | | 5 | | | | | | |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|--|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G63/IRETI | Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | EFF1.1 | 0 | | 995 | | | | | | |
| | TOTALE | | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di S | SPESA rispetto al TOTALE | | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|---|
| | EFF2.1 Necessità di sviluppo di una pianificazione degli interventi di manutenzione e di sostituzione periodica degli asset | M0, M1, M2, M3, M4a, M4b, M4c, M5, M6, Altro |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|--|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G17/IRETI | Altre immobilizzazioni materiali e immateriali | EFF2.1 | 19.324 | 0 | 0 | | | | | | |
| G18/IRETI | Fabbricati industriali | EFF2.1 | 133 | 0 | 0 | | | | | | |
| G39/IRETI | Terreni | EFF2.1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| G40/IRETI | Altri impianti | EFF2.1 | 521 | 0 | 1.451 | | | | | | |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|--|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G46/IRETI | Sostituzione copertura magazzino/impianto via Calamandrana, con rimozione e smaltimento attuale copertura in cemento amianto | EFF2.1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| G65/IRETI | Altre immobilizzazioni materiali e immateriali | EFF2.1 | 0 | | 13.154 | | | | | | |
| | TOTALE | | 19.979 | 0 | 14.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di S | SPESA rispetto al TOTALE | | 0,64% | 0,00% | 0,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| EFF3.1 | EFF3.1 Criticità nella sicurezza delle condizioni di lavoro | Altro |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G16/AV | Acquisto automezzi | EFF3.1 | 28.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G17/AV | Manutenzione Straordinaria automezzi | EFF3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G20/AV | Attrezzatura Varia Minuta | EFF3.1 | 1.790 | 16.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOREG | Autoveicoli | EFF3.1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| G61/IRETI | Autoveicoli - automezzi | EFF3.1 | 478 | | 2.213 | | | | | | |
| | TOTALE | | 31.023 | 16.677 | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di S | PESA rispetto al TOTALE | | 1,00% | 0,48% | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| EFF4.2 | EFF4.2 Mancanza di sistemi di recupero energetico in adduzione e/o in distribuzione (laddove fattibili) | Altro |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|--|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N54/2016/ AV | Progetto di costruzione turbina presso la centrale di San Marzanotto | EFF4.2 | 97.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE | | 97.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di S | SPESA rispetto al TOTALE | | 3,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

VALTIGLIONE – Interventi fognatura

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| FOG1.2 | FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui in agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 A.E. | M5 (attraverso G5.2), M6, Altro |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G9/AV | Estensioni nuove reti fognatura | FOG1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N64/2021/ AV | Realizzazione di un nuovo collettore fognario per acque nere in Frazione San Carlo - Costigliole Asti (AT) | FOG1.2 | 0 | 77.894 | 22.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N28/2014/I RETI | Estensione servizio fognatura Borgata Aie | FOG1.2 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | | | | | |
| N40/2018/I RETI | Nuovo tratto fognario su Corso Acqui (stralcio dell'intervento N32/2014) | FOG1.2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2016ATSI0 022 | CANELLI -LAVORI COSTRUZIONE FOG. AIE | FOG1.2 | 8.049 | 7.760 | 0 | | | | | | |
| 2017ATSI0 037 | NIZZA-st.PONTEVERDE est.rete fogn-K21 e K23 | FOG1.2 | 15.514 | 4.591 | 0 | | | | | | |
| G38/IRETI | DERIVAZ. UTENZA C/CLIENTE FOG Canelli e Nizza Monf | FOG1.2 | 24.150 | 0 | 0 | | | | | | |
| | TOTALE | | 47.713 | 90.246 | 22.130 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di S | SPESA rispetto al TOTALE | | 1,53% | 2,62% | 0,53% | 0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

VALTIGLIONE – Interventi fognatura

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| | FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie, delle opere civili, delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti | M4a, M4b |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|--|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G10/AV | Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria | FOG2.1 | 135.151 | 186.747 | 190.476 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| G11/AV | Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di sollevamento ecc) | FOG2.1 | 311.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G12/AV | Manutenzione Straordinaria Telecontrollo | FOG2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N53/2016/ AV | Rifacimento potenziamento fognature - Comuni di Calosso, Costigliole e Vaglio Serra | FOG2.1 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N58/2017/ AV | Lavori di ripristino della funzionalità della rete fognaria tra i comuni di Costigliole d'Asti e Isola d'Asti (LOTTO 1) | FOG2.1 | 142.406 | 0 | 84.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N58 bis/AV | Lavori di ripristino della funzionalità della rete fognaria tra i comuni di Costigliole d'Asti e Isola d'Asti (2° LOTTO) | FOG2.1 | 36.388 | 23.000 | 0 | 200.000 | 240.612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G10/IRETI | Fognatura Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria | FOG2.1 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | | | | |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G11/IRETI | Fognatura Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari impianti di sollevamento ecc | FOG2.1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| N37/2017/I RETI | Prolungamento rete fognaria in strada Ponteverde. | FOG2.1 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | | | | | |
| N38/2017/I RETI | Rifacimento Fognatura adiacente alla SP Nizza- Annone | FOG2.1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2016ATSI0 040 | MTZ. STR. CONSERVATIVE RETI FOG Canelli e Nizza | FOG2.1 | 33.641 | 49.380 | 94.042 | | | | | | |
| 2016ATSI0 041 | MTZ.STR.CONSERV.IMP.S OLLEV.FOG Canelli | FOG2.1 | 6.733 | 6.548 | 63 | | | | | | |
| 2017ATSI0 038 | NIZZA-sp NIZZA_ANNONE rif.rete fogn-K21 K23 | FOG2.1 | 69.201 | 4.353 | 2.836 | | | | | | |
| 2018ATSI0 040 | NIZZA-c.so ACQUI_COLANIA rif.fogn- K21 E K23 | FOG2.1 | 10.864 | 519.913 | 223.935 | | | | | | |
| G35/IRETI | M.S.CONS.IMP.SOLLEV.F OG Nizza Monferrat | FOG2.1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | TOTALE | | 746.106 | 790.953 | 595.392 | 250.000 | 280.612 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| % di S | SPESA rispetto al TOTALE | | 23,94% | 22,97% | 14,23% | 10,86% | 5,84% | 2,92% | 9,62% | 8,06% | 9,26% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|---|--|
| FOG2.2 | FOG2.2 Elevate infiltrazioni di acque parassite | M4a, M4b, M6, Altro |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N71/2023/ AV | Interventi sulla fognatura nei comuni ex CIDAR con specifico riferimento alla riduzione delle acque parassite che confluiscono nel collettore SISI | FOG2.2 | 0 | 10.500 | 90.096 | 100.000 | 64.404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE | | 0 | 10.500 | 90.096 | 100.000 | 64.404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di S | SPESA rispetto al TOTALE | | 0,00% | 0,30% | 2,15% | 4,34% | 1,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro- indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| KNW2.1 | KNW2.1 Assenza o inadeguatezza del sistema digitale di archiviazione per le infrastrutture di acquedotto | Prerequisito 4 |

| ID | | | Valore investiment |
|---------------------------|-------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | o annuo (lordo contributi) 2021 | o annuo (lordo contributi) 2022 | o annuo (lordo contributi) 2023 | o annuo (lordo contributi) 2024 | o annuo (lordo contributi) 2025 | o annuo (lordo contributi) 2026 | o annuo (lordo contributi) 2027 | o annuo (lordo contributi) 2028 | o annuo (lordo contributi) 2029 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G18/AV | Software | KNW2.1 | 13.080 | 14.100 | 41.670 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| G19/AV | Hardware | KNW2.1 | 13.588 | 10.490 | 17.126 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| TOTALE | | | 26.668 | 24.590 | 58.796 | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | | 0,86% | 0,71% | 1,41% | 1,74% | 0,83% | 2,34% | 7,69% | 6,45% | 7,41% |

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| POT1.1 | POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, di monitoraggio, dei trattamenti | M3, M0, M1 (eventuale residuale) |

| ID intervento pianificato | | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016ATSI0 036 | MTZ.STR.CONS. TRATT. E POT., IMP.CAPTAZIONE ACQ Canelli e Nizza Monfer | POT1.1 | 18.430 | 68.415 | 65.358 | | | | | | |
| G43/IRETI | Manutenzione straordinaria impianto di potabilizzazione | POT1.1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTALE | | 18.430 | 68.415 | 65.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | | | 0,59% | 1,99% | 1,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

VALTIGLIONE – Interventi Acquedotto

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| UTZ1.1 | UTZ1.1 Inadeguatezza del sistema di lettura e fatturazione | Prerequisito 1, M1, Altro, MC1, MC2 |

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G16/IRETI | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | UTZ1.1 | 10.440 | 0 | 0 | | | | | | |
| G62/IRETI | Sistemi informativi | UTZ1.1 | 0 | | 40.826 | | | | | | |
| | TOTALE | | 10.440 | 0 | 40.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di S | SPESA rispetto al TOTALE | | 0,34% | 0,00% | 0,98% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

VALTIGLIONE – Interventi vari

| ID Criticità | Descrizione | Collegamento Macro-indicatore/ Prerequisito |
|--------------|--|--|
| | UTZ2.1 Inadeguatezza del servizio di assistenza all'utenza (es. call center, pronto intervento, sportelli e trattamento dei reclami) | M2, M3, M4a,M4b, Altro, MC1, MC2 |

| ID intervento pianificato | | ID Criticità | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investiment o annuo (lordo contributi) 2029 |
|---------------------------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G21/AV | Lavori di manutenzione straordinaria palazzina uffici | UTZ2.1 | 15.841 | 15.409 | 0 | 20.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE | | 15.841 | 15.409 | 0 | 20.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di S | SPESA rispetto al TOTALE | | 0,51% | 0,45% | 0,00% | 0,87% | 1,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

3.5.2 ACQ. VALTIGLIONE - TOTALE INTERVENTI DEL PDI RAGGRUPPATI PER CRITICITÀ CON RELATIVE PERCENTUALI DI SPESA

| ID Criticità | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema delle fonti e/o sovrautilizzo fonti di approvvigionamento | 13.783 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,44% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| APP1.2 Inadeguatezza della qualità delle fonti di approvvigionamento | 0 | 0 | 6.000 | 590.000 | 502.532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,00% | 0,00% | 0,14% | 25,62% | 10,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| APP2.1 Assenza parziale o totale delle reti di adduzione | 0 | 36.432 | 42.732 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,00% | 1,06% | 1,02% | 0,00% | 11,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| APP2.2 Inadeguate condizioni delle reti e degli impianti di adduzione | 172 | 196.799 | 56.798 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,01% | 5,72% | 1,36% | 2,82% | 1,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, dei sistemi di monitoraggio, dei trattamenti di rimozione | 68.403 | 84.484 | 84.287 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 2,20% | 2,45% | 2,01% | 0,87% | 0,42% | 1,17% | 3,85% | 3,23% | 3,70% |
| DEP2.2 Estrema frammentazione del servizio di depurazione | 0 | 0 | 133.475 | 385.000 | 2.600.000 | 595.000 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,00% | 0,00% | 3,19% | 16,72% | 54,08% | 69,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| ID Criticità | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di trattamento | 659.468 | 368.720 | 179.719 | 56.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 21,16% | 10,71% | 4,29% | 2,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| DEP3.3 Impatto negativo sul recapito finale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| DIS1.1 Assenza parziale o totale delle reti di distribuzione | 0 | 0 | 53.776 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,00% | 0,00% | 1,29% | 0,87% | 0,42% | 2,34% | 7,69% | 6,45% | 7,41% |
| DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche) | 1.239.123 | 1.628.201 | 2.277.775 | 644.445 | 585.000 | 165.000 | 165.000 | 215.000 | 175.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 39,76% | 47,28% | 54,43% | 27,99% | 12,17% | 19,30% | 63,46% | 69,35% | 64,81% |
| DIS2.1 Pressioni insufficienti | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| DIS2.2 Pressioni eccessive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| DIS3.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori di utenza | 121.184 | 111.037 | 459.765 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| ID Criticità | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 3,89% | 3,22% | 10,99% | 1,30% | 0,62% | 2,34% | 7,69% | 6,45% | 7,41% |
| EFF1.1 Margini di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di acquedotto (approvvigionamento, potabilizzazione, distribuzione) | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EFF2.1 Necessità di sviluppo di una pianificazione degli interventi di manutenzione e di sostituzione periodica degli asset | 19.979 | 0 | 14.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,64% | 0,00% | 0,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EFF3.1 Criticità nella sicurezza delle condizioni di lavoro | 31.023 | 16.677 | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 1,00% | 0,48% | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EFF4.2 Mancanza di sistemi di recupero energetico in adduzione e/o in distribuzione (laddove fattibili) | 97.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 3,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento in agglomerati inferiori ai 2.000 A.E. | 47.713 | 90.246 | 22.130 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 1,53% | 2,62% | 0,53% | 0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FOG2.1 Inadeguate condizioni delle condotte fognarie, delle opere civili, | 746.106 | 790.953 | 595.392 | 250.000 | 280.612 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| ID Criticità | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti | | | | | | | | | |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 23,94% | 22,97% | 14,23% | 10,86% | 5,84% | 2,92% | 9,62% | 8,06% | 9,26% |
| FOG2.2 Elevate infiltrazioni di acque parassite | 0 | 10.500 | 90.096 | 100.000 | 64.404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,00% | 0,30% | 2,15% | 4,34% | 1,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| KNW2.1 Assenza o inadeguatezza del sistema digitale di archiviazione per le infrastrutture di acquedotto | 26.668 | 24.590 | 58.796 | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,86% | 0,71% | 1,41% | 1,74% | 0,83% | 2,34% | 7,69% | 6,45% | 7,41% |
| POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, di monitoraggio, dei trattamenti | 18.430 | 68.415 | 65.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,59% | 1,99% | 1,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| UTZ1.1 Inadeguatezza del sistema di lettura e fatturazione | 10.440 | 0 | 40.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,34% | 0,00% | 0,98% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| UTZ2.1 Inadeguatezza del servizio di assistenza all'utenza (es. call center, pronto intervento, sportelli e trattamento dei reclami) | 15.841 | 15.409 | 0 | 20.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % di SPESA rispetto al TOTALE | 0,51% | 0,45% | 0,00% | 0,87% | 1,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 3.116.241 | 3.443.379 | 4.184.741 | 2.302.799 | 4.807.548 | 855.000 | 260.000 | 310.000 | 270.000 |

3.5.3 ACQ. VALTIGLIONE - ANALISI DELLE SPESE (CONSUNTIVO E PREVENTIVO) PREVISTE NEL PDI ANNI 2021-2029

Relativamente al PdI in esame, al fine di mettere in evidenza le aree oggetto di maggiori investimenti nel periodo 2021 – 2029 vengono di seguito riportati gli interventi raggruppati per criticità con la percentuale media (anni 2021-2029) delle spese (gli anni 2021 e 2022 sono indicati a consuntivo, il 2023 a pre consuntivo, mentre gli anni successivi sono a preventivo) elencati in base alla % di spesa.

| ID Criticità | % spesa distinta per criticità 2021 - 2029 |
|---|--|
| DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche) | 44,28% |
| DEP2.2 Estrema frammentazione del servizio di depurazione | 15,95% |
| FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie, delle opere civili, delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti | 11,97% |
| DIS3.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori di utenza | 4,88% |
| DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di trattamento | 4,29% |
| APP1.2 Inadeguatezza della qualità delle fonti di approvvigionamento | 4,02% |
| KNW2.1 Assenza o inadeguatezza del sistema digitale di archiviazione per le infrastrutture di acquedotto | 3,27% |
| DIS1.1 Assenza parziale o totale delle reti di distribuzione | 2,94% |
| DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, dei sistemi di monitoraggio, dei trattamenti di rimozione | 2,21% |
| APP2.1 Assenza parziale o totale delle reti di adduzione | 1,50% |
| APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di adduzione | 1,25% |
| FOG2.2 Elevate infiltrazioni di acque parassite | 0,90% |
| FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui in agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 A.E. | 0,57% |
| POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, di monitoraggio, dei trattamenti | 0,46% |

| ID Criticità | % spesa distinta per criticità 2021 - 2029 |
|---|--|
| EFF4.2 Mancanza di sistemi di recupero energetico in adduzione e/o in distribuzione (laddove fattibili) | 0,35% |
| DIS2.1 Pressioni insufficienti | 0,35% |
| UTZ2.1 Inadeguatezza del servizio di assistenza all'utenza (es. call center, pronto intervento, sportelli e trattamento dei reclami) | 0,32% |
| EFF3.1 Criticità nella sicurezza delle condizioni di lavoro | 0,17% |
| UTZ1.1 Inadeguatezza del sistema di lettura e fatturazione | 0,15% |
| EFF2.1 Necessità di sviluppo di una pianificazione degli interventi di manutenzione e di sostituzione periodica degli asset | 0,11% |
| APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti di approvvigionamento | 0,05% |
| EFF1.1 Margini di miglioramento dell'efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di acquedotto (approvvigionamento, potabilizzazione, distribuzione) | 0,00% |
| DEP3.3 Impatto negativo sul recapito finale | 0,00% |
| DIS2.2 Pressioni eccessive | 0,00% |
| | 100,00% |

3.5.4 ACQ. VALTIGLIONE - RIEPILOGO PDI ANNI 2021 – 2029

Si riportano di seguito i dati in € relativi al riepilogo PdI con i dati 2021-2029

| Riepilogo investimenti realizzati | UdM | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|-----------|-----------|-----------|
| Valore investimento annuo (lordo contributi) | euro | 3.116.241 | 3.443.379 | 4.184.741 |
| Entrate in esercizio al lordo contributi - da foglio "Pdl-cronoprogramma_investimenti" | euro | 2.366.387 | 3.202.589 | 3.926.935 |
| Contributi - da foglio "Pdl-cronoprogramma_investimenti" | euro | 1.238.517 | 1.159.003 | 995.470 |
| LIC dell'anno | euro | 759.991 | 960.997 | 811.038 |

Si riportano di seguito i dati in € relativi alle previsioni di spese per gli anni 2024 - 2029

| Riepilogo investimenti previsti | UdM | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Valore investimento annuo (lordo contributi)- da foglio "Pdl-cronoprogramma_investimenti" | euro | 4.807.548 | 855.000 | 260.000 | 310.000 | 270.000 |
| Entrata in esercizio al lordo dei contributi | euro | 4.277.548 | 855.000 | 260.000 | 310.000 | 270.000 |
| Valore investimento annuo (netto contributi) | euro | 4.807.548 | 855.000 | 260.000 | 310.000 | 270.000 |

Si riporta di seguito il Grafico che evidenzia gli interventi realizzati dagli anni 2012 al 2023 e gli interventi previsti nei prossimi anni (2024-2029).



3.5.5 PIANO OPERE STRATEGICHE

Il Gestore non ha proposto interventi nel Piano delle Opere Strategiche (POS).

4. Qualità Tecnica del servizio reso all'Utenza

4.1. INQUADRAMENTO GENERALE

Con deliberazione ARERA 27 dicembre 2017 n. 917 ad oggetto: "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)", l'Autorità ha previsto un procedimento per la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico al fine di garantire la diffusione, la fruibilità e la qualità del servizio idrico integrato all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale.

Con Deliberazione ARERA 637/2023/R/IDR è stata <u>aggiornata</u> la disciplina di Regolazione della Qualità Tecnica. In somma sintesi l'aggiornamento prevede:

- Un nuovo indicatore M0 "Resilienza idrica";
- Sono modificati i criteri di definizione degli obiettivi
- E' stato inserito l'obbligo di trasmettere i registri.

La regolazione della qualità tecnica definisce indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:

- a) *standard* specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
- b) *standard* generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
- c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli *standard* generali.

Per ciascuno dei macro-indicatori, gli obiettivi annuali sono divisi in due categorie: mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate.

L'Autorità valuta le *performance* dei gestori, attivando i meccanismi di premialità e penalità previsti dalla Delibera 917/17 finalizzati alla *sunshine regulation* di livello nazionale.

Per quanto attiene gli obblighi di monitoraggio, la Delibera 917 aggiornata con la Delibera 637/2023, al Titolo 8 prevede che:

- Ogni gestore ha l'obbligo di predisporre e mantenere aggiornato un registro separato per ognuno dei macro-indicatori M0, M1, M3, M4, M5 e M6, ed un registro unico per il macro-indicatore M2 e per gli standard specifici, S1, S2 e S3.
- Ogni anno l'Autorità può richiedere a un campione di gestori di fornire un estratto di uno o più registri.
- Il gestore ha l'obbligo di conservazione, in modo ordinato e accessibile, di tutti i dati registrati nonché dei dati comunicati ai sensi dei commi 30.2 e 30.3 per un periodo di 10 anni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la registrazione è effettuata.
- Entro il 30 aprile di ciascuna annualità e secondo le modalità operative stabilite da ARERA, l'Ente di governo dell'ambito deve trasmettere all'Autorità, per ciascun gestore, un archivio contenente:
- il file per la raccolta dati RQTI monitoraggio predisposto dall'Autorità, debitamente compilato;
- la Relazione di accompagnamento alla medesima raccolta dati, corredata dalla relativa validazione;
- la Dichiarazione di veridicità dei dati e di ottemperanza agli obblighi di cui al d.lgs 18/2023 siglata dal legale rappresentante del gestore;
- tutta la documentazione di supporto necessaria alla validazione, quali i registri tenuti ai sensi del Titolo 8 della RQTI, il file di riepilogo dei registri e gli altri documenti operativi (verbali di lettura, campioni di fatture all'utenza, verbali tecnici, eventuali ordinanze di non potabilità, certificati di analisi di laboratorio, eventuale piano dei controlli analitici, documenti di conformità relativi agli scaricatori di piena, registri di carico e scarico per i fanghi di depurazione, altro), come successivamente specificati dall'Autorità.

- Al fine di rafforzare l'attività di validazione dei dati trasmessi, a partire dalla raccolta dati da effettuarsi nell'annualità 2026 e successivamente a cadenze biennali, l'archivio di cui al precedente comma 1.3 dovrà essere verificato da un pool di Enti di governo dell'ambito, successivamente definito dall'Autorità, che include quello competente territorialmente per la gestione in considerazione. La mancata asseverazione, anche parziale, deve essere motivata e costituisce causa di esclusione dal meccanismo incentivante, per gli eventuali macro-indicatori interessati. In aggiunta alle motivazioni tecniche, anche la mancata trasmissione dei dati da parte del gestore con tempistiche tali da consentire le attività di validazione può costituire causa di esclusione dal medesimo meccanismo.
- A partire dall'anno 2024, gli obiettivi di qualità tecnica sono stabilmente valutati in maniera cumulativa su base biennale. Conseguentemente, ai fini dell'applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione), costituisce elemento di valutazione il livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno dispari per ciascuno dei macroindicatori applicati.
- L'Autorità intende confermare l'esclusione dalle premialità per le gestioni per cui non siano stati trasmessi gli atti di predisposizione tariffaria ai sensi del metodo tariffario pro tempore vigente.
- Il gestore ha l'obbligo di conservazione, in modo ordinato e accessibile, di tutti i dati registrati nonché dei dati comunicati per un periodo di 10 anni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la registrazione è effettuata.
- I gestori sono responsabili della veridicità delle informazioni fornite e della verificabilità delle registrazioni che hanno contribuito al calcolo degli indicatori.
- Per gli anni 2024 e successivi l'Autorità con Delibera 637/2023 ha modificato i livelli obiettivo che devono raggiungere i Gestori nell'erogazione del servizio rendendoli più ambiziosi e performanti.

Pertanto, già a partire dai dati tecnici 2024 (monitoraggio obiettivi 2026), i Gestori dovranno perseguire il raggiungimento dei nuovi obiettivi.

La raccolta dei dati di Qualità Tecnica 2024 ha avuto una doppia finalità in relazione agli aggiornamenti inseriti con la Delibera 637/2023:

- 1. Verificare il raggiungimento degli obiettivi per il biennio 2022-2023
- 2. Definire i nuovi obiettivi per il biennio 2024-2025 alla luce dei nuovi livelli stabiliti con la Delibera 637.

4.2. ATTIVITÀ SVOLTA

Come richiesto con Comunicato 9 febbraio 2024, gli Uffici Egato5 si sono attivati per la raccolta ed il caricamento sul portale ARERA entro il **30 aprile** di tutta la documentazione richiesta (prot. Egato5 123 del 23/01 e prot. Egato5 273 del 16/02).

Sui database pervenuti dai Gestori relativi ai dati di qualità anni 2022 e 2023 si sono eseguite le verifiche di completezza dei dati, di congruità con i dati storici e di rispetto degli obiettivi stabiliti con la precedente raccolta del 2022.

In particolare è stato necessario un approfondimento in merito al nuovo indicatore M0 di Resilienza Idrica che, seppur non valutato nel primo biennio di applicazione, ha implicato la definizione del livello base di partenza da cui saranno definiti i livelli di premialità/penalità per i bienni successivi.

La raccolta ha inoltre richiesto un controllo di completezza e congruità di massima in merito ai registri contenenti i dettagli dei dati tecnici, fonte dei dati aggregati riportati nel file RQTI.

A tale riguardo sono state indicate <u>scadenze precise</u> ai Gestori per la consegna della documentazione proprio per poter <u>completare l'istruttoria</u> e le verifiche, ma non tutti i Gestori hanno rispettato tali richieste. In questi casi sono stati effettuati controlli a campione ed è stata indicata ad ARERA nella relazione di accompagnamento tale modalità. In particolare Acquedotto Valtiglione, che è vincolata alla compilazione dei database da parte di IRETI, ha presentato la documentazione a ridosso della chiusura del portale ARERA (30 aprile), pertanto in tale caso l'attività istruttoria da parte degli uffici Egato5 non ha potuto essere completa ed approfondita.

L'ARERA ha facoltà, nei prossimi mesi, di effettuare ulteriori verifiche e richiedere integrazioni nell'ambito delle attività legate all'attribuzione di premialità e penalità.

In data 30 aprile è stato completato il caricamento dei dati sul portale ARERA rispettando la scadenza fissata per tutti i Gestori Ato5.

4.3. ESITO DEL MONITORAGGIO

Si riporta di seguito l'esito del monitoraggio per quanto attiene gli standard generali definiti con i macro indicatori da M1 a M6.

Si riassume di seguito il significato di ciascun macro indicatore.

Macro-indicatore M1 - "Perdite idriche" (cui è associato l'obiettivo di contenimento delle dispersioni, con efficace presidio dell'infrastruttura acquedottistica), definito tenendo congiuntamente conto sia delle perdite idriche lineari (individuate dal rapporto tra perdite idriche totali e lunghezza complessiva della rete di acquedotto), sia delle perdite percentuali (come rapporto tra perdite idriche totali e volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto);

Macro-indicatore M2 - "Interruzioni del servizio" (cui è associato l'obiettivo di mantenimento della continuità del servizio, anche attraverso una idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento), definito come rapporto tra la somma delle durate delle interruzioni annue (ciascuna pesata per il numero di utenti finali, anche indiretti, interessati dalla interruzione stessa) e il numero totale di utenti finali serviti dal gestore; l'applicazione del meccanismo di incentivazione è attiva a partire dall'anno 2020;

Macro-indicatore M3 - "Qualità dell'acqua erogata" (cui è associato l'obiettivo di una adeguata qualità della risorsa destinata al consumo umano), definito, secondo una logica multistadio, tenendo conto: i) dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità, attenuando l'obiettivo di assoluta assenza delle medesime; ii) del tasso di campioni da controlli interni non conformi; iii) del tasso di parametri da controlli interni non conformi;

Macro-indicatore M4 - "Adeguatezza del sistema fognario" (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue), definito - anch'esso secondo una logica multistadio - considerando: i) la frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura, attenuando l'obiettivo di assoluta assenza dei medesimi; ii) l'adeguatezza normativa degli scaricatori di piena; iii) il controllo degli scaricatori di piena;

Macro-indicatore M5 - "Smaltimento fanghi in discarica" (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi), definito come rapporto tra la quota dei fanghi di depurazione misurata in sostanza secca smaltita in discarica e la quantità di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca complessivamente prodotta;

Macro-indicatore M6 - "Qualità dell'acqua depurata" (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea acque), definito come tasso di superamento dei limiti dei campioni di acqua reflua scaricata;

Per quanto attiene gli standard specifici di qualità tecnica tutti i Gestori hanno comunicato interruzioni e tempistiche inferiori a quelle definite in Tabella 1 garantendo pertanto adeguata continuità di servizio.

1. Tavola 1 - Standard specifici di continuità del servizio di acquedotto

| ID | Indicatore | Standard specifico |
|----|--|--------------------|
| S1 | Durata massima della singola sospensione programmata | 24 ore |
| S2 | Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile | 48 ore |
| S3 | Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura | 48 ore |

Vi sono infine alcuni prerequisiti validati che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali.

Tali prerequisiti riguardano sostanzialmente la completezza e l'attendibilità dei dati forniti e l'assenza di procedure di infrazione in corso da parte dell'Unione Europea.

Si riporta di seguito uno specchietto riassuntivo delle performance dei Gestori per l'anno 2023 e il raggiungimento degli obiettivi.

Raggiungimento obiettivi anno 2023

| ASP | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
|--------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Obiettivo | Α | Α | Α | Α | Α | Α |
| Consuntivo 2023 | Α | Α | Α | E | Α | Α |
| Raggiungimento obiettivo | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| | | | | | | |
| CCAM | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| Obiettivo | Α | Α | Α | Α | Α | Α |
| Consuntivo 2023 | Α | А | Α | Α | А | Α |
| Raggiungimento obiettivo | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | | | | | | |
| Acquedotto Piana | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| Obiettivo | В | Α | Α | Α | Α | Α |
| Consuntivo 2023 | В | Α | Α | Α | Α | Α |
| Raggiungimento obiettivo | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | | | | | | |
| Acquedotto Valtiglione | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| Obiettivo | D | Α | Α | E | Α | Α |
| Consuntivo 2023 | D | Α | Α | E | Α | Α |
| Raggiungimento obiettivo | No | Si | Si | No | Si | Si |

Le celle in colore verde rappresentano il raggiungimento di classe A.

Le celle in colore giallo rappresentano il raggiungimento dell'obiettivo con classe inferiore ad A.

Le celle in colore arancio rappresentano il mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto.

Si riporta di seguito lo schema riassuntivo dell'andamento di ciascun macro indicatore per ogni Gestore calcolato sulla base dei dati consuntivi 2022 e 2023 in relazione agli obiettivi fissati con la precedente raccolta dati 2022.

4.3.1 MACRO-INDICATORI PER CIASCUN GESTORE

Per ASP tutti gli obiettivi 2022 e 2023 sono stati raggiunti tranne per l'indicatore M4. Il Gestore è in classe A per tutti gli indicatori tranne M4 (classe E).

Come già condiviso con ANEA l'indicatore M4 è soggetto ad estrema volatilità in relazione agli eventi meteorici dell'anno.

Il mancato raggiungimento del livello obiettivo classe A si era già verificato nella raccolta dati del biennio 2018-2019.

ASP

| | Macro-indicatore | Valori per definizione obiettivo 2022 | Definizione obiettivo 2023 | Valori 2022 consuntivi | Valori 2023 consuntivi |
|----|--|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Presenza prerequisito Preq1 | S | | S | B |
| | Presenza prerequisito Preq4 _{M1} | Adeguato | | Adeguato | Adeguato |
| M1 | M1a | 5,31 | 5,31 | 4,23 | 3,99 |
| | M1b | 18,31% | 18,31% | 14,56% | 14,85% |
| _ | Classe | Α | Α | Α | Α |
| | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | SI |
| | Presenza prerequisito Preq4 _{M2} | Adeguato | | | Adeguato |
| M2 | M2 | 0,03 | 0,03 | 0,72 | 0,27 |
| | Classe | Α | A | Α | Α |
| | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | SI |
| | Presenza prerequisito Preq2 | а | | S | <u>a</u> |
| | Presenza prerequisito Preq4 _{M3} | Adeguato | | Adeguato | Adeguato |
| | МЗа | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| M3 | M3b | 0,00% | | 0,00% | 0,00% |
| | M3c | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| | Classe | A | A | A | A |
| | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | Si |
| | Presenza prerequisitoPreq3 _{M4} | а | | S | B |
| | Presenza prerequisito Preq4 _{M4} | Adeguato | | Adeguato | Adeguato |
| | M4a | 0,86 | 0,86 | 2,57 | 2,57 |
| M4 | M4b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | M4c | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| _ | Classe | Α | Α | E | E |
| | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | NO |
| | Presenza prerequisitoPreq3 _{M5} | а | | Я | 9 |
| | Presenza prerequisito Preq4 _{M5} | Adeguato | | Adeguato | Adeguato |
| | $MF_{tq,disc}$ ($\sum MF_{tq,disc,imp}$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M5 | %SS _{tot} | 28,0% | | 25,2% | 25,9% |
| | M5 | 0,00% | | 0,00% | 0,00% |
| | Classe | A | A | Α | Α |
| | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | SI |
| | Presenza prerequisitoPreq3 _{M6} | S | | Я | g |
| | Presenza prerequisito Preq4 _{M6} | Adeguato | | Adeguato | Adeguato |
| M6 | M6 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Classe | A | A | A | A |
| | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | SI |

CCAM

Per CCAM tutti gli obiettivi 2022 e 2023 sono stati raggiunti.

Tutti gli indicatori sono in classe A.

Per quanto attiene l'indicatore M1 il Gestore ha segnalato come tale indicatore sia legato ai prelievi dall'interconnessione acquedottistica che costituiscono indicato la labilità di tale ottimo risultato in relazione alla conformazione collinare della struttura acquedottistica.

Per quanto attiene l'indicatore M4, il Gestore ha precisato che il numero di episodi di allagamento da fognatura mista che hanno determinato situazioni di disagio negli anni si sono ridotti, soprattutto perché il Consorzio ha continuato ad effettuare sempre più interventi puntuali di manutenzione reti (specialmente nei punti di maggiore criticità). Ha altresì provveduto ad aumentare la lunghezza della rete fognaria soggetta ad ispezione (rispetto agli anni antecedenti il 2020) cercando così di prevenire future problematiche ed in ultimo, ma non per questo trascurabile, negli ultimi periodi gli episodi metereologici avversi come nubifragi e le così dette "bombe d'acqua" a cui sono sottoposte le condotte fognarie miste (situazioni che provocano inevitabilmente sovrappressioni delle condotte stesse derivanti da un afflusso incontrollato e non sostenibile di acqua di tipo meteorico che causano il deterioramento delle stesse fognature con conseguenti rotture e successivi sversamenti) sono fortunatamente diminuiti nel territorio gestito.

CCAM

| CCAIVI | | | | | |
|--------|---|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Macro-indicatore | Valori per definizione obiettivo 2022 | Definizione obiettivo 2023 | Valori 2022 consuntivi | Valori 2023 consuntivi |
| | Presenza prerequisito Preq1 | S | | SI | 9 |
| | Presenza prerequisito Preq4 _M | Adeguato | | Adeguato | Adeguato |
| 200 | M1a | 3,90 | 3,90 | 3,68 | 3,67 |
| M1 | M1b | 24,81% | · · | 23,16% | 24,68% |
| | Classe | A | A | Α | A |
| | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | SI |
| | Presenza prerequisito Preq4 _{M2} | Adeguato | | | Adeguato |
| M2 | M2 | 1,67 | 1,67 | 1,44 | 1,22 |
| IVIZ | Classe | Α | Α | Α | Α |
| | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | SI |
| | Presenza prerequisito Preq2 | B | | S | a |
| | Presenza prerequisito Preq4 _{M3} | Adeguato | | Adeguato | Adeguato |
| | МЗа | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| M3 | M3b | 0,15% | 0,15% | 0,00% | 0,00% |
| | МЗс | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| | Classe | Α | Α | Α | Α |
| | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | SI |
| | Presenza prerequisitoPreq3 _{M4} | а | | SI | SI |
| | Presenza prerequisito Preq4 _{M4} | Adeguato | | Adeguato | Adeguato |
| | M4a | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,90 |
| M4 | M4b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | M4c | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Classe | Α | Α | A | Α |
| | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | SI |
| | Presenza prerequisitoPreq3 _{M5} | a | | SI | a |
| | Presenza prerequisito Preq4 _{M5} | Adeguato | | Adeguato | Adeguato |
| | MF _{tq,disc} (∑MF _{tq,disc,imp}) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M5 | %SS _{tot} | 3,0% | | 3,3% | 3,0% |
| | M5 | 0,00% | | 0,00% | 0,00% |
| | Classe | A | A | Α | A |
| | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | SI |
| | Presenza prerequisitoPreq3 _{M6} | SI | | SI | В |
| | Presenza prerequisito Preq4 _{M6} | Adeguato | | Adeguato | Adeguato |
| M6 | M6 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Classe | A | Α | Α | Α |
| | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | Q |

ACQUEDOTTO PIANA

Per **Acquedotto della Piana** la classe A, è raggiunta per tutti gli indicatori ad esclusione dell'indicatore M1 (progredita da classe C al 2020, a classe B nel 2021).

Tutti gli obiettivi fissati con il monitoraggio 2020-2021 sono stati raggiunti.

ACQUEDOTTO DELLA PIANA

| | | Volori por | | | |
|------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| | Miles and Should and and | Valori per | Definizione | Valori 2022 | Valori 2023 |
| | Macro-indicatore | definizione | obiettivo 2023 | consuntivi | consuntivi |
| | | obiettivo 2022 | | | |
| | Presenza prerequisito Preq1 | SI | | B | g |
| | Presenza prerequisito Preq4M1 | Adeguato | | Adeguato | Adeguato |
| M1 | M1a | 4,26 | 4,17 | 4,12 | 3,78 |
| | M1b | 34,57% | 33,88% | 34,41% | 32,54% |
| | Classe | В | В | В | В |
| | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | SI |
| | Presenza prerequisito Preq4M2 | Adeguato | | | Adeguato |
| M2 | M2 | 0,89 | 0,89 | 1,21 | 1,53 |
| IVIZ | Classe | Α | Α | Α | Α |
| | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | SI |
| | Presenza prerequisito Preq2 | SI | | В | a |
| | Presenza prerequisito Preq4M3 | Adeguato | | Adeguato | Adeguato |
| | M3a | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| M3 | M3b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | M3c | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| | Classe | Α | Α | Α | Α |
| | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | SI |
| | Presenza prerequisitoPreq3M4 | SI | | В | В |
| | Presenza prerequisito Preq4M4 | Adeguato | | Adeguato | Adeguato |
| | M4a | 2,07 | 1,86 | 0,00 | 0,67 |
| M4 | M4b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | M4c | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Classe | E | E | Α | Α |
| | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | SI |
| | Presenza prerequisitoPreq3M5 | З | | В | В |
| | Presenza prerequisito Preq4M5 | Adeguato | | Adeguato | Adeguato |
| | MFtq,disc (∑MFtq,disc,imp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M5 | %SStot | 18,6% | | 6,3% | 6,0% |
| | M5 | 0,00% | | 0,00% | 0,00% |
| | Classe | Α | A | A | Α |
| | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | SI |
| | Presenza prerequisitoPreq3M6 | S | | S | а |
| | Presenza prerequisito Preq4M6 | Adeguato | | Adeguato | Adeguato |
| M6 | M6 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Classe | A | A | A | A |
| | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | SI |
| | . 333 | | | | <u> </u> |

ACQUEDOTTO VALTIGLIONE

Per **Acquedotto Valtiglione**, analogamente alla precedente raccolta dati, si è riscontrato il raggiungimento della classe A per gli indicatori M2, M3, M5 e M6.

Per quanto riguarda M1 l'indicatore è in classe D pur con un peggioramento di performance che hanno determinato il non raggiungimento dell'obiettivo.

L'indicatore M4 è rimasto in classe E nonostante un miglioramento in classe B nel 2020. Tale indicatore è fortemente influenzato dall'andamento meteorico che determina eventuali puntuali allagamenti in caso di fognature di tipo misto.

Per quanto riguarda l'indicatore M2 essendo il Gestore in classe A deve mantenere la classe, pertanto con indicatore inferiore a 6 la classe è mantenuta. L'obiettivo è pertanto raggiunto nonostante una diminuzione della performance.

ACQUEDOTTO VALTIGLIONE

| | Macro-indicatore | Valori per definizione obiettivo 2022 | Definizione obiettivo 2023 | Valori 2022 consuntivi | Valori 2023 consuntivi |
|------|-------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Presenza prerequisito Preq1 | SI | | SI | S |
| | Presenza prerequisito Preq4M1 | Adeguato | | Adeguato | Adeguato |
| M1 | M1a | 6,33 | 6,02 | 7,52 | 6,92 |
| IVII | M1b | 48,90% | 46,45% | 52,41% | 50,39% |
| | Classe | D | D | D | D |
| | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | NO |
| | Presenza prerequisito Preq4M2 | Adeguato | | | Adeguato |
| M2 | M2 | 1,13 | 1,13 | 3,81 | 3,12 |
| IVIZ | Classe | Α | Α | Α | Δ |
| | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | SI |
| | Presenza prerequisito Preq2 | a | | SI | 9 |
| | Presenza prerequisito Preq4M3 | Adeguato | | Adeguato | Adeguato |
| | МЗа | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| M3 | МЗЬ | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,16% |
| | МЗс | 0,031% | 0,031% | 0,033% | 0,009% |
| | Classe | Α | Α | Α | Δ |
| | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | SI |
| | Presenza prerequisitoPreq3M4 | a | | a | Я |
| | Presenza prerequisito Preq4M4 | Adeguato | | Adeguato | Adeguato |
| | M4a | 1,93 | 1,74 | 3,08 | 2,36 |
| M4 | M4b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | M4c | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Classe | E | E | E | E |
| | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | NO |
| | Presenza prerequisitoPreq3M5 | a | | a | S |
| | Presenza prerequisito Preq4M5 | Adeguato | | Adeguato | Adeguato |
| | MFtq,disc (∑MFtq,disc,imp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M5 | %SStot | 21,6% | | 20,5% | 17,9% |
| | M 5 | 0,00% | | 0,00% | 0,00% |
| | Classe | Α | Α | Α | Δ |
| | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | SI |
| | Presenza prerequisitoPreq3M6 | SI | | SI | S |
| | Presenza prerequisito Preq4M6 | Adeguato | | Adeguato | Adeguato |
| M6 | M6 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Classe | Α | A | Α | Δ |
| | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | - |

4.4. NUOVI OBIETTIVI 2024-2025

Con Delibera 637/23 l'Autorità ha ritenuto opportuno definire l'aggiornamento della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, definendo nuovi livelli obiettivo, nell'ambito del quale provvedere a:

- potenziare il meccanismo di regolazione della qualità tecnica vigente, sia con riferimento alla definizione delle classi e degli obiettivi di miglioramento e mantenimento in capo agli operatori, sia con riferimento al meccanismo incentivante, nell'ottica di assicurare una maggiore spinta al raggiungimento dei richiamati obiettivi.
- integrare il *set* di indicatori di qualità tecnica in vigore con ulteriori *standard* tesi ad assicurare la garanzia e la sicurezza delle fonti di approvvigionamento e delle infrastrutture ad esse connesse. E' stato pertanto introdotto un nuovo macro-indicatore denominato "M0 Resilienza idrica", volto a monitorare l'efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio gestito, includendo anche gli usi diversi dal civile. E' prevista una prima fase di misurazione e monitoraggio delle grandezze preposte alla costruzione dell'indicatore, proponendo di rinviare al 2026 l'applicazione dei meccanismi premiali su tale indicatore.
- tenere conto delle più recenti novità legislative in materia di qualità dell'acqua erogata a fini idropotabili, di gestione delle acque reflue urbane e di riutilizzo delle acque reflue depurate;
- uniformare il numero di classi individuate per tutti i macro-indicatori, di fatto andando ad incrementare il numero attuale di classi previste per i macro-indicatori M2, M5 e M6;
- introdurre una nuova soglia entro cui valutare l'indicatore M1b ai fini dell'accesso alla classe A del macro-indicatore M1 sulle Perdite idriche e di soglie esplicite per gli indicatori prestazionali relativi alla quota dei volumi misurati (*G*1.1*ut* e *G*1.1*proc*);
- rimodulare gli obiettivi e le soglie per il macro-indicatore M3 sulla Qualità dell'acqua erogata, anche alla luce delle novità introdotte con il decreto legislativo 18/2023;
- rivedere gli indicatori semplici M4b e M4c, passando dal riferimento alla numerosità assoluta degli scaricatori ad un riferimento relativo all'area territoriale servita, nonché di definire, per il solo indicatore M4b, un livello di conformità standardizzato e uniforme a livello nazionale;
- riformulare il macro-indicatore M6 sulla Qualità dell'acqua depurata, con lo scopo di giungere ad una valutazione di tutti i gestori sulla base di una metrica più uniforme;

E' stato fissato un tetto massimo alle premialità complessive da attribuire a ciascuna gestione, pari al 15% del Vincolo ai Ricavi del Gestore.

E' stata definita una nuova distribuzione dei pesi per macro-indicatore.

Tavola 10ter - Pesi per macro-indicatore a decorrere dal biennio di valutazione 2024-202586

| Macro- indicatori | λ_m (%) |
|----------------------|-----------------|
| M0 | 5,1% |
| M1 | 28,9% |
| M2 | 13,3% |
| M3 | 9,7% |
| M4 | 15,2% |
| M5 | 8,9% |
| M6 | 18,9% |

Per quanto attiene M0 ARERA ha ritenuto opportuno fissare, cautelativamente, un peso relativamente contenuto, da adottare nel primo periodo di applicazione del meccanismo incentivante. L'Autorità non è ancora giunta ad una formulazione definitiva del medesimo indicatore, rimandando a futuri provvedimenti la fissazione di nuove eventuali attribuzioni ai pesi.

ARERA ha altresì inserito per le successive valutazioni premiali una forma di condivisione/revisione delle modalità di verifica da parte di una pluralità di EGA, in modo da poter beneficiare di esperienze diverse e condividere buone pratiche e per rafforzare i profili di comparabilità (yardstick).

4.4.1 MACRO-INDICATORI M1 - M6

Si riporta di seguito l'esito della nuova attribuzione obiettivi per il biennio 2024-2025.

ASP

Gli obiettivi per il biennio 24-25 prevedono principalmente il mantenimento del livello attuale di servizio, ad esclusione del parametro M4 che è particolarmente vincolato alle discontinuità meteorologiche.

| Macro-indicatore | | Valori per definizione | Definizione obiettivo |
|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| | iviaci 0-il idicatore | obiettivo 2024 | 2025 |
| | M1a | 3,99 | 3,99 |
| M1 | M1b | 14,85% | 14,85% |
| IVII | Classe | A | Α |
| | Obiettivo RQTI | Mantenimento | Mantenimento |
| | M2 | 0,27 | 0,27 |
| M2 | Classe | A | Α |
| | Obiettivo RQTI | Mantenimento | Mantenimento |
| | МЗа | 0,0000% | 0,0000% |
| | M3b | 0,00% | 0,00% |
| M3 | МЗс | 0,000% | |
| | Classe | A | Α |
| | Obiettivo RQTI | Mantenimento | Mantenimento |
| | M4a | 2,57 | |
| | M4b | 0,00% | 0,00% |
| M4 | M4c | 0,00% | 0,00% |
| | Classe | В | В |
| | Obiettivo RQTI | -5% di M4c | -5%di M4c |
| | MFtq,disc (∑MFtq,disc,imp) | 0,00 | 0,00 |
| | %SStot | 25,9% | |
| M5 | M5 | 0,00% | |
| | Classe | A | Α |
| | Obiettivo RQTI | Mantenimento | Mantenimento |
| | M6 | 0,00% | 0,00% |
| M6 | Classe | A | A |
| | Obiettivo RQTI | Mantenimento | Mantenimento |

CCAM

Per CCAM gli obiettivi con i nuovi parametri fissati dalla Delibera 637 prevedono il raggiungimento di Classe B per M1 e M2.

| Maaya indicatoya | | Valori per definizione | Definizione obiettivo |
|------------------|---|---|------------------------------------|
| | Macro-indicatore | obiettivo 2024 | 2025 |
| | M1a | 3,67 | 3,60 |
| | M1b | 24,68% | 24,18% |
| M1 | Classe | В | В |
| | Obiettivo RQTI | -2%di M1a | -2%di M1a |
| | Valore obiettivo M1a | 3,60 | 3,53 |
| | M2 | 1,22 | 1,20 |
| M2 | Classe | В | В |
| IVIZ | Obiettivo RQTI | -2%di M2 | -2%di M2 |
| | Valore obiettivo M2 | 1,2 | 1,17 |
| | M3a | 0,00% | 0,00% |
| | M3b | 0,00% | 0,00% |
| M3 | МЗс | 0 | |
| | Classe | A | Α |
| | Obiettivo RQTI | Mantenimento | Mantenimento |
| | M4a | | |
| | IVI 4 a | 0,90 | |
| | M4b | 0,90 | 0,00% |
| M4 | - | | 0,00% |
| M4 | M4b | 0,00% | 0,00% A |
| M4 | M4b M4c | 0,00% | 0,00% A Mantenimento |
| M4 | M4b M4c Classe | 0,00% 0 A | A |
| M4 | M4b M4c Classe Obiettivo RQTI | 0,00% 0 A Mantenimento | A Mantenimento |
| M4 M5 | M4b M4c Classe Obiettivo RQTI MFtq,disc (∑MFtq,disc,imp) | 0,00% 0 A Mantenimento 0,00% | A Mantenimento |
| | M4b M4c Classe Obiettivo RQTI MFtq,disc (∑MFtq,disc,imp) %SStot | 0,00% 0 A Mantenimento 0,00% 3% | A Mantenimento |
| | M4b M4c Classe Obiettivo RQTI MFtq,disc (∑MFtq,disc,imp) %SStot M5 | 0,00% 0 A Mantenimento 0,00% 3% | A Mantenimento |
| | M4b M4c Classe Obiettivo RQTI MFtq,disc (∑MFtq,disc,imp) %SStot M5 Classe | 0,00% A Mantenimento 0,00% 3% 0,00% A | A Mantenimento 0,00% |
| | M4b M4c Classe Obiettivo RQTI MFtq,disc (∑MFtq,disc,imp) %SStot M5 Classe Obiettivo RQTI | 0,00% A Mantenimento 0,00% 3% 0,00% A Mantenimento | Mantenimento 0,00% A Mantenimento |

ACQUEDOTTO DELLA PIANA

Per Acquedotto della Piana gli obiettivi con i nuovi parametri fissati dalla Delibera 637 prevedono il raggiungimento di Classe B per M1 e M2 e M6.

| | Macro-indicatore | Valori per definizione obiettivo 2024 | Definizione obiettivo 2025 |
|------|----------------------------|--|----------------------------|
| | M1a | 3,78 | 3,70 |
| | M1b | 32,54% | 31,89% |
| M1 | Classe | В | В |
| | Obiettivo RQTI | -2%di M1a | -2%di M1a |
| | Valore obiettivo M1a | 3,70 | 3,63 |
| | M2 | 1,53 | 1,50 |
| M2 | Classe | В | В |
| IVIZ | Obiettivo RQTI | -2%di M2 | -2%di M2 |
| | Valore obiettivo M2 | 1,5 | 1,47 |
| | МЗа | 0,00% | 0,00% |
| | M3b | 0,00% | 0,00% |
| M3 | МЗс | 0 | |
| | Classe | A | Α |
| | Obiettivo RQTI | Mantenimento | Mantenimento |
| | M4a | 0,67 | |
| | M4b | 0,00% | 0,00% |
| M4 | M4c | 0,00% | |
| | Classe | Α | A |
| | Obiettivo RQTI | Mantenimento | Mantenimento |
| | MFtq,disc (∑MFtq,disc,imp) | 0,00% | 0,00% |
| | %SStot | 6% | |
| M5 | M5 | 0,00% | |
| | Classe | Α | Α |
| | Obiettivo RQTI | Mantenimento | Mantenimento |
| | M6 | 3,39% | 3,19% |
| | IVIO | | |
| Me | Classe | В | В |
| M6 | | -6%di M6 | Mantenimento |

ACQUEDOTTO VALTIGLIONE

Per Acquedotto Valtiglione gli obiettivi con i nuovi parametri fissati dalla Delibera 637 prevedono il raggiungimento di Classe D per M1, B per M2 e M4.

| | Macro-indicatore | Valori per definizione obiettivo 2024 | Definizione obiettivo 2025 |
|-------|--|--|----------------------------|
| | M1a | 6,92 | 6,57 |
| | M1b | 50,39% | 47,87% |
| M1 | Classe | D | D |
| | Obiettivo RQTI | -5% di M1a | -5%di M1a |
| | Valore obiettivo M1a | 6,57 | 6,24 |
| | M2 | 3,12 | 3,00 |
| M2 | Classe | С | В |
| 1712 | Obiettivo RQTI | -4% di M2 | -4% di M2 |
| | Valore obiettivo M2 | 3 | 2,94 |
| | МЗа | 0,00% | 0,00% |
| | M3b | 0,16% | 0,16% |
| M3 | МЗс | 0,009 | |
| | Classe | A | Α |
| | Obiettivo RQTI | Mantenimento | Mantenimento |
| | M4a | 2,36 | |
| | M4b | 0,00% | 0,00% |
| M4 | M4c | 0,00% | 0,00% |
| IVIET | Classe | В | В |
| | Obiettivo RQTI | -5% di M4c | -5%di M 4c |
| | Valore objettivo M4 | 0,00% | 0,00% |
| | Tailord distriction in i | 0,0070 | , |
| | MFtq,disc (∑MFtq,disc,imp) | 0,00% | 0,00% |
| | | · · | · |
| M5 | MFtq,disc (∑MFtq,disc,imp) | 0,00% | · |
| M5 | MFtq,disc (∑MFtq,disc,imp) %SStot | 0,00% | · |
| M5 | MFtq,disc (∑MFtq,disc,imp) %SStot M5 | 0,00% 17,9% 0,00% | · |
| M5 | MFtq,disc (∑MFtq,disc,imp) %SStot M5 Classe | 0,00% 17,9% 0,00% A | 0,00% A |
| M5 | MFtq,disc (∑MFtq,disc,imp) %SStot M5 Classe Obiettivo RQTI | 0,00% 17,9% 0,00% A Mantenimento | 0,00% A Mantenimento |

4.4.2 NUOVO MACRO-INDICATORE MO RESILIENZA IDRICA

Il macro-indicatore M0 Resilienza idrica è determinato dalla combinazione dei due sotto-indicatori M0a a livello di gestione e M0b a livello sovraordinato.

Di seguito le formule di calcolo:

M0a – Resilienza idrica a livello di gestione del servizio idrico integrato

M0a

$$=\frac{\sum_{mc}(consumi~SII,~incluse~perdite~di~rete)-\sum_{mc}(volumi~esportati)}{\sum_{mc}(falda+invasi+corpi~idrici~superficiali+dissalazione+riuso)+\sum_{mc}(volumi~importati)}$$

M0b - Resilienza idrica a livello sovraordinato

$$M0b = \frac{\sum_{mc}(consumi\;acqua\;potabile + consumi\;irrigui + consumi\;industriali + altri\;consumi) - \sum_{mc}(volumi\;esportati)}{\sum_{mc}(falda + invasi + corpi\;idrici\;superficiali + dissalazione + riuso) + \sum_{mc}(volumi\;importati)}$$

Gli obiettivi annui associati al detto macro-indicatore sono espressi in termini di incremento della disponibilità idrica del gestore, che, nelle more di ulteriori affinamenti, è definita come:

DISP = (concessioni di derivazione SII + quote di concessioni di terzi + riuso + |interconnessioni|)

Tavola 1.bis - Classi di appartenenza per il macro-indicatore M0

| N. | Indicatore | Categoria tariffaria | ID Classe | Classe | Obiettivi | | | |
|----|--------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|---|---|----------------------|---|
| | Resilienza idrica [%] | RES | A | M0a<0,4 M0b≤0,7 | mantenimento | | | |
| | | | | | | В | 0,4≤M0a<0,5 M0b≤1 | +0,2% annuo della disponibilità idrica (<i>DISP</i>) |
| M0 | | | С | 0,5≤M0a<0,7 M0b≤1 | +0,5% annuo della disponibilità idrica (DISP) | | | |
| | | | D | 0,7≤M0a<0,95 M0b≤1 | +0,7% annuo della disponibilità idrica (<i>DISP</i>) | | | |
| | | | E | M0a≥0,95 | +1% annuo della disponibilità idrica (DISP) | | | |

In considerazione del fatto che alcune delle grandezze sottese alla costruzione del macroindicatore M0 non sono ad oggi rilevate o stimate, ARERA ha rinviato l'applicazione dei meccanismi di incentivazione dei livelli di al biennio di valutazione 2026-2027, fermi restando gli obblighi di rilevazione. Relativamente alla Disponibilità Idrica Egato5 ha promosso un incontro con i Gestori e trasmesso una bozza di documento per la definizione congiunta dei valori per il calcolo di M0a (prot. Egato5 n. 358 del 27/02/2024).

E' stato richiesto ai Gestori di operare un approfondimento sulle reali disponibilità idriche al fine del corretto calcolo dell'indicatore M0a.

Non sono stati forniti riscontri per la definizione della disponibilità idrica.

Egato ha pertanto proceduto a richiedere alla Provincia di Asti, con nota Prot. 625 del 15/04/2024, una indicazione in merito ai dati di volume annuo prelevabile dalla falda di Valle Maggiore di Cantarana.

Con nota prot. 648 del 18/04/2024 Provincia di Asti ha indicato i volumi per la definizione di M0a relativamente ai prelievi in Valle Maggiore di Cantarana.

L'obiettivo dell'Autorità, posto anche attraverso il sistema incentivante di premialità/penalità della qualità tecnica RQTI, è quello di spingere i Gestori (e l'Ente d'Ambito attraverso l'attività di programmazione) a:

- Diminuire il numeratore => lavoro di riduzione delle perdite;
- Aumentare il denominatore => ricerca di nuove fonti di approvvigionamento potenziamento delle interconnessioni con sistemi aventi una situazione di disponibilità della risorsa favorevole/ottimale.

Come si evince dalla formula di calcolo dell'indicatore M0a, al denominatore occorre indicare le disponibilità idriche che si possono individuare nelle concessioni a derivare (fatti salvi i casi in cui, per una specifica fonte idrica, i volumi effettivamente disponibili siano inferiori).

Per la valorizzazione della resilienza idrica a livello sovraordinato (indicatore M0b) si è fatto riferimento a quanto indicato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con relazione Prot 580 del 9/04/2024 da cui emerge al Capitolo 3 un valore medio d'Ambito tra 0.3 e 0.4 e si assume pertanto valore 0.35 per tutti i Gestori Egato5.

In prima applicazione il valore M0b indicato da Acquedotto Valtiglione è 1,33 che sarà corretto in sede delle successive valutazioni.

Per quanto attiene i prelievi indicati al denominatore dell'indicatore M0a la Provincia di Asti ha, nel mese di luglio 2024, ridefinito le portate di concessione all'emungimento dei principali pozzi della Provincia di Asti.

Pertanto tale valore sarà aggiornato nelle future rendicontazioni del valore di M0a per 3 dei Gestori Egato5.

Si riportano, di seguito, i valori dell'indicatore M0 per i 4 gestori Ato5.

ASP

| | Macro-indicatore | Valori per definizione obiettivo 2024 | Definizione obiettivo 2025 |
|------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | M0a | 0,46 | |
| | M0b | 0,35 | |
| MO | DISP | 10.111.487 | 10.131.710 |
| IVIO | Classe | В | В |
| | Obiettivo RQTI | +0,2% di DISP | +0,2%di DISP |
| | Valore obiettivo DISP | 10.131.710 | 10.151.973 |

CCAM

| | Macro-indicatore | Valori per definizione obiettivo 2024 | Definizione obiettivo 2025 |
|----|------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | M0a | 0,36 | |
| | M0b | 0,35 | |
| MO | DISP | 29.989.176 | 29.989.176 |
| | Classe | Α | Α |
| | Obiettivo RQTI | Mantenimento | Mantenimento |

ACQUEDOTTO PIANA

| | Macro-indicatore | Valori per definizione obiettivo 2024 | Definizione obiettivo 2025 |
|------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | M0a | 0,61 | |
| | M0b | 0,35 | |
| MO | DISP | 5.764.140 | 5.792.961 |
| IVIO | Classe | С | С |
| | Obiettivo RQTI | +0,5% di DISP | +0,5% di DISP |
| | Valore obiettivo DISP | 5.792.961 | 5.821.926 |

ACQUEDOTTO VALTIGLIONE

| | Macro-indicatore | Valori per definizione obiettivo 2024 | Definizione obiettivo 2025 |
|------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | M0a | 0,85 | |
| | M0b | 1,33 | |
| MO | DISP | 5.476.308 | 5.531.071 |
| IVIO | Classe | E | E |
| | Obiettivo RQTI | +1%di DISP | +1%di DISP |
| | Valore obiettivo DISP | 5.531.071 | 5.586.382 |

4.5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE SULLA QUALITÀ TECNICA DEI GESTORI ATO5

Si segnala che per ciascun Gestore è stata determinante la collaborazione a fornire approfondimenti e integrazioni all'EGA per la definizione della documentazione definitiva che è stata caricata sul portale entro il termine previsto del 30/04.

Si segnala che il ritardo nella trasmissione della documentazione da parte di alcuni Gestori rispetto alle tempistiche indicate da Egato5 ha determinato una validazione dei dati non omogenea tra Gestori che tuttavia non ha impedito il caricamento entro le tempistiche indicate da ARERA.

In termini generali possiamo dire che il continuo monitoraggio dei dati della qualità tecnica genera una positiva attenzione del Gestore verso gli indici di performance e richiede, quindi, agli stessi Gestori di strutturarsi in modo sempre più informatizzato per gestire la raccolta delle informazioni e la tenuta dei registri.

Si riporta di seguito uno specchietto riassuntivo delle performance dei Gestori per l'anno 2023.

| | MACROINDICATORI ANNO 2023 | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|-------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | M1 | M1 M2 M3 M4 M5 M6 | | | | | | | | |
| ASP | Α | Α | Α | E | Α | Α | | | | |
| CCAM | Α | Α | Α | Α | Α | Α | | | | |
| Piana | В | Α | Α | Α | Α | Α | | | | |
| Valtiglione | D | Α | Α | Е | Α | Α | | | | |

Macroindicatori di Qualità tecnica – Classe 2023

Le celle in colore verde rappresentano il raggiungimento di classe A.

Le celle in colore giallo rappresentano il raggiungimento dell'obiettivo con classe inferiore ad A. Le celle in colore arancio rappresentano il mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto.

I risultati complessivamente raggiunti sono in linea con i risultati del biennio precedente.

Per quanto attiene l'indicatore M4 si evidenzia che, per i Gestori i cui scolmatori di piena sono autorizzati e monitorati l'indicatore dipende unicamente dagli eventi di allagamento verificatisi nell'anno.

Essendo tali eventi rapportati per ogni 100 km di rete il coefficiente risultante determina classe E per eventi superiori o uguali a 1/100 km e classe A per eventi inferiori a 1/100 km. Si riporta infine una tabella riassuntiva sul raggiungimento degli obiettivi previsti per l'anno di valutazione 2023.

In termini generali si evince il raggiungimento dell'obiettivo per la maggior parte dei macroindicatori, ad esclusione di M1 e M4.

L'esito del Monitoraggio di qualità tecnica fornisce in generale per tutti i Gestori l'indicazione di priorità degli interventi da inserire nel Piano degli interventi e nel Piano delle Opere Strategiche.

Si riporta di seguito lo specchietto riassuntivo dei nuovi obiettivi anno 2025 secondo la nuova classificazione determinata con la metodologia aggiornata con Deliberazione 637/23.

| | OBJETTIVO ANNO 2025 | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | M0 * M1 M2 M3 M4 M5 M6 | | | | | | | | | |
| ASP | В | Α | Α | Α | В | Α | Α | | | |
| CCAM | Α | В | В | Α | Α | Α | Α | | | |
| Piana | С | В | В | Α | Α | Α | В | | | |
| Valtiglione | E | D | В | Α | В | Α | Α | | | |

Macroindicatori di Qualità tecnica – Obiettivo 2025 M0* non valutato per l'anno 2025

Si riporta, infine, una tabella di raffronto tra le classi definite con i dati a consuntivo 2023 secondo le due metodologie:

- Delibera 917 prima delle modifiche apportate con la Delibera 637/23;
- Delibera 917 con le modifiche apportate con la Delibera 637/23.

Le nuove classi comportano l'attribuzione di livelli obiettivo aggiornati.

| | M1 | | M2 | | M3 | | M4 | | M5 | | M6 | |
|-------------|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|
| | Ante 637 | 637 |
| ASP | Α | Α | Α | Α | Α | Α | Е | В | Α | Α | Α | Α |
| CCAM | Α | В | Α | В | Α | Α | Α | Α | Α | Α | Α | Α |
| Piana | В | В | Α | В | Α | Α | Α | Α | Α | Α | В | В |
| Valtiglione | D | D | Α | В | Α | Α | Е | В | Α | Α | Α | Α |

Raffronto Macroindicatori ante Delibera 637 e metodologia attuale

<u>In sintesi</u>

- Per quanto attiene M1 è stata ristretta la classe A, favorendo lo slittamento in classe_B. Pertanto CCAM passa da classe A a classe B con obiettivo di riduzione del 2% di M1a annuo (perdite idriche lineari).
- Per M2 la classe A è passata da M2<6 ore di interruzione a M2<0.75 ore, favorendo lo slittamento in classe B. Pertanto CCAM, Acquedotto Piana, Acquedotto Valtiglione passano da classe A a classe B con obiettivo di riduzione del 2% annuo di M2 (ore di interruzione a utente interessato)
- Per M4 sono state ponderate le classi aumentando i casi di allagamento consentiti (da 1 a 5 ogni 100 km di rete) prima di accedere a classe E. L'obiettivo per la classe B è la riduzione del 5% di M4c (controllo degli scaricatori di piena) che per i Gestori sono già tutti controllati.
- Per M6 il tasso dei superamenti registrati da Acquedotto Piana ha portato l'obiettivo a scendere da A a B (indipendentemente dalle novità apportate dalla 637) con obiettivo di riduzione del 6% annuo del valore di M6.

Per quanto attiene M6 la Delibera 637 introduce particolare attenzione ai parametri fosforo e azoto per gli impianti superiori a 2.000 a.e. recapitanti in aree sensibili di cui il Piemonte fa parte.

In generale si rileva che la nuova metodologia di valutazione della qualità tecnica impone ai Gestori obiettivi più performanti nell'ottica di evoluzione del servizio idrico integrato verso standard più elevati all'utenza.

Per quanto attiene il meccanismo incentivante per il biennio 2022-2023 sarà presumibilmente definita nei primi mesi del 2025 la nuova graduatoria nazionale delle Premialità e Penalità da parte di ARERA.

4.6. Valutazione meccanismo incentivante sulla qualità tecnica ARERA - premialità/penalità

Il meccanismo incentivante di qualità tecnica del servizio idrico integrato tiene conto dello stato di efficienza conseguito, inteso come livello di maturità tecnologica e gestionale delle gestioni appartenenti ex ante alla fascia di mantenimento (classe A) per almeno un macro-indicatore, e della variazione di efficienza, in termini di entità del miglioramento dei livelli prestazionali iniziali da parte delle gestioni non appartenenti ex ante alla Classe A

La valutazione avviene in maniera distinta per i gestori con macro-indicatori con performance che si collocano in classe A o nelle classi inferiori alla A.

Viene così premiata non solo l'eccellenza ma anche la capacità di miglioramento dei gestori che non si trovano ancora nella classe migliore.

Al tempo stesso ARERA ha identificato diverse casistiche di esclusione dei gestori da alcuni stadi o da tutti gli stadi del meccanismo incentivante, legate ad esempio alla mancanza di invio dei dati, alla loro coerenza e consistenza, alla presenza di cause esterne ecc.

ARERA ha fissato 3 stadi di valutazione delle prestazioni:

- Livello base per singolo macroindicatore rispetto all'obiettivo del Gestore (prevede sia premialità che penalità);
- Livello avanzato per singolo macro indicatore a livello nazionale (prevede sia premialità che penalità);
- Eccellenza per tutti gli indicatori ai primi 3 classificati nazionali (prevede unicamente premialità).

Le graduatorie sono poi differenziate tra Gestori in classe A e gestori con classe inferiore alla A (per questi ultimi non si applica la valutazione per lo stadio di Eccellenza).

In termini generali le verifiche eseguite da ARERA vertono alla verifica della compatibilità, correttezza e completezza dei dati di qualità tecnica oltre che a verifiche puntuali e dettagliate sui registri relativi ai singoli indicatori.

Occorre considerare che:

- con Deliberazione ARERA 107/2022 si è conclusa la valutazione delle performance di Qualità tecnica relativamente al biennio 2018-2019;
- con Deliberazione ARERA 477/2023 si è conclusa la valutazione delle performance di Qualità tecnica relativamente al biennio 2020-2021.

Presumibilmente, ad inizio 2025 sarà conclusa l'istruttoria ARERA per la valutazione delle performance di Qualità tecnica relativamente al biennio 2022-2023. Salvo diverse indicazioni di ARERA si prevede che, nell'anno 2026, sia fatta la valutazione dei dati di qualità tecnica che saranno raccolti per gli anni 2024-2025.

Relativamente ai dati conseguiti dai gestori Ato5 si riporta, quindi, la valutazione ARERA emessa nel 2023 – il nuovo aggiornamento ci sarà, presumibilmente, nel 2025 e sarà riportato nella prossima relazione.

Con deliberazione 98/2022/R/IDR ARERA ha inteso indicare con precisione i criteri applicati in fase istruttoria per la valutazione delle performances dei Gestori.

In particolare l'Autorità ha provveduto:

- all'individuazione dei gestori ricadenti nelle casistiche di esclusione/mancata applicazione
 totale o parziale dal meccanismo incentivante, in coerenza con quanto illustrato nella
 Nota metodologica approvata con la deliberazione 98/2022/R/IDR;
- all'assegnazione dei premi e delle penalità per gli Stadi di valutazione I e II;
- all'elaborazione delle graduatorie funzionali alla quantificazione dei premi e delle penalità per gli Stadi III, IV e V e all'assegnazione dei medesimi.

Le ricognizioni condotte dall'Autorità durante il periodo di valutazione delle performance degli operatori hanno portato alla definizione della Delibera 477/2023/R/IDR "APPLICAZIONE DEL MECCANISMO INCENTIVANTE DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RQTI) PER LE ANNUALITÀ 2020-2021. RISULTATI FINALI".

Si riporta di seguito l'esito della valutazione:

| Gestore | Premialità qualità TECNICA (Delibera ARERA 17 ottobre 2023 477/2023/R/idr) [Euro] | Penalità qualità TECNICA (Delibera ARERA 17 ottobre 2023 477/2023/R/idr) [Euro] |
|------------------------------------|---|---|
| Acquedotto della Piana | 830.087 | 16 |
| Acquedotto Valtiglione | 61.637 | 1.505 |
| Asti Servizi Pubblici | 1.533.355 | 0 |
| Consorzio Acquedotto Monferrato | 1.549.533 | 0 |
| Totale Ato5 | 3.974.612 | 1.521 |

A livello complessivo d'Ambito la somma incassata per premialità, da ARERA, è pari ad Euro 3.974.612.

Da quanto si evince nella tabella precedente i Gestori dell'EGAto5 hanno dimostrato un efficace graduale e costante miglioramento delle performances fornendo ad ARERA adeguate informazioni e dimostrando particolare attenzione a quanto richiesto.

5. Qualità contrattuale del servizio reso all'Utenza

5.1 Aspetti generali

La Deliberazione ARERA 23 dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr definisce livelli specifici e generali di qualità contrattuale del servizio idrico integrato, mediante l'individuazione di tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale, per tutte le prestazioni da assicurare all'utenza oltre alle modalità di registrazione delle prestazioni fornite dai gestori su richiesta dell'utenza medesima. Sono altresì individuati gli indennizzi automatici da riconoscere all'utente per tutte le prestazioni soggette a standard specifici di qualità.

I dati, comunicati dai gestori del servizio idrico integrato in attuazione delle disposizioni ARERA, afferiscono a 28 standard specifici e 14 standard generali, riconducibili ai seguenti aspetti:

- Avvio e cessazione del rapporto contrattuale;
- Gestione del rapporto contrattuale;
- Fatturazione, gestione dei reclami e delle richieste scritte;
- Gestione degli sportelli e dei servizi telefonici.

I dati sono caricati sul portale ARERA direttamente dai gestori e successivamente viene fatta l'attività istruttoria da parte dell'Ente d'Ambito.

Nell'ambito della raccolta dati, i Gestori sono chiamati a fornire indicazioni con riferimento all'elenco completo dei gruppi di indicatori (suddivisi per argomento), di seguito elencati:

- Appuntamenti;
- Attivazione/disattivazione;
- Comunicazioni;
- Esecuzione lavori;
- Fatturazione;
- Misuratori/rete;
- Preventivazione:
- Pronto intervento;
- Sportelli;
- Servizi telefonici.

Ogni gruppo di indicatori contiene l'insieme delle maschere relative a una data tipologia di prestazione; ciascuna maschera, a sua volta, fa riferimento a un indicatore specifico o generale di qualità contrattuale.

L'elenco delle maschere relative alle tipologie di prestazioni sottese al gruppo "**Appuntamenti**" è il seguente:

- Fascia di puntualità per gli appuntamenti;
- Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato;
- Tempo massimo per l'appuntamento concordato.

L'elenco completo delle maschere relative alle tipologie di prestazioni sottese al gruppo "**Attivazione/disattivazione**" è il seguente:

- Tempo di attivazione della fornitura;
- Tempo di disattivazione della fornitura;
- Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità;
- Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore;
- Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore.

L'elenco delle maschere relative alle tipologie di prestazioni sottese al gruppo "**Comunicazioni**" è il seguente:

- Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione;
- Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio;
- Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco;
- Tempo di inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione;
- Tempo di inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione;
- Tempo per la risposta ai reclami;
- Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni;
- Tempo per la comunicazione dell'avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura;
- Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione.

L'elenco delle maschere relative alle tipologie di prestazioni sottese al gruppo "**Esecuzione lavori**" è il seguente:

- Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice;
- Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice;
- Tempo di esecuzione della voltura;
- Tempo di esecuzione di lavori semplici;

- Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso;
- Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso;
- Tempo di esecuzione di lavori complessi.

L'elenco delle maschere relative alle tipologie di prestazioni sottese al gruppo "**Fatturazione**" è il seguente:

- Tempo di rettifica di fatturazione;
- Tempo per l'emissione della fattura;
- Periodicità di fatturazione.

L'elenco delle maschere relative alle tipologie di prestazioni sottese al gruppo "**Misuratori/rete**" è il seguente:

- Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante;
- Tempo di intervento per la verifica del misuratore;
- Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione.

L'elenco delle maschere relative alle tipologie di prestazioni sottese al gruppo "**Preventivazione**" è il seguente:

- Tempo di preventivazione dell'allaccio fognario con sopralluogo;
- Tempo di preventivazione dell'allaccio fognario senza sopralluogo;
- Tempo di preventivazione dell'allaccio idrico con sopralluogo;
- Tempo di preventivazione dell'allaccio idrico senza sopralluogo;
- Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo;
- Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo.

L'elenco delle maschere relative alle tipologie di prestazioni sottese al gruppo "**Pronto** intervento" è il seguente:

- Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento;
- Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI).

L'elenco delle maschere relative alle tipologie di prestazioni sottese al gruppo "**Sportelli**" è il seguente:

- Tempo massimo di attesa agli sportelli;
- Tempo medio di attesa agli sportelli.

Con riferimento alle prestazioni sottese al gruppo "**Servizi telefonici**" è presente un'unica maschera relativa a:

- Livello del servizio telefonico (LS);
- Accessibilità al servizio telefonico (AS);
- Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA).

5.2 Approfondimenti sulle maschere relative agli Indicatori Specifici

Gli indicatori specifici – che individuano il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire all'utente finale - sono stati suddivisi (da ARERA) nei seguenti sottogruppi:

- Indicatori Specifici relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni;
- Indicatori Specifici relativi ai tempi di risposta a reclami e richieste scritte di informazioni;
- Indicatori Specifici relativi alla periodicità di fatturazione;
- Indicatori Specifici relativi al tempo di intervento sul misuratore;
- Indicatori Specifici relativi al tempo di verifica del livello di pressione.

Le informazioni richieste devono essere fornite per le seguenti tipologie d'uso:

- Uso domestico (art. 2 TICSI)
- Uso diverso dal domestico (art. 8 TICSI)

Con riferimento alla raccolta dati riferiti all'anno **2023**, in ciascuna maschera riferita agli indicatori specifici, occorre indicare le prestazioni richieste e le prestazioni eseguite.

Il complesso delle prestazioni eseguite nel **2023** deve essere suddiviso tra prestazioni che rispettano lo standard previsto dalla del. 655/2015/R/IDR e prestazioni che non lo rispettano, queste ultime ulteriormente suddivise in base al ritardo nell'esecuzione. Occorre fornire informazioni sugli indennizzi automatici spettanti agli utenti (numero di indennizzi erogati e numero di mancati indennizzi).

Indicatori Specifici relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni

All'interno delle maschere per gli Indicatori Specifici relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni è richiesto di indicare il numero totale di prestazioni richieste, il numero di prestazioni eseguite (e/o indennizzi automatici) unitamente alle cause di mancato rispetto degli stessi, secondo quanto previsto dall'articolo 77, comma 1, del RQSII.

Le maschere per gli Indicatori Specifici che appartengono a questa tipologia sono:

- 1. Fascia di puntualità per gli appuntamenti;
- 2. Tempo di attivazione, della fornitura;
- 3. Tempo di disattivazione della fornitura;
- 4. Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità;
- 5. Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore;

- 6. Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore;
- 7. Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione;
- 8. Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio;
- 9. Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco;
- 10. Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal Gestore del servizio di fognatura e/o depurazione;
- 11. Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al Gestore del servizio di fognatura e/o depurazione;
- 12. Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice;
- 13. Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice;
- 14. Tempo di esecuzione della voltura;
- 15. Tempo di esecuzione di lavori semplici;
- 16. Tempo di rettifica di fatturazione;
- 17. Tempo per l'emissione della fattura;
- 18. Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante;
- 19. Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo;
- 20. Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo;
- 21. Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo;
- 22. Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo;
- 23. Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo;
- 24. Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo.

Indicatori Specifici relativi ai tempi di risposta a reclami e richieste scritte di informazioni

Le maschere per gli Indicatori specifici relativi ai tempi di risposta a reclami e richieste scritte di informazioni consentono di indicare il numero totale di prestazioni eseguite e il numero di prestazioni richieste (e/o indennizzi automatici) unitamente alle cause di mancato rispetto degli stessi, secondo quanto previsto dall'articolo 77, comma 1, del RQSII.

Le maschere per gli indicatori specifici che appartengono a questa tipologia sono:

- 1. Tempo per la risposta a reclami;
- 2. Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni.

Indicatori Specifici relativi alla periodicità di fatturazione

Per questa tipologia di Indicatori specifici si ha una sola maschera:

1. Periodicità di fatturazione

Indicatori Specifici relativi al tempo di intervento sul misuratore

Le maschere per gli Indicatori Specifici che appartengono a questa tipologia sono:

1. Tempo di intervento per la verifica del misuratore.

Indicatori Specifici relativi al tempo di verifica del livello di pressione

Le maschere per gli indicatori specifici che appartengono a questa tipologia sono:

1. Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione

5.3 Approfondimenti sulle maschere relative agli Indicatori Generali

Gli indicatori generali - che individuano il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti finali - sono stati suddivisi nei seguenti sottogruppi, ognuno dei quali caratterizzato da una diversa tipologia di maschera:

- Indicatori Generali relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni;
- Indicatori Generali relativi al tempo massimo di attesa agli sportelli e al CPI;
- Indicatori Generali relativi al tempo medio di attesa agli sportelli;
- Indicatori Generali relativi ai servizi telefonici;

In ciascuna maschera riferita agli indicatori generali, le prestazioni eseguite devono essere suddivise tra prestazioni che rispettano lo standard previsto dalla del. 655/2015/R/IDR, e prestazioni che non lo rispettano.

Le prestazioni eseguite fuori standard devono essere suddivise per causale di mancato rispetto (tranne che per i tre indicatori relativi ai servizi telefonici: AS, LS, TMA), come definite all'articolo 71, comma 1, del RQSII e, nel caso di prestazioni eseguite fuori standard per cause di forza maggiore o per cause imputabili all'utente finale o a terzi che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 71 devono essere documentate - è richiesto al Gestore di descrivere brevemente nel campo note la motivazione di tale classificazione.

Indicatori Generali relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni

Le maschere per gli indicatori generali che appartengono a questa tipologia sono:

- 1 Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato;
- 2 Tempo massimo per l'appuntamento concordato;

- 3 Tempo per la comunicazione dell'avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura;
- 4 Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione;
- 5 Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso;
- 6 Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso;
- 7 Tempo di esecuzione di lavori complessi;
- 8 Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento.

Per la descrizione puntuale degli indicatori di qualità e le modalità di calcolo individuate ai fini del computo degli standard generali si rimanda alla Tabella 6 del RQSII (riportata nelle pagine seguenti), contenente l'elenco completo degli indicatori di qualità contrattuale del SII.

Ogni maschera degli indicatori generali relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni ha una sezione di compilazione ripetuta per ogni tipologia d'uso:

- Uso domestico (art. 2 TICSI)
- Uso diverso dal domestico (art. 8 TICSI)

Indicatori Generali relativi al tempo massimo di attesa agli sportelli e al CPI

Le maschere per gli indicatori generali che appartengono a questa tipologia sono:

- 1 Tempo massimo di attesa agli sportelli
- 2 Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI)

Indicatori Generali relativi al tempo medio di attesa agli sportelli

A questa tipologia di indicatori generali appartiene una sola maschera:

1 Tempo medio di attesa agli sportelli

Indicatori Generali relativi ai servizi telefonici

Le informazioni sugli indicatori generali relativi ai servizi telefonici (AS, LS, TMA) vengono raccolte tramite la maschera "Servizi Telefonici Tutti gli indicatori".

Si riporta, quindi, di seguito la Tabella 6 del documento ARERA sulla qualità contrattuale (RQSII) contenente l'elenco completo degli indicatori di qualità contrattuale del SII, gli standard da rispettare e l'ammontare dell'eventuale indennizzo (o base di calcolo per la verifica del rispetto dello standard).

Tabella 6 - Tabella riassuntiva degli standard generali e specifici

| Indicatore | Tipologia Standard | (i giorni, l | Indennizzo o base di calcolo | |
|---|-----------------------|---------------------|--|-------------------------------------|
| Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo | Specifico | 10 giorni | Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo stesso al richiedente | 30 euro |
| Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo | Specifico | 10 giorni | ld. c.s. | 30 euro |
| Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo | Specifico | 20 giorni | ld. c.s. | 30 euro |
| Tempo di preventivazione per allaccio fognario e/o con sopralluogo | Specifico | 20 giorni | ld. c.s. | 30 euro |
| Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | Specifico | 15 giorni | Tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori di esecuzione dell'allacciamento e la data di effettiva attivazione da parte del gestore ⁵⁹ | 30 euro |
| Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | Specifico | 20 giorni | ld. c.s. | 30 euro |
| Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso | Generale | ≤ 30 giorni | ld. c.s. | 90% delle singole prestazioni |
| Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso | Generale | ≤30 giorni | ld. c.s. | 90% delle singole prestazioni |
| Tempo di attivazione della fornitura | Specifico | 5 giorni | Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto e la data di effettiva attivazione da parte del gestore | 30 euro |
| Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore | Specifico | 5 giorni | Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura, ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della stessa | 30 euro |
| Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore | Specifico | 10 giorni | ld. c.s. | 30 euro |
| Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità ⁶⁰ | Specifico | 2 giorni feriali | Tempo intercorrente tra la data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute al gestore e la data di riattivazione della fornitura da parte del gestore stesso | 30 euro |
| Tempo di disattivazione della fornitura | Specifico | 7 giorni | Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di cessazione del servizio da parte dell'utente finale e la data di disattivazione della fornitura da parte del gestore | 30 euro |
| Tempo di esecuzione della voltura | Specifico | 5 giorni | Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo utente finale | 30 euro |
| Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo | Specifico | 10 giorni | Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo dell'utente finale e la data di invio all'utente finale stesso del preventivo da parte del gestore | 30 euro |
| Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo | Specifico | 20 giorni | ld. c.s. | 30 euro |

| Indicatore | Tipologia Standard | (i giorni, l | Standard addove non specificato, si intendono lavorativi) | Indennizzo o base di calcolo |
|--|-----------------------|---------------------|---|-------------------------------------|
| Tempo di esecuzione di lavori semplici | Specifico | 10 giorni | Tempo intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'utente finale e la data di completamento lavori da parte del gestore | 30 euro |
| Tempo di esecuzione di lavori complessi | Generale | ≤30 giorni | ld. c.s. | 90% delle singole prestazioni |
| Fascia di puntualità per gli appuntamenti | Specifico | 3 ore | - | 30 euro |
| Tempo massimo per l'appuntamento concordato | Generale | 7 giorni | Tempo intercorrente tra il giorno in cui il gestore riceve la richiesta dell'utente finale e il giorno in cui si verifica l'appuntamento | 90% delle singole prestazioni |
| Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato | Generale | 24 ore | Tempo intercorrente tra il momento in cui la disdetta dell'appuntamento concordato viene comunicata all'utente finale e l'inizio della fascia di puntualità in precedenza concordata | 95% delle singole prestazioni |
| Tempo di intervento per la verifica del misuratore | Specifico | 10 giorni | Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di intervento sul misuratore da parte del gestore | 30 euro |
| Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco | Specifico | 10 giorni | Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente finale del relativo esito | 30 euro |
| Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio | Specifico | 30 giorni | Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente finale del relativo esito | 30 euro |
| Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante | Specifico | 10 giorni | Tempo intercorrente tra la data di invio all'utente finale dell'esito della verifica del misuratore e la data in cui il gestore intende sostituire il misuratore stesso | 30 euro |
| Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione | Specifico | 10 giorni | Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di intervento sul misuratore da parte del gestore | 30 euro |
| Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione | Specifico | 10 giorni | Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente finale del relativo esito | 30 euro |
| Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento | Generale | 3 ore | Calcolate a partire dall'inizio della conversazione telefonica con l'operatore di pronto intervento | 90% delle singole prestazioni |
| Tempo per l'emissione della fattura | Specifico | 45 giorni solari | Tempo intercorrente tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e la data di emissione della fattura stessa | 30 euro |
| | | 2/an | no se consumi ≤ 100mc N. bollette | |
| | | 3/anno se | 100mc < consumi ≤ 1000mc emesse | |
| Periodicità di fatturazione | Specifico | 4/anno se | 1000mc < consumi ≤ 3000mc | 30 euro |
| | | | base ai consumi > 3000 mc consumi medi | |
| Termine per il pagamento della bolletta | Specifico | 20 giorni solari | - | - |
| Tempo per la risposta a reclami | Specifico | 30 giorni | Tempo intercorrente tra la data di ricevimento del reclamo dell'utente finale e la data di invio della risposta motivata scritta | 30 euro |
| Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni | Specifico | 30 giorni | Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di invio della risposta motivata scritta | 30 euro |
| Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione | Generale | 30 giorni | ld. c.s. | 95% delle singole prestazioni |
| Tempo di rettifica di fatturazione | Specifico | 60 giorni | Tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di | 30 euro |

| Indicatore | Tipologia Standard | (i giorni, l | Standard addove non specificato, si intendono lavorativi) | Indennizzo o base di calcolo |
|--|-----------------------|-------------------------|--|---|
| | | | rettifica di fatturazione inviata dall'utente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibiltà di rateizzazione ai sensi dell'Articolo 42, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta | Carcolo |
| Tempo massimo di attesa agli sportelli | Generale | 60 minuti | Tempo intercorrente tra il momento in cui l'utente finale si presenta allo sportello fisico e il momento in cui il medesimo viene ricevuto | 95% delle singole prestazioni |
| Tempo medio di attesa agli sportelli | Generale | 20 minuti | Tempo intercorrente tra il momento in cui l'utente finale si presenta allo sportello fisico e il momento in cui il medesimo viene ricevuto | Media sul totale delle prestazioni |
| Accessibilità al servizio telefonico (AS) | Generale | AS > 90% | Rapporto tra unità di tempo in cui almeno una linea è libera e numero complessivo di unità di tempo di apertura del call center con operatore, moltiplicato per 100 | Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi |
| Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA) | Generale | TMA ≤ 240 secondi | Tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata con risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore | Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi |
| Livello del servizio telefonico (LS) | Generale | LS≥80% | Rapporto tra il numero di chiamate telefoniche degli utenti che hanno effettivamente parlato con un operatore e il numero di chiamate degli utenti che hanno richiesto di parlare con operatore o che sono state reindirizzate dai sistemi automatici ad un operatore, moltiplicato per 100 | Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi |
| Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI) | Generale | CPI ≤ 120 secondi | Tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche con risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento o la conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione | 90% delle singole prestazioni |
| Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione | Specifico | 5 giorni | Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale da parte del gestore del servizio di acquedotto e la data di invio, da parte di quest'ultimo, al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione della medesima richiesta | 30 euro |
| Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione | Specifico | 5 giorni | Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore del servizio di acquedotto, della comunicazione del gestore del servizio di fognatura e/o depurazione e la data di invio all'utente finale della medesima comunicazione da parte del gestore del servizio di acquedotto | 30 euro |
| Tempo per la comunicazione dell'avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura | Generale | 10 giorni | Tempo intercorrente tra la data di esecuzione dell'intervento indicato e la data in cui il gestore dell'acquedotto comunica al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione l'avvenuta esecuzione dell'intervento stesso | 90% delle singole prestazioni |

La raccolta dati di qualità contrattuale del SII è propedeutica all'acquisizione da parte dell'Autorità dei dati necessari per verificare in ciascun anno di raccolta il rispetto degli standard previsti (dal RQSII) con riferimento alle prestazioni eseguite in un determinato anno di riferimento.

La sezione della raccolta "Riepilogo per Macro-indicatori" (vedi tabelle riportate nelle pagine seguenti) mette in evidenza il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso di un determinato anno relativamente ai Macro-indicatori di qualità contrattuale alla base del

meccanismo di incentivazione di cui al Titolo XIII del RQSII, introdotto dall'Autorità con del. 547/2019/R/IDR.

Con tale deliberazione l'Autorità ha integrato la disciplina in materia di regolazione della qualità contrattuale, RQSII, di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, introducendo, tra l'altro, dal 1° gennaio 2020, un meccanismo incentivante di premi/penalità, da attribuire in ragione delle performance delle singole gestioni, da valutare con riferimento a due macro-indicatori:

MC1 - "Avvio e cessazione del rapporto contrattuale" (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative ai preventivi, all'esecuzione di allacciamenti e lavori, all'attivazione e disattivazione della fornitura);

MC2 - "Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio" (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative agli appuntamenti, alla fatturazione, alle verifiche dei misuratori e del livello di pressione, alle risposte a richieste scritte, nonché alla gestione dei punti di contatto con l'utenza).

Tali macro-indicatori di qualità contrattuale, sono costruiti come media ponderata dei pertinenti indicatori semplici, pesata in base al numero delle prestazioni erogate dalla gestione (dato dalla somma del numero delle prestazioni entro il rispettivo standard previsto dalla RQSII e di quello delle prestazioni non conformi per causa imputabile alla responsabilità del gestore), secondo quanto previsto al comma 92.2 della RQSII; in particolare, l'Autorità ha previsto che per ogni macro-indicatore, con riferimento a ciascuna gestione:

- siano individuati gli obiettivi annuali, divisi in due categorie, di mantenimento e di miglioramento, questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle performance registrate nell'anno precedente, che per ciascuna annualità costituisce il livello di partenza (comma 93.1 della RQSII);
- con esclusivo riferimento al primo anno di valutazione delle performance (2020), il livello di partenza sia definito sulla base dei dati relativi agli indicatori semplici registrati nel 2018 (comma 93.3 della RQSII);
- i premi e le penalità siano quantificati a partire dal 2022 sulla base delle performance realizzate in ciascuno dei due anni precedenti (comma 91.2 della RQSII), precisando, al successivo comma 95.1 che "ai fini dell'applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione) nell'anno (a+2), costituiscono elementi di valutazione il livello negli anni a e (a+1) dei macro-indicatori MC1 e MC2".

Di seguito si riportano le classi e gli obiettivi per macro-indicatore come indicati alla Tavola 2 del RQSII:

Tavola 2 - Classi e obiettivi per macro-indicatore

| Macro-indicatore | ID Classe Classe | | Obiettivo |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| | A | MC1 > 98% | Mantenimento |
| MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale | В | 90% < MC1 ≤ 98% | + 1% |
| uer rapporto com amate | C | MC1 ≤ 90% | + 3% |
| MC2 - Gestione del | Α | MC2 > 95% | Mantenimento |
| rapporto contrattuale e | В | 90% < MC2 ≤ 95% | + 1% |
| accessibilità al servizio | C | MC2 ≤ 90% | + 3% |

Per ciascuno dei macro-indicatori, gli obiettivi annuali sono divisi in due categorie: mantenimento e miglioramento.

Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle performance registrate nell'anno precedente, che per ciascuna annualità costituisce il livello di partenza.

In particolare, si individuano:

- la Classe A, cui è attribuito un obiettivo di mantenimento del livello di partenza;
- la Classe B e la Classe C, cui sono associati obiettivi di miglioramento differenziati in ragione del livello iniziale di performance.

Con Deliberazione 235/2020/R/IDR, a seguito della situazione emergenziale covid-19, l'Autorità ha previsto che per ciascuna gestione, in deroga a quanto previsto dai commi 93.1 e 93.3 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR, gli obiettivi di qualità contrattuale di mantenimento/miglioramento per gli anni 2020 e 2021 saranno individuati sulla base dei dati relativi agli indicatori semplici registrati nel 2018, procedendo a:

- identificare il livello di partenza e la relativa classe di appartenenza ai fini della determinazione dell'obiettivo per l'annualità 2020;
- assumere il perseguimento dell'obiettivo per l'annualità 2020, di cui alla precedente lett. a), ai fini dell'individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l'annualità 2021.

Inoltre, in considerazione delle misure di contenimento adottate per il contrasto dell'emergenza epidemiologica e delle possibili conseguenti forme di discontinuità riscontrabili nel progressivo miglioramento delle performance gestionali, in deroga a quanto previsto dai commi 91.2 e 95.1 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR, gli obiettivi di qualità contrattuale relativi al 2020 e al 2021, saranno valutati cumulativamente su base biennale. Conseguentemente, ai fini dell'applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione), con riferimento alle annualità 2020 e 2021, costituirà elemento di valutazione il livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2021, per ciascuno dei macro-indicatori MC1 - "Avvio e cessazione del

rapporto contrattuale" e MC2 - "Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio".

Il comma 91.2 è stato modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR; pertanto, a partire dal 2024 i premi e le penalità di cui all'Articolo 96 sono quantificati sulla base del livello delle performance raggiunto cumulativamente al termine di ciascun periodo di valutazione, costituito dal biennio precedente.

Attraverso il riepilogo per Macro-Indicatori AS 2021, vengono quindi individuati:

- il livello di partenza dei macro-indicatori di qualità contrattuale MC1 "Avvio e cessazione del rapporto contrattuale" e MC2 - "Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità del servizio";
- la classe di appartenenza;
- gli obiettivi per l'anno **2023**.

Al fine di valutare le graduatorie relative allo stadio di eccellenza, l'Autorità ha stabilito che i punteggi siano attribuiti agli operatori mediante l'impiego del metodo TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution), individuando il benchmark qualitativo ideale e misurando la distanza di ciascun gestore dal benchmark.

Con Deliberazione 734/2022/R/idr del 27/12/2022, l'ARERA ha approvato la nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari nell'ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII) avviato con Deliberazione dell'Autorità 69/2020/R/IDR.

Al fine di implementare il nuovo meccanismo incentivante di premi e penalità e di acquisire le informazioni circa le prestazioni di qualità contrattuale riferite al complesso delle gestioni operanti sul territorio, la rendicontazione dei dati all'Autorità nazionale e gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 77 della RQSII, a partire dall'annualità 2020 (per le registrazioni delle informazioni relative all'anno 2019), sono estesi a tutti gli operatori che servono un numero superiore o inferiore a 50.000 abitanti, atteso che detti operatori erano già sottoposti agli obblighi di "Registrazione di informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità contrattuale" previsti dall'articolo 75 della RQSII e alle disposizioni previste dalla Carta del Servizio.

5.4 Riepilogo per Macro-Indicatori

Con la predisposizione tariffaria MTI-3/aggiornamento per gli anni 2022-2023, sono stati definiti gli obiettivi di qualità contrattuale 2022-2023.

Di seguito, per ogni Gestore, si riportano la tabella degli obiettivi di qualità contrattuale **2022-2023** (alla colonna "Definizione obiettivo **2022**" nella riga "Valore di partenza" per ogni macro-indicatore viene indicato quanto emerso dalla racconta qualità contrattuale dati anno **2021**) ed il tabellone riepilogativo relativo alla raccolta dati qualità contrattuale anno **2023**.

Asti Servizi Pubblici (ASP)

Riepilogo RQSII: identificazione obiettivi

2022-2023

| | Macro-indicatore | Definizione obiettivo 2022 | Definizione obiettivo 2023 |
|-------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | Valore di partenza | 98,654% | 98,654% |
| | Classe | Α | Α |
| MC1 | Obiettivo RQSII | mantenimento | mantenimento |
| IVICI | Valore obiettivo MC1 | mantenimento | mantenimento |
| | Anno di riferimento per valutazione obiettivo per MC1 | 2021 | 2022* |
| | Valore di partenza | 97,875% | 97,875% |
| | Classe | Α | Α |
| NACO | Obiettivo RQSII | mantenimento | mantenimento |
| MC2 | Valore obiettivo MC2 | mantenimento | mantenimento |
| | Anno di riferimento per valutazione obiettivo per MC2 | 2021 | 2022* |

^{*}Ai sensi del comma 11.2 della deliberazione 639/2021/R/idr, si assume "il perseguimento dell'obiettivo per l'annualità 2022, (...), ai fini dell'individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l'annualità 2023"

| ASTI SEI | ASTI SERVIZI PUBBLICI (ASP) – Dati di qualità contrattuale anno 2023 | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | Riepilogo per Macroindica | atori - as 2023 | 3 | | | | | | | |
| | Campo note modificabile so | olo da masche | era | | | | | | | |
| I dati 2023 fanno riferimento al medesimo territorio servito al 31/12/2023 dichiarato nella maschera "Comuni serviti"? Se NO, indicare e motivare nel campo note le differenze. | | | | | | | | SI | | |
| | | | | | | | | | | |
| cent, la formu | la (nella cella D51) calcola 14 fuori standard (nella cella E51) che ad ASP risultano essere 32.2) tempo medio di attesa p | er il servizio t | elefonico (TM/ | A): imputando | il tempo med | io in secondi | (24,99cent) la | formula (nella | cella D54) ca | Icola 6 fuori s |
| | N . | | 1 | | | | | | | |
| | Numero comuni Popolazione residente | | 73691 | - | | | | | | |
| | Numero Utenze | | 12894 | | | | | | | |
| | Numero denze | | 12034 | | | | | | | |
| Macro- | | Totale | Tot | Tot | Cause | di mancato r | ispetto | Tempo/valor | Tot | Tot |
| indicatore | Indicatore semplice | eseguite | eseguite | eseguite | num. casi di | num. casi | imputabili al | e medio | eseguite | eseguite |
| MC1 | Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 MC1 | Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo | 99 29 | 96 29 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | | 96,000 29,000 | 3,000 0,000 |
| MC1 | Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 18,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 39,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di esecuzione di lavori semplici | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 37,000 | 1,000 |
| MC1 | Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 25,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di esecuzione di lavori complessi | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di attivazione, della fornitura | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 82,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità | 53 72 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 52,000 72,000 | 1,000 0.000 |
| MC1 MC1 | Tempo di disattivazione della fornitura Tempo di esecuzione della voltura | 434 | 72 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 434.000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo di esecuzione della voltura Tempo massimo per l'appuntamento concordato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC2 | Preaviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.000 | 0,000 |
| MC2 | Fascia di puntualità per gli appuntamenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo di intervento per la verifica del misuratore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento | 99 | 97 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 97,000 | 2,000 |
| MC2 MC2 | Tempo per l'emissione della fattura Tempo di rettifica di fatturazione | 32.693 0 | 32.687 | 6 | 0 | 0 | 6 | | 32,687 0.000 | 0,006 |
| MC2 | Tempo di rettilica di fatturazione Tempo per la risposta a reclami | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | 0.000 |
| MC2 | Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo per la comunicazione dell'avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo massimo di attesa agli sportelli | 3.767 | 3.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 376,700 | 0,000 |
| MC2 | Tempo medio di attesa agli sportelli | 3.767 | 3.753 | 14 | | | | 1,45 | 375,334 | 1,366 |
| MC2 | Livello del servizio telefonico (LS) | 1.159 | 1.144 | 15 | | | | 98,706% | 11,440 | 0,150 |
| MC2 | Accessibilità al servizio telefonico (AS) | 1.159 | 1.159 | 0 | | | | 100,000% | 11,590 | 0,000 |
| MC2 | Tempo medio di attesa (secondi) per il servizio telefonico (TMA) | 1.159 | 1.153 | 6 | | _ | 70 | 24,99 | 11,530 | 0,060 |
| MC2 | Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI) | 2.415 | 2.339 | 76 | 0 | 0 | 76 | | 233,900 | 7,600 |
| | | | | | | Valori Maa | ro-Indicatori | Totali | per Macro-Ind | dicatori |
| | | | | | | MC1 | 99.447% | MC1 | 899,000 | 5.000 |
| | | | | | | MC2 | 99,041% | MC2 | 1.155,181 | 11,182 |
| | | | | | | | , | | | , |

Come indicato nella tabella sopra, dal calcolo dei macro-indicatori anno 2023, si evince che, per il Gestore Asti Servizi Pubblici S.pA., l'obiettivo di mantenimento 2023 risulta raggiunto per entrambe i macro-indicatori.

Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato (CCAM)

Riepilogo RQSII: identificazione obiettivi

2022-2023

| | Macro-indicatore | Definizione obiettivo 2022 | Definizione obiettivo 2023 |
|-------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | Valore di partenza | 99,888% | 99,888% |
| | Classe | Α | Α |
| MC1 | Obiettivo RQSII | mantenimento | mantenimento |
| IVICI | Valore obiettivo MC1 | mantenimento | mantenimento |
| | Anno di riferimento per valutazione obiettivo per MC1 | 2021 | 2022* |
| | Valore di partenza | 99,458% | 99,458% |
| | Classe | Α | Α |
| MC2 | Obiettivo RQSII | mantenimento | mantenimento |
| IVICZ | Valore obiettivo MC2 | mantenimento | mantenimento |
| | Anno di riferimento per valutazione obiettivo per MC2 | 2021 | 2022* |

^{*}Ai sensi del comma 11.2 della deliberazione 639/2021/R/idr, si assume "il perseguimento dell'obiettivo per l'annualità 2022, (...), ai fini dell'individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l'annualità 2023"

CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO (CCAM) – Dati di qualità contrattuale anno 2023

| | Riepilogo per Macroindica | atori - as 2023 | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|----------|
| | Campo note modificabile so | olo da masobo | ro | | | | | | | |
| | I dati 2023 fanno riferimento al medesimo territorio servito al 31/12/2023 dichiarato nella maschera | | | dicare e motiv | vare nel campo | note le diffe | renze. | | _ | SI |
| | | | , | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Numero comuni | | 98 | | | | | | | |
| | Popolazione residente | | 82888 | | | | | | | |
| | Numero Utenze | | 46940 | | | | | | | |
| lacro- | | Totale | Tot | Tot | Cause | di mancato i | rienetto | Tempo/valor | r Tot | Tot |
| licatore | Indicatore semplice | eseguite | eseguite | eseguite | | | imputabili al | e medio | eseguite | esegu |
| MC1 | Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ciliculo | 7,000 | 0,00 |
| MC1 | Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.000 | 0.00 |
| MC1 | Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1,000 | 0,00 |
| MC1 | Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo | 641 | 632 | 9 | 0 | 9 | 0 | | 632,000 | 0,00 |
| MC1 | Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo | 117 | 116 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 116,000 | 0,00 |
| MC1 | Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 33,000 | 0,00 |
| MC1 | Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 18,000 | 0,00 |
| MC1 | Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | 49 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 48,000 | 0,00 |
| MC1 | Tempo di esecuzione di lavori semplici | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3,000 | 0,00 |
| AC1 | Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso | 139 | 134 | 5 | 0 | 5 | 0 | | 134,000 | 0,00 |
| MC1 | Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 16,000 | 0,00 |
| MC1 | Tempo di esecuzione di lavori complessi | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 23,000 | 0,00 |
| /IC1 | Tempo di attivazione, della fornitura | 216 | 181 | 35 | 0 | 35 | 0 | | 181,000 | 0,00 |
| MC1 | Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore | 337 | 323 | 14 | 0 | 14 | 0 | | 323,000 | 0,00 |
| AC1 | Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,00 |
| MC1 | Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 227,000 | 0,00 |
| MC1 | Tempo di disattivazione della fornitura | 330 | 327 | 3 | 0 | 3 | 0 | | 327,000 | 0,00 |
| MC1 | Tempo di esecuzione della voltura | 1.608 1.173 | 1.608 1.154 | 0 19 | 0 | 0 19 | 0 | | 1.608,000 | 0,00 |
| MC2 MC2 | Tempo massimo per l'appuntamento concordato Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.154,000 0,000 | 0,00 |
| MC2 | Freavviso milimo per la disdetta dell'appuntamento concordato Fascia di puntualità per gli appuntamenti | 1.133 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.133,000 | 0,00 |
| MC2 | Tempo di intervento per la verifica del misuratore | 2 | 1.133 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1,000 | 0,00 |
| MC2 | Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.000 | 0.00 |
| MC2 | Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | 0,000 | 0,00 |
| MC2 | Tempo di continuazione del misuratore malfunzionante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.000 | 0,00 |
| MC2 | Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,00 |
| MC2 | Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,00 |
| AC2 | Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 104,000 | 0,00 |
| MC2 | Tempo per l'emissione della fattura | 128.965 | 128.945 | 20 | 0 | 1 | 19 | | 128,945 | 0,01 |
| ЛС 2 | Tempo di rettifica di fatturazione | 97 | 96 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 96,000 | 0,00 |
| /IC2 | Tempo per la risposta a reclami | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 129,000 | 0,00 |
| ЛС 2 | Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80,000 | 0,00 |
| ЛС 2 | Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione | 147 | 145 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 145,000 | 2,00 |
| MC2 | Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,00 |
| MC2 | Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,00 |
| MC2 | Tempo per la comunicazione dell'avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,00 |
| AC2 | Tempo massimo di attesa agli sportelli | 3.213 | 3.192 | 21 | 0 | 0 | 21 | | 319,200 | 2,10 |
| /IC2 | Tempo medio di attesa agli sportelli | 3.213 | 3.144 | 69 | | | | 8,54 | 314,440 | 6,86 |
| AC2 | Livello del servizio telefonico (LS) | 24.367 | 22.443 | 1.924 | | | | 92,104% | 224,430 | 19,2 |
| MC2 | Accessibilità al servizio telefonico (AS) | 24.367 | 24.367 | 0 | | | | 100,000% | 243,670 | 0,00 |
| MC2 | Tempo medio di attesa (secondi) per il servizio telefonico (TMA) | 24.367 | 24.130 | 237 | | | | 46,66 | 241,301 | 2,3 |
| AC2 | Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI) | 6.416 | 6.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 641,600 | 0,0 |
| | | | | | | Valori Mac | ro-Indicatori | Totali | i per Macro-Ind | licatori |
| | | | | | | MC1 | 100,000% | MC1 | 3.699,000 | 0,00 |
| | | | | | | MC2 | 99.347% | MC2 | 4.955,587 | 32.58 |

Come indicato dalla tabella sopra, dal calcolo dei macro-indicatori 2023, si evince che, per il Gestore Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato, l'obiettivo di mantenimento 2023 risulta raggiunto per entrambe i macro-indicatori.

Acquedotto della Piana S.p.A.

Riepilogo RQSII: identificazione obiettivi

2022-2023

| Macro-indicatore | | Definizione obiettivo 2022 | Definizione obiettivo 2023 |
|------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | Valore di partenza | 98,525% | 98,525% |
| | Classe | Α | Α |
| DAC1 | Obiettivo RQSII | mantenimento | mantenimento |
| MC1 | Valore obiettivo MC1 | mantenimento | mantenimento |
| | Anno di riferimento per valutazione obiettivo per MC1 | 2021 | 2022* |
| | Valore di partenza | 98,942% | 98,942% |
| | Classe | Α | Α |
| NAC2 | Obiettivo RQSII | mantenimento | mantenimento |
| MC2 | Valore obiettivo MC2 | mantenimento | mantenimento |
| | Anno di riferimento per valutazione obiettivo per MC2 | 2021 | 2022* |

^{*}Ai sensi del comma 11.2 della deliberazione 639/2021/R/idr, si assume "il perseguimento dell'obiettivo per l'annualità 2022, (...), ai fini dell'individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l'annualità 2023

ACQUEDOTTO DELLA PIANA – Dati di qualità contrattuale anno 2023

| | CQUEDOTTO DELLA PIANA – Dati di qualità contrattuale anno 2023 Riepilogo per Macroindicatori - as 2023 | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| | | | | | | | | | | |
| | Campo note modificabile so | | | | | | | | | |
| | l dati 2023 fanno riferimento al medesimo territorio servito al 31/12/2023 dichiarato nella maschera | "Comuni servi | ti"? Se NO, ind | dicare e motiv | are nel campo | note le diffe | renze. | | | SI |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Numero comuni | | 18 | | | | | | | |
| | Popolazione residente | | 34384 | | | | | | | |
| | Numero Utenze | | 15308 | | | | | | | |
| | TWITTETO OTCHZE | | 15500 | | | | | | | |
| Macro- | | Totale | Tot | Tot | Cause | di mancato i | rispetto | Tempo/valor | Tot | Tot |
| dicatore | Indicatore semplice | eseguite | eseguite | eseguite | | | imputabili al | e medio | eseguite | eseguite |
| MC1 | Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo | 146 | 143 | 3 | 0 | 0 | 3 | | 143,000 | 3,000 |
| MC1 | Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo | 45 | 42 | 3 | 0 | 0 | 3 | | 42,000 | 3,000 |
| MC1 | Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di esecuzione di lavori semplici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso | 127 | 118 | 9 | 0 | 0 | 9 | | 118,000 | 9,000 |
| MC1 | Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 32,000 | 1,000 |
| MC1 | Tempo di esecuzione di lavori complessi | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 30,000 | 1,000 |
| MC1 | Tempo di attivazione, della fornitura | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 83,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di disattivazione della fornitura | 81 | 47 | 34 | 0 | 29 | 5 | | 47,000 | 5,000 |
| MC1 | Tempo di esecuzione della voltura | 677 | 675 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 675,000 | 2,000 |
| MC2 | Tempo massimo per l'appuntamento concordato | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 168,000 | 0,000 |
| MC2 | Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC2 | Fascia di puntualità per gli appuntamenti | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 168,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo di intervento per la verifica del misuratore | 11 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | | 6,000 | 1,000 |
| MC2 | Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC2 MC2 | Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | | | 1.000,000 | 0,000 |
| | Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento | 45.526 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 45,526 | 0,000 |
| MC2 MC2 | Tempo per l'emissione della fattura Tempo di rettifica di fatturazione | 203 | 45.526 200 | 3 | 0 | 0 | 3 | | 200,000 | 3,000 |
| MC2 | Tempo di rettifica di fatturazione Tempo per la risposta a reclami | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6.000 | 0.000 |
| MC2 | Tempo per la risposta a reciami Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni | 42 | 39 | 3 | 0 | 0 | 3 | | 39,000 | 3,000 |
| MC2 | Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione | 209 | 197 | 12 | 0 | 0 | 12 | | 197,000 | 12,00 |
| MC2 | Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo per la comunicazione dell'avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo per la comunicazione dell'avvendra attivazione, nattivazione, subeniro, cessazione, voltura Tempo massimo di attesa agli sportelli | 943 | 902 | 41 | 0 | 0 | 41 | | 90,200 | 4,100 |
| MC2 | Tempo medio di attesa agli sportelli | 943 | 917 | 26 | U | U | 41 | 11,166 | 91,668 | 2,632 |
| MC2 | Livello del servizio telefonico (LS) | 2.229 | 2.209 | 20 | | | | 99,103% | 22.090 | 0.200 |
| MC2 | Accessibilità al servizio telefonico (AS) | 2.229 | 2.209 | 33 | | | | 98,508% | 21,957 | 0,200 |
| MC2 | Tempo medio di attesa (secondi) per il servizio telefonico (TMA) | 2.229 | 2.212 | 17 | | | | 36,79 | 22,119 | 0,33 |
| MC2 | Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI) | 2.570 | 2.417 | 153 | 0 | 0 | 153 | 30,18 | 241,700 | 15,30 |
| IVIOZ | = 1 cmpo di risposta ana dinamata di profito intervento (ci 1) | 2.070 | 2.717 | 100 | U | U | 100 | | 241,700 | 10,50 |
| | | | | | | Valori Mac | ro-Indicatori | Totali | per Macro-Ind | licatori |
| | | | | | | MC1 | 98,140% | MC1 | 1.266,000 | 24,000 |
| | | | | | | MC2 | 98,248% | MC2 | 2.340,260 | 41,730 |

Come indicato nella tabella sopra, dal calcolo dei macro-indicatori 2023, si evince che, per il Gestore Acquedotto della Piana S.p.A., l'obiettivo di mantenimento 2023 risulta raggiunto per entrambi I macroindicatori.

Acquedotto Valtiglione S.p.A.

Riepilogo RQSII: identificazione obiettivi

2022-2023

| | Macro-indicatore | Definizione obiettivo 2022 | Definizione obiettivo 2023 |
|-------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | Valore di partenza | 98,292% | 98,292% |
| | Classe | Α | Α |
| MC1 | Obiettivo RQSII | mantenimento | mantenimento |
| IVICI | Valore obiettivo MC1 | mantenimento | mantenimento |
| | Anno di riferimento per valutazione obiettivo per MC1 | 2021 | 2022* |
| | Valore di partenza | 97,696% | 97,696% |
| | Classe | Α | Α |
| N4C2 | Obiettivo RQSII | mantenimento | mantenimento |
| MC2 | Valore obiettivo MC2 | mantenimento | mantenimento |
| | Anno di riferimento per valutazione obiettivo per MC2 | 2021 | 2022* |

^{*}Ai sensi del comma 11.2 della deliberazione 639/2021/R/idr, si assume "il perseguimento dell'obiettivo per l'annualità 2022, (...), ai fini dell'individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l'annualità 2023"

In merito alla gestione Acquedotto Valtiglione S.p.A. si precisa che l'identificazione degli obiettivi evidenziata nella tabella precedente comprende anche la gestione operativa di Ireti nei Comuni di Canelli e Nizza M.to.

ACQUEDOTTO VALTIGLIONE (solo Comuni direttamente gestiti) – Dati di qualità contrattuale anno 2023

| | DOTTO VALTIGLIONE (solo Comuni direttamente gestiti) – Dati Riepilogo per Macroind | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | |
| | Campo note modificabile | | | | | | | | | |
| | I dati 2023 fanno riferimento al medesimo territorio servito al 31/12/2023 dichiarato nella mascher | a "Comuni se | rviti"? Se NO, | indicare e mo | tivare nel cam | oo note le diffi | erenze. | İ | | SI |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Numero comuni | | 33 | | | | | | | |
| | Popolazione residente | | 35848 | | | | | | | |
| | Numero Utenze | | 20078 | J | | | | | | |
| | | T-4-1- | T | T-4 | 0 | | | T | T. t | T |
| Macro- ndicatore | Indicatore semplice | Totale eseguite | entro lo std | Tot eseguite | num. casi di | di mancato i | | Tempo/valor e medio | Tot eseguite entro lo std | |
| MC1 | Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo | eseguite 0 | 0 | 0 | num. casi di | num. casi | 0 | e medio | 0,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo | 63 | 58 | 5 | 0 | 0 | 5 | | 58,000 | 5,000 |
| MC1 | Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo | 58 | 53 | 5 | 0 | 0 | 5 | | 53,000 | 5,000 |
| MC1 | Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 7,000 | 2,000 |
| MC1 | Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 25,000 | 1,000 |
| MC1 | Tempo di esecuzione di lavori semplici | 205 | 203 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 203,000 | 1,000 |
| MC1 | Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso | 54 | 47 | 7 | 0 | 0 | 7 | | 47,000 | 7,000 |
| MC1 | Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 31,000 | 2,000 |
| MC1 | Tempo di esecuzione di lavori complessi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di attivazione, della fornitura | 202 | 163 | 39 | 0 | 25 | 14 | | 163,000 | 14,000 |
| MC1 | Tempo di riattivazione, owero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di riattivazione, owero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di disattivazione della fornitura | 122 968 | 91 | 31 101 | 0 | 24 3 | 7 | | 91,000 867.000 | 7,000 98,000 |
| MC1 MC2 | Tempo di esecuzione della voltura | 419 | 867 394 | 25 | 0 | 16 | 98 | | 394,000 | 9,000 |
| MC2 | Tempo massimo per l'appuntamento concordato Preawiso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.000 | 0,000 |
| MC2 | Fascia di puntualità per gli appuntamenti | 419 | 394 | 25 | 0 | 16 | 9 | | 394,000 | 9,000 |
| MC2 | Tempo di intervento per la verifica del misuratore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento | 92 | 85 | 7 | 0 | 0 | 7 | | 85,000 | 7,000 |
| MC2 | Tempo per l'emissione della fattura | 61.612 | 61.585 | 27 | 0 | 0 | 27 | | 61,585 | 0,027 |
| MC2 | Tempo di rettifica di fatturazione | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 20,000 | 1,000 |
| MC2 | Tempo per la risposta a reclami | 69 | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 68,000 | 1,000 |
| MC2 | Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni | 2.148 | 2.144 | 4 | 0 | 1 | 3 | | 2.144,000 | 3,000 |
| MC2 | Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione | 57 | 45 | 12 | 0 | 8 | 4 | | 45,000 | 4,000 |
| MC2 | Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo per la comunicazione dell'awenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo massimo di attesa agli sportelli | 885 885 | 884 881 | 1 4 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 88,400 88,146 | 0,100 |
| MC2 MC2 | Tempo medio di attesa agli sportelli Livello del servizio telefonico (LS) | 11.359 | 10.493 | 866 | | | | 1,6 92,376% | 104,930 | 0,354 8,660 |
| MC2 | Liveilo dei servizio telefonico (LS) Accessibilità al servizio telefonico (AS) | 11.359 | 11.359 | 0 | | | | 100,000% | 113,590 | 0,000 |
| MC2 | Tempo medio di attesa (secondi) per il servizio telefonico (TMA) | 11.359 | 11.359 | 104 | | | | 44,15 | 112,545 | 1,045 |
| MC2 | Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI) | 6.032 | 5.670 | 362 | 0 | 270 | 92 | 44, 13 | 567,000 | 9,200 |
| MIOZ | rompo di noposta ana omaniata di pionto intervento (GFI) | 0.002 | 5.070 | 502 | U | 210 | 32 | | 007,000 | 3,200 |
| | | | | | | Valori Mad | ro-Indicatori | Totali | per Macro-Inc | licatori |
| | | | | | | MC1 | 91,583% | MC1 | 1.545,000 | 142,000 |
| | | | | | | MC2 | 98,770% | MC2 | 4.286,196 | 53,386 |

IRETI (GESTORE OPERATIVO DI ACQUEDOTTO VALTIGLIONE) - COMUNI DI CANELLI E NIZZA M.TO – Dati di qualità contrattuale anno 2023

| Macro- ndicatore MC1 | Campo note modificabile I dati 2023 fanno riferimento al medesimo territorio servito al 31/12/2023 dichiarato nella mascher Numero comuni Popolazione residente Numero Utenze Indicatore semplice Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | Totale eseguite 0 0 0 | 2 20178 4141 Tot eseguite | Tot eseguite | | oo note le diffe | erenze. | | | SI |
|--|---|-------------------------|--|--------------|--------------|------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| MC1 | Numero comuni Popolazione residente Numero Utenze Indicatore semplice Indicatore semplice Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | Totale eseguite 0 0 0 | 2 20178 4141 Tot eseguite entro lo std | Tot eseguite | | | | | | |
| dicatore MC1 | Popolazione residente Numero Utenze Indicatore semplice Indicatore semplice Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | eseguite 0 0 0 | 20178 4141 Tot eseguite entro lo std | | | | | | | |
| MC1 | Popolazione residente Numero Utenze Indicatore semplice Indicatore semplice Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | eseguite 0 0 0 | 20178 4141 Tot eseguite entro lo std | | | | | | | |
| MC1 | Popolazione residente Numero Utenze Indicatore semplice Indicatore semplice Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | eseguite 0 0 0 | 20178 4141 Tot eseguite entro lo std | | | | | | | |
| MC1 | Numero Utenze Indicatore semplice Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | eseguite 0 0 0 | 4141 Tot eseguite entro lo std | | 0 | | | | | |
| MC1 | Indicatore semplice Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | eseguite 0 0 0 | Tot eseguite entro lo std | | 2 | | | | | |
| MC1 | Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | eseguite 0 0 0 | entro lo std | | 2 | | | | | |
| MC1 | Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | 0 0 | | altra la eta | Cause | di mancato ri | ispetto | Tempo/valor | Tot eseguite | Tot eseguit |
| MC1 | Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | 0 | 0 | onle lo sta | num. casi di | num. casi | imputabili al | e medio | entro lo std | oltre lo sto |
| MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 | Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 | Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 | Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 | Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | 164 | 159 | 5 | 0 | 0 | 5 | | 159,000 | 5,000 |
| MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 | Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 | | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 26,000 | 1,000 |
| MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 | | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12,000 | 0,000 |
| MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 | Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 | Tempo di esecuzione di lavori semplici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 | Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 108,000 | 0,000 |
| MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 | Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 | Tempo di esecuzione di lavori complessi | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 11,000 | 1,000 |
| MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 | Tempo di attivazione, della fornitura | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50,000 | 0,000 |
| MC1 MC1 MC1 | Tempo di riattivazione, owero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore | 44 | 41 | 3 | 0 | 0 | 3 | | 41,000 | 3,000 |
| MC1 MC1 MC1 | Tempo di riattivazione, owero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 MC1 | Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità | 100 | 97 | 3 | 0 | 0 | 3 | | 97,000 | 3,000 |
| MC1 | Tempo di disattivazione della fornitura | 60 | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 59,000 | 1,000 |
| | Tempo di esecuzione della voltura | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 141,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo massimo per l'appuntamento concordato | 375 | 343 | 32 | 0 | 0 | 32 | | 343,000 | 32,000 |
| MC2 | Preawiso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.000 | 0.000 |
| MC2 | Fascia di puntualità per gli appuntamenti | 392 | 370 | 22 | 0 | 0 | 22 | | 370.000 | 22,000 |
| MC2 | Tempo di intervento per la verifica del misuratore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.000 | 1,000 |
| MC2 | Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo di additazione dei misulatore mandi zionante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.000 | 1,000 |
| MC2 | Tempo di intervento per la verifica del rivello di pressione | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0,000 | 1,000 |
| MC2 | Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 10,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo per l'emissione della fattura | 16.383 | 16.353 | 30 | 0 | 0 | 30 | | 16,353 | 0.030 |
| MC2 | Tempo di rettifica di fatturazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo per la risposta a reclami | 50 | 42 | 8 | 0 | 0 | 8 | | 42,000 | 8,000 |
| MC2 | Tempo per la risposta a reciami Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7.000 | 0,000 |
| MC2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.000 | 0.000 |
| MC2 | Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| | Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione | 0 | | 0 | | | | | 0,000 | 0,000 |
| MC2 T | Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione Tempo per la comunicazione dell'awenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo per la comunicazione dell'awenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura Tempo massimo di attesa agli sportelli | 1.077 | 1.073 | 4 | 0 | 0 | 4 | | 107,300 | 0,400 |
| MC2 | | 1.077 | 1.073 | 5 | U | U | - 4 | 4.05 | 107,300 | 0,400 |
| | Tempo medio di attesa agli sportelli Livello del servizio telefonico (LS) | 2.015 | 1.072 | 138 | | | | 1,95 93,151% | 107,175 | 1,380 |
| MC2 | | 2.015 | 2.015 | 0 | | | | | 20,150 | 0,000 |
| MC2 | Accessibilità al servizio telefonico (AS) | | | | | | | 100,000% | | |
| MC2 | Tempo medio di attesa (secondi) per il servizio telefonico (TMA) | 2.015 | 1.974 | 41 | | | | 98,513 | 19,736 | 0,414 |
| MC2 | | 2.258 | 2.171 | 87 | 0 | | | | | 0.700 |
| | Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI) | | | | U | 0 | 87 | | 217,100 | 8,700 |
| | Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI) | | | | | | | | | |
| | Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI) | | | | 0 | | ro-Indicatori 98,050% | Totali MC1 | 217,100 per Macro-Indi 704,000 | |

ACQUEDOTTO VALTIGLIONE con gestione operativa IRETI - Canelli e Nizza M.to (tabella consolidata) – Dati di qualità contrattuale anno 2023

| | Riepilogo per Macroindica | | | | idata) E | | - Cama | | Toule a | 1110 20 |
|------------|--|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| | Campo note modificabile so | olo da masch | era | | | | | | | |
| | l dati 2023 fanno riferimento al medesimo territorio servito al 31/12/2023 dichiarato nella maschera ' | "Comuni serv | iti"? Se NO, ii | ndicare e mot | vare nel cam | po note le diff | ferenze. | | | SI |
| | <u> </u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | İ | | | |
| | Numero comuni | | 35 | | | | | | | |
| | Popolazione residente | | 56026 | | | | | | | |
| | Numero Utenze | | 24219 | | | | | | | |
| | | | | | _ | | | | | |
| Macro- | | Totale | | Tot eseguite | | di mancato r | | e medio | entro lo std | |
| indicatore | Indicatore semplice | eseguite | entro lo std | | forza | imputabili | gestore | effettivo | scalate | per cause |
| MC1 MC1 | Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo | 227 | 217 | 10 | 0 | 0 | 10 | | 217.000 | 10,000 |
| MC1 | Tempo di preventivazione per allaccio fonario con sopralluogo Tempo di preventivazione per allaccio fonario con sopralluogo | 58 | 53 | 5 | 0 | 0 | 5 | | 53.000 | 5.000 |
| MC1 | Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 26,000 | 1,000 |
| MC1 | Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 19,000 | 2,000 |
| MC1 | Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 25,000 | 1,000 |
| MC1 | Tempo di esecuzione di lavori semplici | 205 | 203 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 203,000 | 1,000 |
| MC1 | Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso | 162 | 155 | 7 | 0 | 0 | 7 | | 155,000 | 7,000 |
| MC1 | Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 31,000 | 2,000 |
| MC1 | Tempo di esecuzione di lavori complessi | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 11,000 | 1,000 |
| MC1 | Tempo di attivazione, della fornitura | 252 | 213 | 39 | 0 | 25 | 14 | | 213,000 | 14,000 |
| MC1 | Tempo di riattivazione, owero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore | 44 | 41 | 3 | 0 | 0 | 3 | | 41,000 | 3,000 |
| MC1 | Tempo di riattivazione, owero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC1 | Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità | 100 | 97 | 3 | 0 | 0 | 3 | | 97,000 | 3,000 |
| MC1 | Tempo di disattivazione della fornitura | 182 | 150 | 32 | 0 | 24 | 8 | | 150,000 | 8,000 |
| MC1 | Tempo di esecuzione della voltura | 1.109 | 1.008 | 101 | 0 | 3 | 98 | | 1.008,000 | 98,000 |
| MC2 MC2 | Tempo massimo per l'appuntamento concordato Preawiso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato | 794 0 | 737 | 57 0 | 0 | 16 0 | 41 0 | | 737,000 | 41,000 0,000 |
| MC2 | Freamso minimo per la discetta dell'appuntamento concordato Fascia di puntualità per gli appuntamenti | 811 | 764 | 47 | 0 | 16 | 31 | | 764.000 | 31,000 |
| MC2 | Tempo di intervento per la verifica del misuratore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,000 | 0.000 |
| MC2 | Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0,000 | 1,000 |
| MC2 | Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,000 | 0,000 |
| MC2 | Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.000 | 1,000 |
| MC2 | Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0,000 | 1,000 |
| MC2 | Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento | 103 | 95 | 8 | 0 | 1 | 7 | | 95,000 | 7,000 |
| MC2 | Tempo per l'emissione della fattura | 77.995 | 77.938 | 57 | 0 | 0 | 57 | | 77,938 | 0,057 |
| MC2 | Tempo di rettifica di fatturazione | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 20,000 | 1,000 |
| MC2 | Tempo per la risposta a reclami | 119 | 110 | 9 | 0 | 0 | 9 | | 110,000 | 9,000 |
| MC2 | Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni | 2.155 | 2.151 | 4 | 0 | 1 | 3 | | 2.151,000 | 3,000 |
| MC2 | Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione | 60 | 48 | 12 | 0 | 8 | 4 | | 48,000 | 4,000 |
| MC2 | Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| 1400 | Towns and the state of the stat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,000 | 0,000 |
| MC2 MC2 | Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione Tempo per la comunicazione dell'awenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.000 | 0.000 |
| MC2 | Tempo per la comunicazione dell'awenuta attivazione, nattivazione, subentro, cessazione, voltura Tempo massimo di attesa agli sportelli | 1.962 | 1.957 | 5 | 0 | 0 | 5 | | 195,700 | 0,500 |
| MC2 | Tempo massimo di attesa agli sportelli Tempo medio di attesa agli sportelli | 1.962 | 1.957 | 8 | U | 0 | 5 | 1,65984351 | 195,700 | 0,500 |
| MC2 | Livello del servizio telefonico (LS) | 13.374 | 12.370 | 1.004 | | | | 92,493% | 123,700 | 10,040 |
| MC2 | Accessibilità al servizio telefonico (AS) | 13.374 | 13.374 | 0 | | | | 100,000% | 133,740 | 0,000 |
| MC2 | Tempo medio di attesa (secondi) per il servizio telefonico (TMA) | 13.374 | 13.225 | 149 | | | | 53,4450652 | | 1,489 |
| MC2 | Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI) | 8.290 | 7.841 | 449 | 0 | 270 | 179 | 23, 1100302 | 784,100 | 17,900 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Valori Mac | ro-Indicatori | Totali | per Macro-Inc | licatori |
| | | | | | | MC1 | 93,514% | MC1 | 2.249,000 | 156,000 |
| | | | | | | MC2 | 97,723% | MC2 | 5.569,815 | 129,800 |

Per il Gestore Acquedotto Valtiglione S.p.A. (comprensivo della gestione operativa di Ireti S.p.A.) l'obiettivo di mantenimento per il macro-indicatore MC1 2023 non risulta raggiunto, mentre l'obiettivo di mantenimento per il macro-indicatore MC2 2023 risulta raggiunto.

5.5 Risultanze della qualità contrattuale per i Gestori Ato5 – applicazione del meccanismo incentivante ARERA.

L'art. 91 del RQSII, stabilisce che il meccanismo di incentivazione della qualità contrattuale si articola in fattori premiali e di penalizzazione da attribuire in ragione delle performance delle gestioni sulla base del sistema di macro-indicatori di qualità contrattuale MC1 e MC2. I premi e le penalità sono quantificati a partire dal 2022 sulla base delle performance realizzate in ciascuno dei due anni precedenti.

L'art. 94 del RQSII, stabilisce che il meccanismo incentivante di qualità contrattuale del SII tiene conto dello stato di efficienza conseguito, inteso come livello di partenza delle gestioni appartenenti *ex ante* alla fascia di mantenimento (Classe A) per almeno un macro-indicatore, e della variazione di efficienza, in termini di miglioramento dei livelli prestazionali iniziali da parte delle gestioni non appartenenti *ex ante* alla richiamata Classe A.

Nella successiva tavola sono descritti i diversi stadi in cui è articolato il meccanismo di incentivazione, in base alla classe di partenza ed al livello di valutazione:

Livelli di valutazione

Tavola 3 - Stadi di valutazione delle performance di qualità contrattuale in ciascun anno di valutazione

Livello base Livello di eccellenza Stadio III Stadio I Obiettivi prime tre posizioni a livello *mantenimento* permanenza in Classe A (cambio globale considerando tutti i di classe) per ogni macromacro-indicatori valutati (di cui (Classe A) indicatore almeno uno in Classe A) Stadio II Obiettivi superamento (non miglioramento raggiungimento) dell'obiettivo (Classi B e C) per ogni macro- indicatore

hiettivi

Con riferimento agli obiettivi di mantenimento, gli incentivi, in termini di premi/penalità, sono definiti attraverso stadi successivi di valutazione, articolati in due livelli crescenti come segue:

- livello base di fattore premiale (di penalizzazione): sulla base del posizionamento *ex post* della gestione che ne confermi la presenza (che non ne confermi la presenza) in Classe A per ciascun macro-indicatore *Stadio I*;
- livello di eccellenza di fattore premiale: per le tre migliori gestioni con riferimento a tutti i macro-indicatori valutati, di cui almeno uno in Classe A *Stadio III*.

Con riferimento agli obiettivi di miglioramento, gli incentivi, in termini di premi/penalità, sono definiti attraverso stadi successivi di valutazione, sulla base di un posizionamento *ex post* della gestione che risulti migliore (peggiore) rispetto all'obiettivo definito dall'Autorità in corrispondenza di ciascun macro-indicatore – *Stadio II*.

Ai fini dell'erogazione del premio o dell'applicazione della penalità per il livello "avanzato" (Stadio III), l'Autorità elabora, con riferimento a ogni annualità, una graduatoria, attribuendo alle gestioni ritenute ammissibili al meccanismo incentivante un punteggio determinato secondo i criteri fissati nell'art. 95 dell'RQSII e di seguito esplicitati.

Ai fini dell'applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione) nell'anno (a + 2), costituiscono elementi di valutazione il livello negli anni a e (a + 1) dei macro- indicatori MC1 e MC2, come definiti all'Articolo 92.

Con riferimento allo *Stadio III*, l'attribuzione dei punteggi al fine dell'elaborazione della graduatoria e dell'eventuale applicazione dei fattori premiali avviene attraverso l'impiego del metodo *TOPSIS* (*Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution*), avente ad oggetto i livelli in ciascun anno a e (a + 1) dei macro-indicatori adottati nel presente provvedimento, a ciascuno dei quali sarà applicato un peso specifico, aggiornabile con cadenza biennale dall'Autorità in ragione di criteri di priorità degli obiettivi di qualità contrattuale sottesi ai medesimi macro-indicatori.

Si rimanda alla valutazione ARERA, emessa nel 2023; il nuovo aggiornamento ci sarà, presumibilmente, nel 2025 e sarà riportato nella prossima relazione.

Si riportano, di seguito, per completezza di trattazione le risultanze dell'applicazione del meccanismo incentivante della qualità contrattuale definite nell'anno 2023.

Con riferimento alle annualità $a = \{2020, 2021\}$ di applicazione del presente meccanismo incentivante, si utilizzano i pesi per macro-indicatore λMC , di cui alla seguente Tavola 4, da applicare nelle valutazioni delle *performance* per gli *Stadi I, II e III*.

Tavola 4 - Pesi per macro-indicatore

| Macro- indicatore | λМС |
|----------------------|-----|
| MC1 | 50% |
| MC2 | 50% |

Ai fini della determinazione e valorizzazione delle premialità/penalità, con Deliberazione 476/2023/R/IDR del 17 ottobre 2023, ad oggetto "Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII) per le annualità 2020-2021. Risultati finali", poi parzialmente modifica con Deliberazione n. 500/2023/R/IDR del 31 ottobre 2023, "Correzione di errori materiali, e conseguente sostituzione dell'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 476/2023/R/idr, ad oggetto "Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII) per le annualità 2020-2021. Risultati finali", l'Autorità nazionale ha pubblicato l'elenco delle gestioni escluse dal meccanismo incentivante e l'elenco delle gestioni ammesse al meccanismo incentivante e l'ammontare delle premialità/penalità applicate.

Le gestioni Asti Servizi Pubblici S.p.A. e Acquedotto della Pian S.p.A. risultano escluse dal meccanismo incentivante per il biennio 2020-2021 a causa di specifiche incongruenze o incompletezze nei dati.

In merito alle premialità per il periodo 2020-2021, per i Gestori operanti nell'Ambito Astigiano-M.to risulta quanto di seguito sintetizzato:

<u>Macro-indicatore MC1 "Avvio e cessazione del rapporto contrattuale" - Stadio I - biennio 2020-2021</u>

| Id ATO_ Gestore | ATO | Gestore | Premio (€) | Note |
|--------------------|---------------------|---------|------------|------|
| | Ato5 Astigiano-M.to | CCAM | 24.869 | |

Macro-indicatore MC2 "Gestione del rapporto contrattuale" - Stadio I - biennio 2020-2021

| Id ATO_ | ATO | | Gestore | Premio (€) | Note |
|----------|------|------------|--------------------|------------|------|
| Gestore | | | | | |
| 105_7345 | Ato5 | Astigiano- | Acquedotto | 82.485 | |
| | M.to | | Valtiglione S.p.A. | | |

<u>Macro-indicatore MC1 "Avvio e cessazione del rapporto contrattuale" - Stadio II - biennio 2020-2021</u>

| Id ATO_ Gestore | АТО | Gestore | Premio (€) | Note |
|--------------------|---------------------|---------------------------|------------|------|
| 105_7345 | Ato5 Astigiano-M.to | Acquedotto Valtiglione | 171.567 | |

Stadio III - biennio 2020-2021

| Rank TOPSIS | Punteggio TOPSIS | Id ATO_ Gestore | ATO | Gestore | Premio (€) |
|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------|------------|
| | 101313 | destore | | | |
| 2 | 0.99453 | 105_13189 | Ato5 Astigiano-M.to | CCAM | 205.529 |

Complessivamente per i Gestori Ato5 sono state deliberate da ARERA premialità sulla qualità contrattuale per Euro 484.450.

6. Valutazioni sintetiche finali

Si riportano, di seguito e per ogni Gestore Ato5, gli elementi di sintesi (sulla base delle valutazioni sviluppate nel dettaglio nei capitoli precedenti) circa:

- l'analisi economico gestionale dei Gestori Ato5;
- gli investimenti programmati e realizzati;
- la Qualità Tecnica del servizio reso all'Utenza;
- la Qualità contrattuale del servizio reso all'Utenza.

Analisi economico gestionale dei Gestori Ato5

Acquedotto Valtiglione – Conto Economico 2022 e **2023**.

| <u>Voci di bilancio</u> | <u>31/12/2023</u> | 31/12/2022 | <u>Scostamento</u> |
|--|-------------------|------------|--------------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 9.940.945 | 9.499.159 | 441.786 |
| Incrementi immobilizzazioni | 1.319.446 | 988.082 | 331.364 |
| Altri ricavi e proventi | 2.100.678 | 2.035.590 | 65.088 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 13.361.069 | 12.522.831 | 838.238 |
| Costi per materie prime, sussidiarie, di | | | |
| consumo e merci | 1.427.466 | 1.245.743 | 181.723 |
| Costi per servizi | 9.041.206 | 8.503.330 | 537.876 |
| Costi per godimento beni di terzi | 54.486 | 56.331 | -1.845 |
| Costi per personale | 1.919.779 | 1.876.816 | 42.963 |
| Ammortamenti | 649.036 | 609.807 | 39.229 |
| Svalutazione crediti | 26.804 | 17.539 | 9.265 |
| Variazioni rimanenze | 9.533 | -34.082 | 43.615 |
| Accantonamento per rischi | 1.505 | 509 | 996 |
| Oneri diversi di gestione | 125.328 | 94.209 | 31.119 |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | 13.255.143 | 12.370.202 | 884.941 |
| DIFF. VALORI E COSTI PRODUZIONE | 105.926 | 152.629 | -46.703 |
| Proventi e oneri finanziari | -27.664 | -146.478 | 118.814 |
| Risultato prima delle imposte | 78.262 | 6.151 | 72.111 |
| Imposte | 23.248 | 77.175 | -53.927 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 101.510 | 83.326 | 18.184 |

Per Acquedotto Valtiglione, il risultato d'esercizio è in utile nei due anni ed in miglioramento.

Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato - Conto Economico 2022 e 2023.

| <u>Voci di bilancio</u> | <u>Valori al 31/12/2023</u> | <u>Valori al 31/12/2022</u> | <u>Scostamento</u> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 18.265.072 | 18.337.637 | -72.565 |
| Incrementi immobilizzazioni | 5.318.717 | 4.155.875 | 1.162.842 |
| Altri ricavi e proventi | 3.195.911 | 2.533.941 | 661.970 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 26.779.700 | 25.027.453 | 1.752.247 |
| Costi per materie prime, sussidiarie e di | | | |
| consumo e merci | 1.899.395 | 1.131.919 | 767.476 |
| Costi per servizi | 11.191.757 | 10.658.709 | 533.048 |
| Costi per godimento beni di terzi | 1.118.694 | 1.013.408 | 105.286 |
| Costi per personale | 5.923.213 | 5.700.921 | 222.292 |
| Ammortamenti | 3.637.578 | 3.660.868 | -23.290 |
| Svalutazione crediti | 400.000 | 350.000 | 50.000 |
| Variazioni rimanenze | -1.517 | 8.102 | -9.619 |
| Accantonamento rischi | 50.000 | 340.000 | -290.000 |
| Oneri diversi di gestione | 283.231 | 151.827 | 131.404 |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | 24.502.351 | 23.015.754 | 1.486.597 |
| DIFF. VALORI E COSTI PRODUZIONE | 2.277.349 | 2.011.699 | 265.650 |
| Proventi e oneri finanziari | -659.934 | -808.164 | 148.230 |
| Rettifiche valore di partecipazioni | 92 | 0 | 92 |
| Risultato prima delle imposte | 1.617.507 | 1.203.535 | 413.972 |
| Imposte | -421.208 | -285.572 | -135.636 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 1.196.299 | 917.963 | 278.336 |

Per il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato il risultato d'esercizio è in utile nei due anni ed in miglioramento.

Acquedotto della Piana - Conto Economico 2022 e **2023**.

| Voci di bilancio | Valori al 31/12/2023 | Valori al 31/12/2022 | Scostamento |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 5.162.136 | 5.133.114 | 29.022 |
| Incrementi immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| Altri ricavi e proventi | 1.017.580 | 286.524 | 731.056 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 6.179.716 | 5.419.638 | 760.078 |
| Costi materie prime, sussidiarie, di | | | |
| consumo e merci | 26.940 | 23.166 | 3.774 |
| Costi per servizi | 3.416.790 | 3.053.821 | 362.969 |
| Costi per godimento beni di terzi | 26.756 | 27.360 | -604 |
| Costi per il personale | 689.132 | 710.262 | -21.130 |
| Ammortamenti | 574.209 | 575.867 | -1.658 |
| Svalutazione crediti | 70.000 | 170.000 | -100.000 |
| Variazione rimanenze | 169 | -420 | 589 |
| Accantonamento per rischi | 13.363 | 0 | 13.363 |
| Oneri diversi di gestione | 452.945 | 440.931 | 12.014 |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | 5.270.304 | 5.000.987 | 269.317 |
| DIFF VALORI-COSTI PRODUZIONE | 909.412 | 418.651 | 490.761 |
| Proventi e oneri finanziari | -350.296 | -300.778 | -49.518 |
| Risultato prima delle imposte | 559.116 | 117.873 | 441.243 |
| Imposte | -553.968 | -21.541 | -532.427 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 5.148 | 96.332 | -91.184 |

Per l'Acquedotto della Piana il risultato d'esercizio è in utile nei due anni.

Asti Servizi Pubblici (ASP) - Conto Economico 2022 e 2023 (settore idrico complessivo).

| Voci di bilancio | Valori al 31/12/2023 | Valori al 31/12/2022 | Scostamento |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Ricavi delle vendite e prestazioni | 8.803.398 | 9.382.466 | -579.068 |
| Incremento immobilizzazioni | 570.189 | 580.715 | -10.526 |
| Altri ricavi | 4.052.608 | 9.592.907 | -5.540.299 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 13.426.195 | 19.556.088 | -6.129.893 |
| Costi materie prime, di consumo e | | | |
| merci | 2.426.441 | 3.412.033 | -985.592 |
| Costi per servizi | 1.265.052 | 1.190.417 | 74.635 |
| Costi godimento beni di terzi | 395.530 | 559.777 | -164.247 |
| Costi per il personale | 3.225.750 | 3.216.566 | 9.184 |
| Ammortamenti | 2.885.801 | 3.017.767 | -131.966 |
| Svalutazione crediti | 0 | 0 | 0 |
| Accantonamento per rischi | 301.135 | 59.617 | 241.518 |
| Oneri diversi di gestione | 489.058 | 292.545 | 196.513 |
| Costi interscambio prestazioni tra BU | 53.751 | 39.649 | 14.102 |
| Costi indiretti totali | 1.196.632 | 1.245.127 | -48.495 |
| COSTI DI PRODUZIONE | 12.239.150 | 13.033.498 | -794.348 |
| DIFF. VALORE-COSTI | 1.187.045 | 6.522.590 | -5.335.545 |
| Proventi e oneri finanziari | -151.686 | -75.427 | -76.259 |
| Risultato prima delle imposte | 1.035.359 | 6.447.163 | -5.411.804 |
| Imposte | -319.246 | -1.838.957 | 1.519.711 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 716.113 | 4.608.206 | -3.892.093 |

Per Asti Servizi Pubblici il risultato d'esercizio è in utile nei due anni.

Conto economico aggregato dell'Ato5 - esercizi 2022-2023

| VOCI DI BILANCIO | 2023 | 2022 | 2023-2022 | |
|--|------------|------------|-------------|--|
| Ricavi vendite e prestazioni | 42.171.551 | 42.352.376 | - 180.825 | |
| Incrementi immobilizzazioni | 7.208.352 | 5.724.672 | 1.483.680 | |
| Altri ricavi e proventi | 10.366.777 | 14.448.962 | - 4.082.185 | |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 59.746.680 | 62.526.010 | - 2.779.330 | |
| Costi per materie prime, sussidiarie, di | | | | |
| consumo e merci | 5.780.242 | 5.812.861 | - 32.619 | |
| Costi per servizi | 24.914.805 | 23.406.277 | 1.508.528 | |
| Costi per godimento beni di terzi | 1.595.466 | 1.656.876 | - 61.410 | |
| Costi per personale | 11.757.874 | 11.504.564 | 253.310 | |
| Ammortamenti | 7.746.624 | 7.864.309 | - 117.685 | |
| Svalutazione crediti | 496.804 | 537.539 | - 40.735 | |
| Variazioni rimanenze | 8.185 | - 26.400 | 34.585 | |
| Accantonamento rischi | 366.003 | 400.126 | - 34.123 | |
| Oneri diversi di gestione | 1.350.562 | 979.512 | 371.050 | |
| Costi interscambio prestazioni tra BU | 53.751 | 39.649 | 14.102 | |
| Costi indiretti totali | 1.196.632 | 1.245.127 | - 48.495 | |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | 55.266.948 | 53.420.440 | 1.846.508 | |
| DIFF. VALORI E COSTI PRODUZIONE | 4.479.732 | 9.105.570 | - 4.625.838 | |
| Proventi e oneri finanziari | -1.189.580 | -1.330.847 | 141.267 | |
| Rettifiche da partecipazioni | 92 | 0 | 92 | |
| Risultato prima delle imposte | 3.290.244 | 7.774.723 | - 4.484.479 | |
| Imposte | -1.271.174 | -2.068.895 | 797.721 | |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 2.019.070 | 5.705.828 | - 3.686.758 | |

Complessivamente, a livello di bilancio aggregato dei 4 Gestori Ato5, il risultato d'esercizio è in utile nei due anni.

Investimenti programmati e realizzati

Di seguito sono riportati gli investimenti realizzati dai Gestori dell'Egato5 a consuntivo fino all'anno **2023** (validati e considerati ai fine delle predisposizioni tariffarie).










Si riporta, di seguito, l'andamento degli investimenti realizzati a livello Ato5 dal 2003.

| INVESTIMENTI DA INIZIO PROGRAMMAZIONE DI ATO (2003) | INVESTIMENTO REALIZZATO MEDIO ANNUO | INVESTIMENTO REALIZZATO MEDIO ANNUO |
|---|--|--|
| Importo complessivo al 31/12/2023 (Mln Euro) | (MIn Euro) | (Euro/ab anno) |
| 234,76 | 11,18 | 43,33 |

In termini investimenti pro capite (Euro/ab/anno) risulta il seguente andamento.

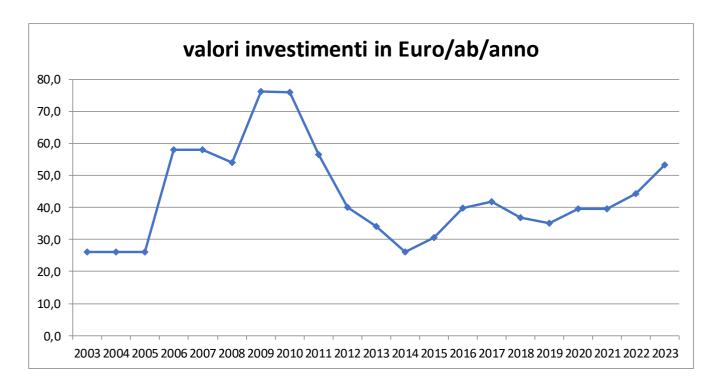

Qualità Tecnica del servizio reso all'Utenza

Si riporta di seguito uno specchietto riassuntivo delle performance dei Gestori per l'anno 2023 e il raggiungimento degli obiettivi.

Raggiungimento obiettivi anno 2023

Raggiungimento obiettivo

| Raggiungimento obiettivi anno 2023 | | | | | | |
|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| ASP | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| Obiettivo | А | А | А | А | А | Α |
| Consuntivo 2023 | Α | Α | Α | E | Α | Α |
| Raggiungimento obiettivo | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| | | | | | | |
| CCAM | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| Obiettivo | Α | Α | Α | Α | Α | Α |
| Consuntivo 2023 | Α | Α | Α | Α | Α | Α |
| Raggiungimento obiettivo | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | | | | | | |
| Acquedotto Piana | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| Obiettivo | В | Α | Α | Α | Α | Α |
| Consuntivo 2023 | В | Α | Α | Α | Α | Α |
| Raggiungimento obiettivo | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | | | | | | |
| Acquedotto Valtiglione | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| Obiettivo | D | Α | Α | E | Α | Α |
| Consuntivo 2023 | D | Α | Α | E | Α | Α |
| | | | | | | |

Le celle in colore verde rappresentano il raggiungimento di classe A.

No

Le celle in colore giallo rappresentano il raggiungimento dell'obiettivo con classe inferiore ad A. Le celle in colore arancio rappresentano il mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto.

Si

Si

No

Si

Si

Per **ASP** tutti gli obiettivi 2022 e 2023 sono stati raggiunti tranne per l'indicatore M4. Il Gestore è in classe A per tutti gli indicatori tranne M4 (classe E).

Occorre considerare che, come già condiviso con ANEA, l'indicatore M4 è soggetto ad estrema volatilità in relazione agli eventi meteorici dell'anno.

Per **CCAM** tutti gli obiettivi 2022 e 2023 sono stati raggiunti. Tutti gli indicatori sono in classe A. Per **Acquedotto della Piana** la classe A, è raggiunta per tutti gli indicatori ad esclusione dell'indicatore M1 (progredita da classe C al 2020, a classe B nel 2021).

Tutti gli obiettivi fissati con il monitoraggio 2020-2021 sono stati raggiunti.

Per **Acquedotto Valtiglione**, analogamente alla precedente raccolta dati, si è riscontrato il raggiungimento della classe A per gli indicatori M2, M3, M5 e M6.

Per quanto riguarda M1 l'indicatore è in classe D pur con un peggioramento di performance che hanno determinato il non raggiungimento dell'obiettivo.

L'indicatore M4 è rimasto in classe E nonostante un miglioramento in classe B nel 2020. Tale indicatore è fortemente influenzato dall'andamento meteorico che determina eventuali puntuali allagamenti in caso di fognature di tipo misto.

Per quanto riguarda l'indicatore M2 essendo il Gestore in classe A deve mantenere la classe, pertanto con indicatore inferiore a 6 la classe è mantenuta. L'obiettivo è pertanto raggiunto nonostante una diminuzione della performance.

<u>Valutazione meccanismo incentivante sulla qualità tecnica ARERA - premialità/penalità.</u>

Si rimanda alla valutazione ARERA, emessa nel 2023; il nuovo aggiornamento ci sarà, presumibilmente, nel 2025 e sarà riportato nella prossima relazione.

Nel paragrafo 4.6 del presente documento, per completezza di trattazione, sono riportate le risultanze dell'applicazione del meccanismo incentivante della qualità contrattuale definite nell'anno 2023.

Complessivamente per i Gestori Ato5, nel 2023, sono state deliberate da ARERA premialità sulla qualità contrattuale per Euro 3.974.612.

Qualità contrattuale del servizio reso all'Utenza

Per il Gestore Asti Servizi Pubblici S.p.A., l'obiettivo di mantenimento 2023 risulta raggiunto per entrambe i macro-indicatori.

Come indicato dalla tabella sopra, dal calcolo dei macro-indicatori 2023, si evince che, per il Gestore Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato, l'obiettivo di mantenimento 2023 risulta raggiunto per entrambe i macro-indicatori.

Per il Gestore Acquedotto della Piana S.p.A., l'obiettivo di mantenimento 2023 risulta raggiunto per entrambi I macroindicatori.

In merito alla gestione Acquedotto Valtiglione S.p.A. si precisa che l'identificazione degli obiettivi evidenziata nella tabella precedente comprende anche la gestione operativa di Ireti nei Comuni di Canelli e Nizza M.to.

L'obiettivo di mantenimento per il macro-indicatore MC1 2023 non risulta raggiunto, mentre l'obiettivo di mantenimento per il macro-indicatore MC2 2023 risulta raggiunto.

Risultanze della qualità contrattuale per i Gestori Ato5 – applicazione del meccanismo incentivante ARERA.

Si rimanda alla valutazione ARERA, emessa nel 2023; il nuovo aggiornamento ci sarà, presumibilmente, nel 2025 e sarà riportato nella prossima relazione.

Nel paragrafo 5.5 del presente documento, per completezza di trattazione, sono riportate le risultanze dell'applicazione del meccanismo incentivante della qualità contrattuale definite nell'anno 2023.

Complessivamente per i Gestori Ato5, nell'anno 2023, sono state deliberate da ARERA premialità sulla qualità contrattuale per Euro 484.450.
